
कृषिको आधार: सिँचाइमा सुधार

जलस्रोत पुस्तिका

(बार्षिक प्रतिवेदन)

बर्ष २, अंक २

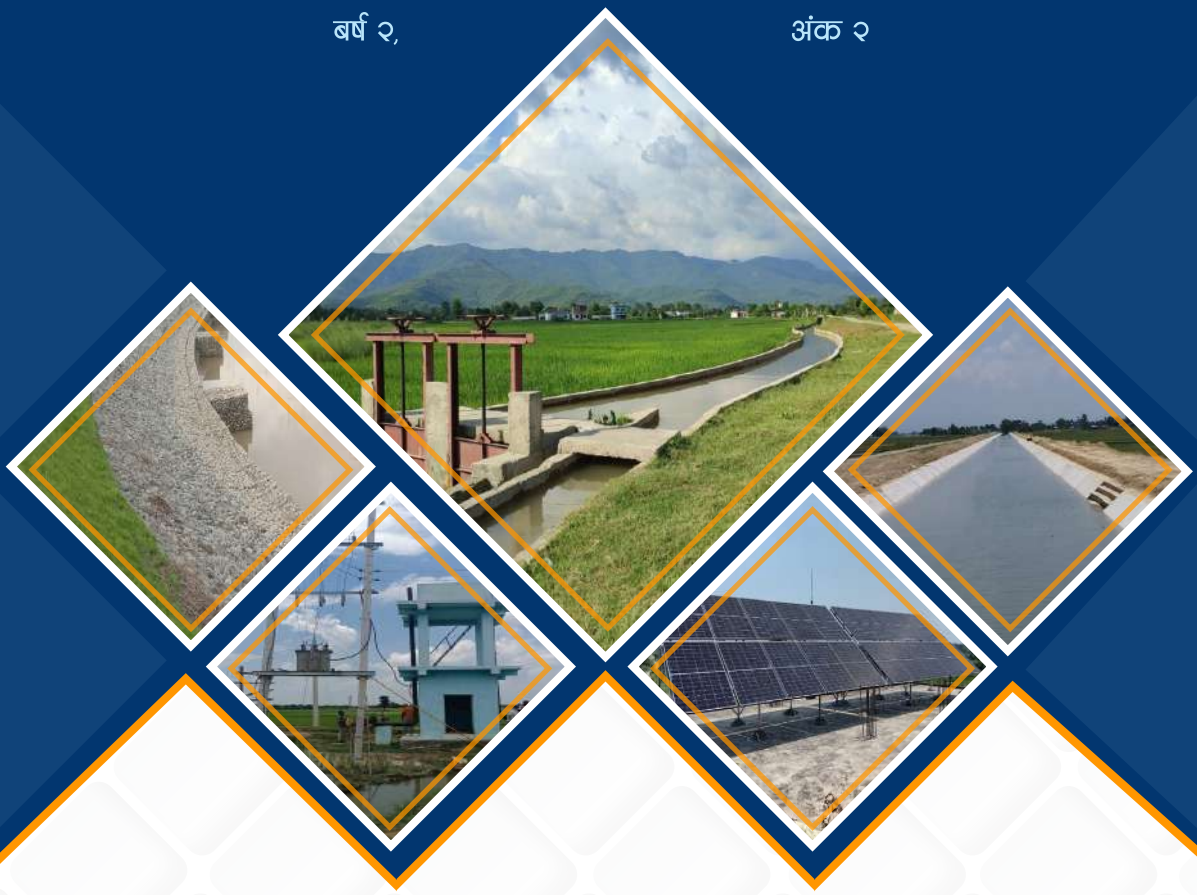

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

राप्ति उपत्यका (देउखुरी), दाङ

भाद्र, २०८२

जलस्रोत पुस्तिका २०८२

प्रकाशन बर्ष : भाद्र, २०८२

सर्वाधिकार : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
रासि उपत्यका (देउखुरी), दाङ

मार्गनिर्देशन : विष्णु भण्डारी (प्रदेश सचिब)

सम्पादन समिति :



महेश पोखेल
सि.डि.हा.जि.



ईश्वर नाथ पक्वां
सि.डि.ई.



भेषराज भुसाल
वरिष्ठ इन्जिनियर



सुबोध गुरागाईं
वरिष्ठ इन्जिनियर



विष्णु उपाध्याय
वरिष्ठ हाइड्रोजियोलोजिस्ट

आवरण फोटो : प्रगन्ना सिँचाइ प्रणालीको बोक्सनिया नहर, नदी नियन्त्रण कार्य रुपन्देही, बाणगंगा सिँचाइ प्रणालीको मूल नहर, कोटस्थान डिप ट्युबेल नवलपरासी, हाइब्रिड सोलार व्याकप प्रणाली रुपन्देही

अन्तिम पृष्ठको फोटोः बाणगंगा सिँचाइ प्रणालीको बाँध संरचना

मुद्रण प्रति : ३०० प्रति

सेटिग : अविनाश अधिकारी

मुद्रक : प्रकाश अफसेट प्रेस बुटवल









मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न तालिमका तस्विरहरू ।



लुम्बिनी प्रदेश सरकार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय


राप्ति उपत्यका (देउखुरी), दाङ

कृषिको आधार: सिँचाइमा सुधार

जलस्रोत पुस्तिका

(बार्षिक प्रतिवेदन)

बर्ष २, अंक २

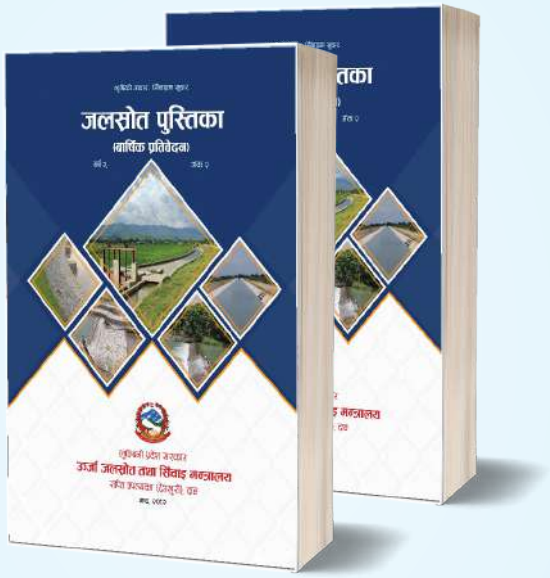

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

राप्ति उपत्यका (देउखुरी), दाङ

भाद्र, २०८२



लुम्बिनी प्रदेश
नेपाल

राष्ट्रिय गान





सयौँ थुङ्गा फुलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएको, मेची महाकाली ।
प्रकृतिका कोटिकोटि सम्पदाका आँचल
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ।
ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि, तराई, पहाड, हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल ।
बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल ।









मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू



श्री सीता शर्मा चौधरी
(माननीय मन्त्री)



श्री बिष्णु भण्डारी
(सचिब)



श्री महेश पोखेल
सि.डि.हा.जि.
(प्रबक्ता/ऊर्जा महाशाखा प्रमुख)



श्री कृष्ण बहादुर बि.क.
सि.डि.ई.
(जलस्रोत तथा सिँचाइ महाशाखा प्रमुख)



श्री बिष्णु उपाध्याय
बरिष्ठ हाइड्रोजियोलोजिस्ट
सुचना अधिकारी/विपद फोकल पर्सन



श्री सुवोध गुरागाई
बरिष्ठ इन्जिनियर
मानव अधिकार फोकल पर्सन

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

प.सं.: २०८२।८३

च.न.:

माननिय सीता शर्मा चौधरी
मन्त्री
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

शुभकामना सन्देश



प्रदेश सरकारको मिति २०८१/१/६ को निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुनःगठन गरेको सन्दर्भमा नबगठित यस मन्त्रलयले स्थापनाको एक बर्ष समेत पुरा गरेको छ । **"सम्बृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक"** भन्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मूल नारालाई सार्थक बनाउन **"कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार"** भन्ने नाराका साथ सतह, लिफ्ट, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइ योजनाहरूको विकास तथा सुदृढीकरण र जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरण कार्य समेत गरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सेवा सुनिश्चित गर्ने तथा **"उज्यालो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश"** भन्ने नाराका साथ जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जस्ता नविकरणीय ऊर्जाको पर्बर्दन गर्दै विद्युत आयोजनाको विकास र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै जनतासँग ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चिता हुने गरी कार्य गर्ने मन्त्रालयको सोच रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा; यस मन्त्रालयबाट प्रदेश भित्र हालसम्म भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सम्बन्धी विकास गतिविधिहरू समेटी **"जलस्रोत पुस्तिका"** प्रकाशन गर्न लागेकोमा खुशी लागेको छ । यस मन्त्रालय र मातहत निकायहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी तथा सबै सिँचाइकर्मीमा यस प्रदेशको विकासमा दत्तचित्त भइ कार्य गर्ने प्रेरणा मिलोस भन्ने कामना गर्दछु । साथै यस पुस्तक प्रकाशनमा खटिनुहुने सबैजना प्रति आभार ब्यक्त गर्दै सम्बद्द पक्षलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

मा सीता शर्मा चौधरी
मन्त्री
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

प.सं.: २०८२।८३

च.न.:

शुभकामना सन्देश



संविधानको कार्यान्वयन संगै लुम्बिनी प्रदेश भित्रका प्रदेश स्तरीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सम्बन्धी कार्य समेत गर्ने गरी प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०८१/०१/०१ र २०८१/०१/१२ मा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियामावली हेरफेर हुँदा हालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गठन भएको छ। यस विचमा यस मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयवाट छुट्टिने पुनः गाभिने क्रम चलिरह्यो। मन्त्रालय हेरफेर हुने, गाभिने र छुट्टिने कारणले institutional memory लगायत समग्र कार्यसम्पादनमा समस्या सृजना भएको अनुभुति मन्त्रालयले गरेको छ।

लुम्विनी प्रदेशमा करिव ६ लाख ७९ हजार हेक्टर सिँचाइ योग्य जमिनमध्ये करिव ५५ प्रतिशत भू-भागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी सिँचाइका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३५ प्रतिशत भू-भागमा बाहैं महिना सिँचाइ सेवा उपभोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। प्रदेश स्थापना भएपश्चात हालसम्म २३१३५ हे. जमिनमा थप सिँचाइ पुग्ने गरी सिँचाइका संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भने ७५२९४ हे. जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सुदृढिकरणको काम सम्पन्न भएको अवस्था छ।

कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार भन्ने मूल नारा लिएर हाल मन्त्रालय सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ लगायत नया प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाहरू मार्फत सिँचाइ प्रणालीहरूको विकासमा क्रियाशिल रहेको अवस्था छ । लुम्विनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले "समृद्ध लुम्विनी, खुसी नागरिक" भन्ने मूल नारालाई साकार पार्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई मुल आधारको रुपमा लिएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४% भन्दा वढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइ क्षेत्रको विकास र विस्तार अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा सिँचाइ क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेता पनि सोचे जति लगानी गर्न सकिएको छैन ।सरकारले लगानी गरेका प्रदेश स्तरका ठूला तथा मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूमा पर्याप्त वजेट विनियोजन गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्था छ।

मन्त्रालयले हरेक वर्ष आर्थिक वर्षमा सम्पादन भएका कामहरुको समिक्षा गर्दै आएकोमा यसपटक आ.व. २०८१।८२ को वार्षिक वजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी लक्ष्य अनुसारको प्रगति समेत हाँसिल गरी आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको वैठक यस मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूको विशेष उपस्थितीमा मिति २०८२/०४/१६ गते यस मन्त्रालयको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। आ.व. २०८१/८२ मा यस मन्त्रालयको कुल वित्तीय प्रगति ७६.९७% रहेको छ भने भौतिक प्रगति करिव ८५% रहेको छ। मन्त्रालयले आ.व. २०८१/८२ को वजेट कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखहरुसंग कार्ययोजनामा आधारित भएर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। आ.व. २०८२/८३ को वजेट वक्तव्य, विनियोजन विधेयक लगायतका कानुनहरुलाई आत्मसात् गर्दै आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक वजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सहित समयमै लक्ष्य अनुसारको प्रगति हांसिल गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ।

मन्त्रालयले यस वर्ष प्रदेशमा ऊर्जा तथा सिँचाइको अवस्था तथा प्रदेश स्थापना पश्चात् हांसिल गरेका मुख्य मुख्य उपलव्धिहरुलाई समेटेर जलस्रोत पुस्तिका प्रकाशन गर्न लागेकोमा निकै हर्षित भएको छु। यस प्रदेशमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि यो पुस्तिका महत्वपूर्ण आधार हुने कुरामा विश्वस्त रहेको छु। प्रदेश स्थापना पूर्वको तथ्याङ्कका लागि सिँचाइ विभागले प्रकाशन गरेको सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ लाई आधार वनाइएको छ।

आ.व. २०८१/८२ मा मन्त्रालयको प्रगति हांसिल गर्न आवश्यक मार्गदर्शन गर्नुहुने लुम्विनी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय परिवार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, सचिवज्यूहरु, मन्त्रालय परिवार लगायत सहयोग गर्नुहुने प्रति हार्दिक धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछु। जलस्रोत पुस्तिका प्रकाशनमा अहोरात्र खटिने पुस्तक प्रकाशन समिति, यस मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा तथा शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरु, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरु, माननीय मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरु सवैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

विष्णु भण्डारी
सचिव
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सम्पादकीय

मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने तथ्याङ्कीय सूचना सम्प्रेक्षणमा एकरुपता नआउँदा र मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा तथा जिम्वेवारी हेरफेर हुँदा तथ्याङ्क नभेटिने तथा सहि सुचना प्रवाहमा जटिलता देखिएकोले मन्त्रालयबाट हालसम्म भए/गरेकाका तथ्याङ्कहरू समेटी लुम्बिनी प्रदेशको सिँचाइको मार्गचित्र सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशन गर्न श्रीमान् सचिब श्री बिष्णु भण्डारीले मिति २०८२/०२/०९ गते निम्न बमोजिमको समिति गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न जिम्मेवारी तोक्नु भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सि.डि.हा.जी श्री महेश पोखेलको संयोजकत्वमा प्रगन्ना पड्कापथ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका सि.डि.ई. श्री ईश्वर नाथ पक्वां, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीका ब.ई. श्री भेषराज भुसाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ब.ई. श्री सुबोध गुरागाई र ब.हा.जि. श्री बिष्णु उपाध्याय सहितको पुस्तिका प्रकाशन समिति बनेको थियो।

समितिले तथ्याङ्क संकलनमा एकरुपताको लागि विभिन्न किसिमका फरम्याटहरू तयार गरी मातहत कार्यालयहरूमा तथ्याङ्क माग गरेको थियो । कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कका अलावा जलस्रोत तथा सिँचाइ बिभागबाट प्रकाशित सिँचाइ गुरुयोजना २०१९, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले प्रकाशन गरेका प्रकाशनहरू, मन्त्रालयमा संग्रहित सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको आधारमा पुस्तिका तयार गरीएको छ। यस कार्यमा माननीय मन्त्री श्री सीता शर्मा चौधरीले समय समयमा दिनु भएको प्रेरणा, सचिव श्री बिष्णु भण्डारी, यस कार्यमा आफै संलग्न भई गर्नु भएको मार्गनिर्देशन र समितिका सदस्यहरूको अहोरात्र खटाइले यो पुस्तिका प्रकाशन हुन लागेको छ। यस पुस्तकमा प्रस्तुत विषयवस्तुहरूमा यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाहरू जलस्रोत क्षेत्रका जिज्ञासुहरू, संघ संस्थाहरू, विद्यार्थीहरू, शोधकर्ता एवम् प्राज्ञिक समुदायलाई उपयोगी हुने विश्वास लिएका छौ।

अन्त्यमा यस कार्यको लागि हौसला प्रदान गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान् सचिवज्यू, मातहत निकायका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरू, मन्त्रालयका सी.डि.ई. श्री कृष्ण बहादुर बि.क., अधिकृत (लेखा) मनोज विष्ट, प्रशासन सहायक चन्द्राकुमारी बोगटी, का.स.श्री रिसब आचार्य लगाएतका अन्य सहयोगि कर्मचारीहरू र प्रकाशनमा सहयोग गर्ने प्रति आभार व्यक्त चाहन्छौं।

सम्पादन समिति

विषय सुची

१. मन्त्रालयको परिचय १

१.१. पृष्ठभूमि १

१.२. सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति २

१.३. कार्य जिम्वेवारी ३

१.४. जनशक्ति तथा संगठन संरचना ४

१.५. मन्त्रालयमा हालको जनशक्ति विवरण ६

२. लुम्बिनी प्रदेशको जलस्रोत तथा भू-उपयोगको अवस्था ७

२.१. लुम्बिनी प्रदेशको परिचय ७

२.२. भौगोलिक अवस्था ९

२.३. नदी जलाधार ११

२.४. प्रदेशमा जलस्रोतको अवस्था १३

२.४.१. सतही जलस्रोतको अवस्था १३

२.४.२. भूमिगत जलस्रोतको अवस्था १४

२.५. भू-उपयोगको वर्गिकरण १६

३. लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जाको अवस्था १८

४. मन्त्रालयको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बार्षिक प्रगति अवस्था २३

४.१. वित्तीय प्रगति अबस्था २३

४.२. बजेट उपशीर्षकगत प्रगति अवस्था २३

४.३. कार्यालयगत योजना कार्यान्वयनको अवस्था २४

४.४. आ.ब. २०८१/०८२ को मुख्य उपलब्धीहरू २६

४.४.१. सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्य २६

४.४.२. ऊर्जा तर्फ २७

४.४.३. ऐन, कानुन निर्माण २८

५. हाल सम्मको उपलब्धी ३१

५.१. सूचक अनुसारको उपलब्धी ३१

५.२. प्रदेश स्थापना पश्चातको विनियोजन तथा खर्चको सारांश ३४

५.३. मन्त्रालयबाट योजना स्वीकृति (Project Appraisal) भई कार्यान्वयनमा गएका केही योजनाहरु ३६

५.४. ऐन/कानुन निर्माण ३७

६. समस्या तथा चुनौतीहरू ३८

६.१. प्रमुख समस्या ३९

६.२. अवसर र चुनौती ३९

अनुसुचिहरु

अनुसूची १. मन्त्रालय मातहत कार्यालयहरुको दरवन्दी ४०

अनुसूची २ :- जिल्लागत परिचयात्मक विवरण ४६

अनुसूची ३. लुम्बिनी प्रदेशको भू-उपयोगको अवस्था ५९

अनुसूची ४ लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा सिँचाइ योग्य भूमी ५९

अनुसूची ५ लुम्बिनी प्रदेशको सिँचित क्षेत्रको अवस्था ६०

अनुसूची ६आ.व. २०८०/८१ सम्मको जिल्लागत सुचाङ्कमा आधारित प्रगति बिवरण (प्रदेश स्थापना पश्चात) ६१

अनुसूची ७ प्रदेश स्थापना पश्चात कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भएका मुख्य सिँचाइ योजनाहरूको विवरण ६४

अनुसूची ८ मन्त्रालयबाट योजना कार्यान्वयन स्वीकृती (Project Appraisal) भएका केही योजनाहरुको विवरण ११८

अनुसूची ९ लुम्बिनी प्रदेशसँग सम्बन्धित नक्साहरु १३०

अनुसूची १० **Irrigation Inventry Data of Lumbini Province (IMP** २०१९) १३८

अनुसूची ११ ऊर्जाका विकास तर्फका सम्पन्न योजनाहरु १८०

अनुसूची १२ आ.व. २०८२/८३ को कार्यालयगत योजना विवरण १८८

अनुसूची १३ मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुको सम्पर्क विवरण १९६

अनुसूची १४ मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरुमा कार्यरत इन्जिनियरिंग सेवाका कर्मचारीहरुको विवरण १९८

तालिका सुची

तालिका १: मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयमा रहेको जनशक्ति विवरण ५

तालिका २: मन्त्रालय तथा सचिवालयको कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारी ६

तालिका ३: लुम्बिनी प्रदेशको जिल्लागत परिवार संख्या र जनसंख्या ७

तालिका ४: लुम्बिनी प्रदेशको जिल्लागत क्षेत्रफल (निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र बाहेक) ९

तालिका ५: लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक विभाजन १०

तालिका ६: लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने सहायक जलाधार क्षेत्रहरुको विवरण १२

तालिका ७: लुम्बिनी प्रदेशको सतही जलप्रवाहको विवरण १३

तालिका ८: लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावना १५

तालिका ९: लुम्बिनी प्रदेशको भू-उपयोगको स्थिति १६

तालिका १०: प्रदेश भित्रका विद्युत उत्पादन आयोजनाहरू १८

तालिका ११: सर्वेक्षण अनुमति लिएका जलविद्युत आयोजनाहरू १९

तालिका १२: प्रदेशका सम्भावित ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू १९

तालिका १३: सम्भावित साना जलविद्युत आयोजनाहरू ३०

तालिका १४: उत्पादन अनुमति लिएका सौर्य ऊर्जाका आयोजनाहरू २०

तालिका १५: क्षेत्रिय कार्यालय मातहत रहेका वितरण प्रणालीको विवरण २१

तालिका १६: उच्च क्षमताका विद्यमान प्रसारण लाइन २१

तालिका १७: आ.व. २०८१/८२ को बिनियोजन र खर्च विवरण (रकम रु हजारमा) २३
तालिका १८: बजेट उपशिर्षकगत बिनियोजन तथा खर्च विवरण (रकम रु हजारमा) २३
तालिका १९: कार्यालयगत योजना कार्यन्वयनको अवस्था २४
तालिका २०: आ.व. २०८१/८२ मा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा प्राप्त उपलब्धी २६
तालिका २१: आ.व. २०८१/८२ मा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धी २७
तालिका २२: आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालित तालिमको विवरण २८
तालिका २३: गोष्ठी तथा छलफल कार्यक्रमहरूको विवरण २९
तालिका २४: पुरष्कृत हुने कर्मचारी, उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरूको विवरण २९
तालिका २५: सूचकका आधारमा वार्षिक उपलब्धीहरु (सिँचाइ तथा जलउत्पन्न) ३१
तालिका २६: सूचकका आधारमा वार्षिक उपलब्धीहरु (ऊर्जा) ३२
तालिका २७: वार्षिक विनियोजन तथा खर्चको सारांश ३४
तालिका २८: मन्त्रालयबाट तयार भएका र हुने क्रममा रहेका कानुनहरुको विवरण ३६

चित्र सुची

चित्र १: मन्त्रालयको संगठन संरचना ५
चित्र २: लुम्बिनी प्रदेशको औसत मासिक तापक्रम ८
चित्र ३: लुम्बिनी प्रदेशको औसत मासिक वर्षा ९
चित्र ४: लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक विभाजन १०
चित्र ५: लुम्बिनी प्रदेशको Topographical नक्शा ११
चित्र ६: लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने प्रमूख नदीहरु १२
चित्र ७: लुम्बिनी प्रदेशको जलस्रोतको सम्भाव्यता १३
चित्र ८: Schematic Geologocal cross-section of Nepal Himalaya १४
चित्र ९: लुम्बिनी प्रदेशमा भू-उपयोगको अवस्था १७
चित्र १०: प्रदेश स्थापना पछि चालू बजेट र खर्चको विवरण ३५
चित्र ११: प्रदेश स्थापना पछि पूँजीगत बजेट र खर्चको विवरण ३५
चित्र १२: प्रदेश स्थापना पछि कुल बजेट र खर्चको विवरण ३६

१. मन्त्रालयको परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना तय गरेको छ। संविधान वमोजिम नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम पूर्वी भाग, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरू समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको स्थापना भएको छ। यस प्रदेशमा ६ वटा जिल्लाहरू तराई क्षेत्रमा, ५ वटा जिल्लाहरू पहाडी क्षेत्रमा, र १ वटा जिल्ला हिमाली क्षेत्रमा रहेका छन् भने करिब ५४ प्रतिशत भू-भाग तराई तथा भित्रि मधेश क्षेत्रमा रहेको छ। यस प्रदेशमा ४ उप-महानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्।

प्रदेश भित्रका सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, आवास, जस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने उद्देश्यले मिति २०७४/१०/१९ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन भई कार्य हुँदै आएकोमा प्रदेश सरकारको मिति २०७८/५/१३ को निर्णयानुसार प्रदेश भित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र संग सम्बन्धित कार्यहरू गर्न छुट्टै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गठन भई सिँचाइ, तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण, विद्युत तथा नविकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी कार्य हँदै आएको थियो। तत् पश्चात प्रदेश सरकारको मिति २०७९/१०/२७ को निर्णयानुसार साबिकको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समाहित गरी कामकाज हुँदै आएकोमा पुनः लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०८१/०१/०६ को निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गठन भई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू हुँदै आएको छ।

यस प्रदेशमा सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ अनुसार करिव ६ लाख ७९ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन रहेकोमा हालसम्म करिव ३ लाख ६० हजार हेक्टर भू-भागमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। सिँचित जमिनको करिब ३५ प्रतिशत भू-भागमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सेवा उपभोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई समेत अनुकुलित गर्दै पानीको अधिकतम उपभोग मार्फत कृषिको उत्पादकत्व बृद्धि गरी समग्र आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुऱ्याउने उद्देश्यले **"कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार"** भन्ने मूल नाराका साथ विद्यमान सिँचाइ संरचनाको मर्मत सम्भार तथा सुदृढीकरण गरी बाह्रै महिना सिँचाइ हुने क्षेत्रको बढोत्तरी गर्ने, भूमिगत सिँचाइ, सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ जस्ता नयाँ सिँचाइ प्रणालीको विकास गरी थप सिँचित क्षेत्र विकास गर्ने गरी सिँचाइ सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन भई रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य प्रकोपहरू व्यवस्थापन तथा न्यूनिकरण कार्य वातावरणीय अनुकुलन हुनेगरी गर्न प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका नदी/पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू समेत हुँदै आइरहेको छ । साथै प्रदेशमा विद्युत सेवा नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत सेवा

प्रदान गर्न र विद्यमान विद्युत वितरण प्रणालीलाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी हाल भइरहेका विद्युत संरचनाको स्तरोन्नति तथा विद्युत सेवा नपुगेको स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत सेवा प्रदान गर्न **"उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश"** को अवधारणा अनुरुप यस प्रदेशलाई विद्युतमा पूर्ण पहुँच भएको प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यहरू हुँदै आइरहेको छ।

यस मन्त्रालय मातहत एक वटा प्रदेश ऊर्जा कार्यालय मार्फत प्रदेशभर विद्युत, नविकरणीय ऊर्जा, बायो ग्याँस, हरित ऊर्जा सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ। १२ वटै जिल्लामा रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन/सब-डिभिजन कार्यालयहरूबाट सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेका छन्। रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा रहेका तिन वटा भूमिगत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू मार्फत भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास तथा संरचना मर्मत सम्भार गरी वर्षैभरि सिँचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको अवस्था छ। यसैगरी बाणगंगा सिँचाइ प्रणाली, कपिलबस्तु र प्रगन्ना सिँचाइ प्रणाली, दाङको लागि छुट्टाछुट्टै सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयहरूबाट तत् तत् प्रणालीको संचालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ।

१.२ सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति

यस मन्त्रालयले "कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार" भन्ने मूल नाराका साथ उपलब्ध सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ तथा भूमिगत सिँचाइ योजनाहरूको विकास तथा सुदृढीकरण गरी कृषिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको सिँचाइ सेवाको सुनिश्चिता गर्ने र "उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश" भन्ने मूल नाराका साथ सौर्य ऊर्जा र वायो ग्याँस जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्दै विद्युत प्रणालीको विकास तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गरी जनतासंग ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गर्न यस मन्त्रालयले उद्देश्य तपसिल वमोजिमका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति लिएको छ।

सोचः

- कृषि उत्पादकत्व बृद्धिको लागि प्रयास सिँचाइ सुबिधा भएको प्रदेश।
- जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण भएको सुरक्षित प्रदेश।
- प्रदेशको जलविद्युत सम्भावनाको अधिकतम सदुपयोग र यसको प्रयोग अभिवृद्धि।
- सौर्य ऊर्जालाई मुलधारको विद्युत ऊर्जाको रुपमा विकास गरेको अग्रणी प्रदेश।
- जैविक ऊर्जाको प्रवर्द्धन मार्फत नविकरणीय ऊर्जामा निर्भर प्रदेश।

लक्ष्यः

- कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो एवम् दिगो सिँचाइको व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुऱ्याउने।

- जलउत्पन्न प्रकोपबाट हुने मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने।
- स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत उत्पादन र यसको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउने ।
- नमुना परियोजनाहरूको लगानीमा निजी क्षेत्रलाइ आकर्षित गरेर यस प्रदेशलाई सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा अग्रणी प्रदेश बनाउने।
- वायो ग्याँस, वायो डिजेल, वायो ब्रिकेट जस्ता वायो इन्धन, र वायुमा आधारित ऊर्जाको प्रवर्धनद्वारा ऊर्जामा परनिर्भरता कम गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जामा अग्रणी बन्ने।

उदेश्यः

- दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुबिधाको बिस्तार गर्नु।
- जलउत्पन्न प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्नु ।
- विद्युतमा सबै जनताको पहुँच पुऱ्याउने।
- विद्युत खपत बढाउनुका साथै जल विद्युतमा भएको सम्भावनाको सदुपयोग गर्नु ।
- सौर्य ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोग बढाउनु।
- जैविक तथा वायु ऊर्जाको विकास र उपभोगमा प्रवर्द्धन गर्नु।

रणनीति :

- विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर दिगो रुपमा सिँचाइ सुबिधा विस्तार गर्ने।
- सिँचाइको प्राथमिक उद्देश्य सहितका प्रादेशिक गौरवका आयोजना विकास गर्ने।
- सिँचाइ आयोजनाबाट सह-उत्पादनको रुपमा विद्युत निकाल्न प्रोत्साहन गर्ने।
- जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण र नदी व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने।
- विद्युत नपुगेका स्थानहरूमा विद्युत सेवा बिस्तार गर्ने।
- यातायात, उद्योग, र घरायसी प्रयोग मार्फत विद्युत खपत बढाउने।
- जलविद्युतमा निजी, सामुदायिक तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने।

१.३ कार्य जिम्वेवारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ अनुसार यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी निम्न प्रकार रहेको छ।

» प्रदेशस्तरको ऊर्जा, विद्युत, तथा सिँचाइ सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन।

» ऊर्जा, विद्युत, सिँचाइ सेवा बिस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन।

- » राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना वमोजिम प्रदेश सीमा नदीका जल उपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, संचालन, सम्भार र व्यवस्थापन।
- » प्रदेशभित्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरुयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन।
- » प्रदेशभित्रको जलस्रोत नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन।
- » मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्चाल व्यवस्थापन।
- » जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन।
- » प्रदेशभित्रको नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरुयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मुल्याङ्कन।
- » प्रदेशमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, व्यवस्थापन र गुणस्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन।


राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को अनुसूची १ ले देहाय बमोजिमका कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।

- » सतह सिँचाइ (नयाँ निर्माण र सिँचाइ व्यवस्थापन/सञ्चालन) को हकमा तराई-मधेशमा ५०० भन्दा बढि ५००० हेक्टरसम्म, पहाडमा ५० भन्दा माथी १०० हेक्टरसम्म र हिमालमा २५ हेक्टर भन्दा बढी ५० हेक्टरसम्म सिंचित क्षेत्र भएका आयोजनाहरू।
- » भूमिगत सिँचाइ (नयाँ निर्माण) को हकमा तराई-मधेशमा एकल वा क्लष्टरमा २००० हेक्टरसम्मको डिप ट्यूववेल, पहाड वा हिमालमा एकल वा क्लष्टरमा १०० हेक्टरसम्मका डिप ट्यूववेल।
- » लिफ्ट सिँचाइ (नयाँ निर्माण)को हकमा क्लष्टरमा २५ भन्दा बढी १०० हेक्टरसम्म सिंचित क्षेत्र भएका आयोजनाहरू।
- » नदी नियन्त्रणको हकमा तराई-मधेशमा एकातर्फ वा दुवैतर्फ १० कि.मी. सम्म तटबन्ध गर्नुपर्ने नदीहरू र पहाड वा हिमालमा एकातर्फ वा दुवैतर्फ ५ कि.मी. सम्म नदी तटबन्ध गर्नुपर्ने नदीहरू।
- » पहिरो नियन्त्रणको हकमा लम्बाइ १०० मिटरभन्दा बढी २०० मिटरसम्म, फेदको चौडाई ५० भन्दा बढी १०० मिटरसम्म र कुल क्षेत्र ५००० भन्दा बढी २०००० वर्ग मिटरसम्म।
- » विद्युतको हकमा १ भन्दा बढी २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत वा १ मेगावाटसम्मको सौर्य र वायू ऊर्जा उत्पादन।
- » विद्युत प्रसारण लाइनको हकमा ११ के.भी. प्रसारण लाइन।

१.४ जनशक्ति तथा संगठन संरचना

यस मन्त्रालयमा जलस्रोत तथा सिँचाइ महाशाखा, ऊर्जा महाशाखा, प्रशासन महाशाखा गरी ३ वटा महाशाखा रहेका छन्। साथै मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न १८ वटा विषयगत कार्यालयहरू क्रियाशिल रहेका छन्।

मन्त्रालयको कुल स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या २७९ जना रहेकोमा हाल १८४ जना कर्मचारीहरू कार्यरत र ९५ जना कर्मचारी रिक्त रहेको अवस्था छ। रिक्त दरवन्दी धेरै जसो प्राविधिक कर्मचारीको रहेको छ। मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयको दरवन्दी सम्बन्धी बिस्तृत बिबरण अनुसूची १ मा र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बिवरण तालिका १ मा देखाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संगठन संरचना तपसिल वमोजिम रहेको छ।

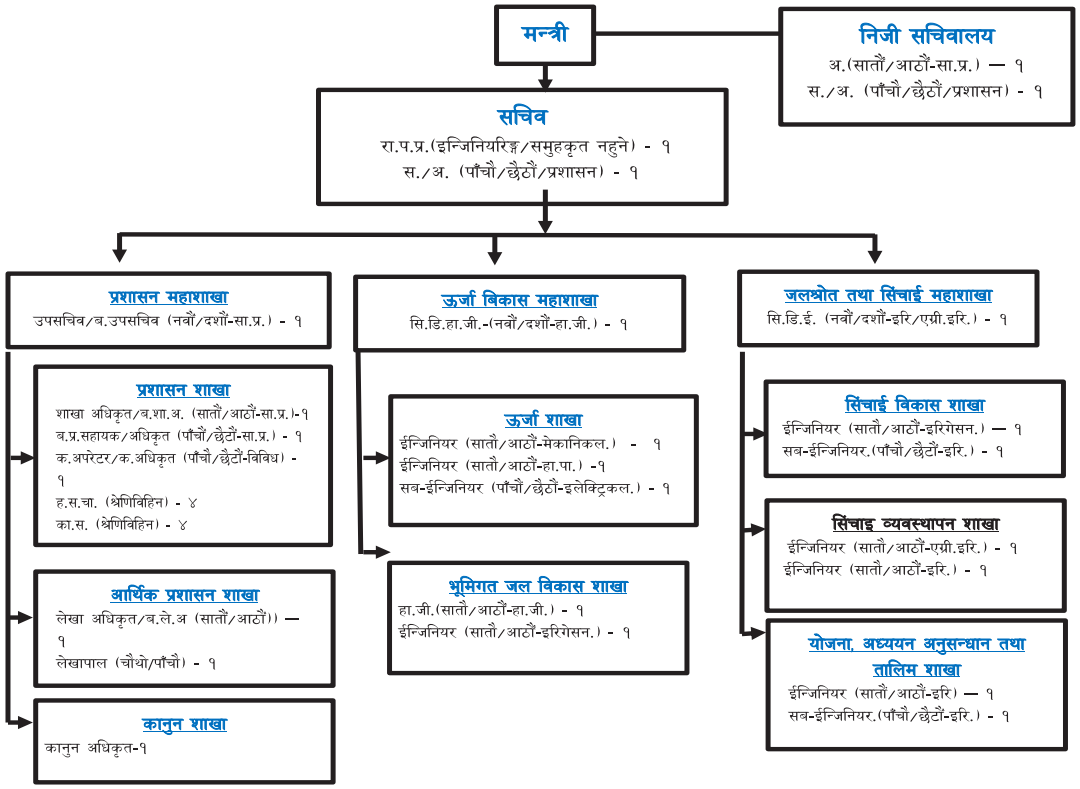

चित्र १: मन्त्रालयको संगठन संरचना

तालिका १: मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयमा रहेको जनशक्ति विवरण

तह	कुल स्वीकृत			हालको पदपुर्ती			रिक्त दरबन्दी		
	प्राविधिक	अप्राविधिक	जम्मा	प्राविधिक	अप्राविधिक	जम्मा	प्राविधिक	अप्राविधिक	जम्मा
रा.प्र.प्रथम	१	०	१	१		१			०
नबौ/दशौ	१९	१	२०	७		७	१२	१	१३
सातौ/आठौ	५४	४	५८	२९		२९	२५	४	२९

तह	कुल स्वीकृत			हालको पदपुर्ती			रिक्त दरबन्दी		
	प्राविधिक	अप्राविधिक	जम्मा	प्राविधिक	अप्राविधिक	जम्मा	प्राविधिक	अप्राविधिक	जम्मा
पाचौ/छैटौ	८१	४८	१२९	५०	३५	८५	३१	१३	४४
चौथौ/पाचौ	६	४	१०	३	१	४	३	३	६
श्रेणी विहिन		६१	६१		५८	५८	०	३	३
कुल जम्मा	**१६१**	**११८**	**२७९**	**९०**	**९४**	**१८४**	**७१**	**२४**	**९५**

१.५ मन्त्रालयमा हालको जनशक्ति विवरण

यस मन्त्रालयमा हाल तपशिल बमोजिमका जनशक्ति रहेका छन्।

तालिका २: मन्त्रालय तथा सचिवालयको कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारी

क्र.सं	कर्मचारीको नाम	पद	कैफियत
१	मा.सीता शर्मा चौधरी	मन्त्री	
२	बिष्णु भण्डारी	सचिव	हाल सरुवा भएको
३	चुर्ण बहादुर ओली	सचिव	
४	महेश पोखेल	सि.डि. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	ऊर्जा महाशाखा प्रमुख
५	कृष्ण बहादुर बि.क	सि.डि.ई.	जलस्रोत तथा सिँचाइ महाशाखा प्रमुख (कामकाज)
६	सुबोध गुरागाई	ब.इन्जिनियर	
७	बिष्णु उपाध्याय	ब.हाइड्रोजियोलोजिस्ट	
८	गोविन्द निरौला	ब.इन्जिनियर	
९	सबिता भण्डारी	ना.सु.	
१०	चन्द्रकला बोगटी	सहायक पाचौ	
११	रिसब आचार्य	कार्यालय सहयोगी	
१२	शान्ति सुनार	कार्यालय सहयोगी	
१३	माया खनाल	कार्यालय सहयोगी	
१४	गुणानिधि पन्थी	कार्यालय सहयोगी	
१५	अजय चौधरी	ह.स.चा.	
१६	परमेश्वोर चौधरी	ह.स.चा.	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

२. लुम्बिनी प्रदेशको जलस्रोत तथा भू-उपयोगको अवस्था

२.१ लुम्बिनी प्रदेशको परिचय

संविधानको अनुसूची -४ मा उल्लेख गरिएका सात वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेश नेपालको मध्य पश्चिमी भागमा पर्छ। मिति २०७७/०६/२० को प्रदेश सभाको निर्णयबाट यस प्रदेशको राजधानी रासी उपत्यका (देउखुरी) र नामाकरण लुम्बिनी प्रदेश कायम भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको नाम बौद्ध धर्मका संस्थापक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पवित्र तीर्थस्थलको नामबाट राखिएको हो।


लुम्बिनी प्रदेश उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म र पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा १७८०९.३९ वर्ग किलोमिटर (निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र बाहेक) भूभाग फैलिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ५१,२२,०७८ रहेको छ।

तालिका ३: लुम्बिनी प्रदेशको जिल्लागत परिवार संख्या र जनसंख्या

क्षेत्र	परिवार संख्या	पुरुष	महिला	जम्मा	परिवारको औसत आकार	लैङ्गिक अनुपात (प्रति सय महिलामा पुरुषको संख्या)	जन घनत्व
रुकुम पूर्व	१२८८६	२७५१६	२९२७०	५६७८६	४.४१	९४.०१	३४
रोल्पा	५२२२१	१०९८७१	१२४९२२	२३४७९३	४.५०	८७.९५	१२५
प्युठान	५६२०३	१०४१३२	१२७८८७	२३२०१९	४.१३	८१.४३	१७७
गुल्मी	६६१२५	११२०२५	१३४४६९	२४६४९४	३.७३	८३.३१	२१५
अर्घाखाँची	४८४६५	८०६७२	९६४१४	१७७०८६	३.६५	८३.६७	१४८
पाल्पा	६५०४९	११२७६१	१३२२६६	२४५०२७	३.७७	८५.२५	१७८
नवलपरासी पश्चिम	८२७३८	१८८१८२	१९८६८६	३८६८६८	४.६८	९४.७१	५२७
रुपन्देही	२३८३२०	५५०४७८	५७१४७९	११२१९५७	४.७१	९६.३३	८२५
कपिलवस्तु	१२१९४६	३३४६८७	३४८२७४	६८२९६१	५.६०	९६.१०	३९३
दाङ्ग	१६२३१६	३२०५७३	३५४४२०	६७४९९३	४.१६	९०.४५	२२८
बाँके	१२९३०७	२९६७४५	३०६४४९	६०३१९४	४.६६	९६.८३	२५८
बर्दिया	१०६३२६	२१६७६६	२४३१३४	४५९९००	४.३३	८९.१५	२२७
लुम्बिनी प्रदेश	११४१९०२	२४५४४०८	२६६७६७०	५१२२०७८	४.४९	९२.०१	२६०

(श्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०७८)

नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय (humid subtropical) हावापानी छ जसमा समय अनुसार फरक-फरक मौसम हुन्छ। जाडो (हल्का र घमाइलो), गर्मी (तातो र आर्द्र), र वर्षा (भारी वर्षा)। जनवरीमा तापक्रम औसत १५°C देखि दक्षिणी मैदानी क्षेत्रमा सबैभन्दा तातो महिनाहरूमा ४०°C भन्दा बढी हुन सक्छ।

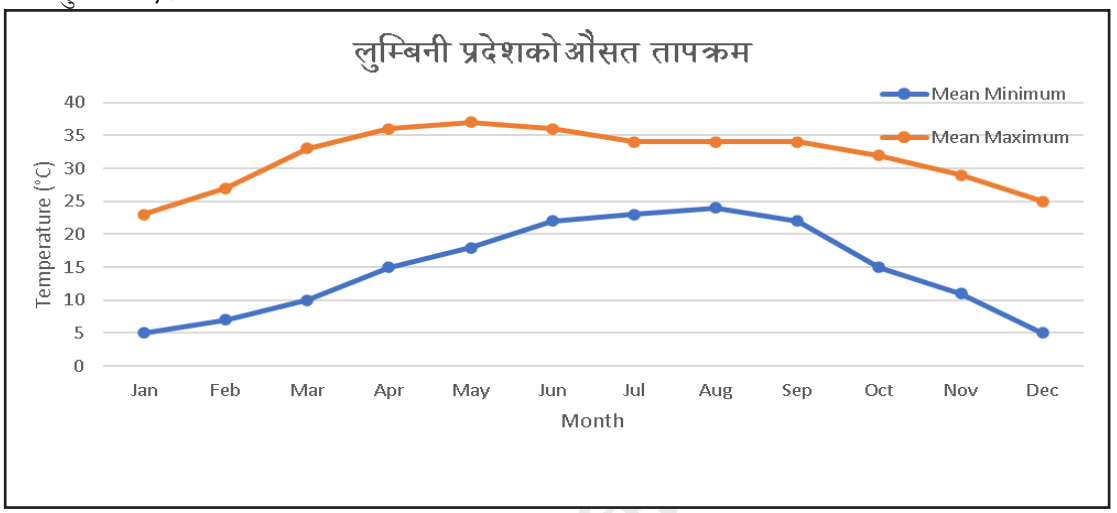


(श्रोतः https://nomadseason.com/climate/nepal/lumbini-province.html)

चित्र २: लुम्बिनी प्रदेशको औसत मासिक तापक्रम

मनसुन ऋतुले विशेष गरी जुलाई र अगस्टमा पर्याप्त वर्षा ल्याउँछ। जनवरीदेखि मार्चसम्म, अपेक्षाकृत कम वर्षा हुन्छ, जनवरीमा मात्र २५ मिमी (१.० इन्च) र फेब्रुअरीमा अलि कम २३ मिमी (०.९ इन्च) वर्षा हुन्छ। अप्रिलमा वर्षा बढ्न थाल्छ, ४५ मिमी (१.८ इन्च) पुग्छ, र मे महिनामा उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ किनकि पूर्व-मनसुन वर्षाले ११९ मिमी (४.७ इन्च) योगदान गर्दछ। यी महिनाहरू, अझै पनि परिवर्तनशील भएतापनि, नजिकिँदै गरेको मनसुन ऋतुको संकेत गर्दछ, जुन जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँछ।

मनसुनको समयमा, लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै वर्षा हुन्छ, जुन जुलाईमा आश्चर्यजनक ५२६ मिमी (२०.७ इन्च) को साथ शिखरमा पुग्छ, त्यसपछि अगस्टमा ४२९ मिमी (१६.९ इन्च) हुन्छ। यो तीव्र वर्षाले प्रदेशको हरिया वनस्पतिलाई कायम राख्छ तर बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपहरू पनि सृजना गर्छ। मनसुन पछि, सेप्टेम्बरमा वर्षामा २९८ मि.मी. (११.७ इन्च) को कमि आउँछ र त्यसपछि ४४ मि.मी. (१.७ इन्च) को साथ सुख्खा अक्टोबरमा परिवर्तन हुन्छ। वर्षको अन्त्य महिनाहरू, विशेष गरी नोभेम्बर र डिसेम्बरमा, न्यूनतम वर्षा हुन्छ, क्रमशः केवल ५ मिमी (०.२ इन्च) र १३ मिमी (०.५ इन्च), जसले वर्षा मौसमको अन्त्यलाई चिन्ह लगाउँछ।

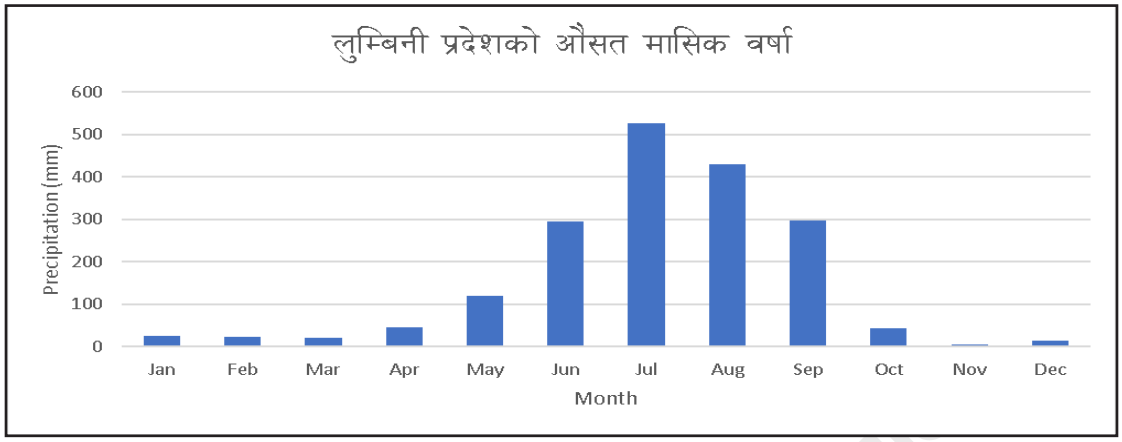

(श्रोतः https://nomadseason.com/climate/nepal/lumbini-province.html)

चित्र ३: लुम्बिनी प्रदेशको औसत मासिक वर्षा

२.२ भौगोलिक अवस्था

यो प्रदेश २७° ३७′ देखि २८° ५०′ उत्तरी अक्षांश र ८०.५° देखि ८४° पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, पश्चिममा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमप्रदेश, उत्तरमा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश तथा दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश राज्य पर्दछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला रहेका छन्।

तालिका ४: लुम्बिनी प्रदेशको जिल्लागत क्षेत्रफल (निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र बाहेक)


जिल्ला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)	जिल्ला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)
नवलपरासी पश्चिम	६३४.८८	रुकुम पूर्व	११६१.१३
रुपन्देही	१२९७.४९	रोल्पा	१८८५.४१
कपिलवस्तु	१६५१.१७	प्युठान	१३२०.१३
पाल्पा	१४६१.९०	दाङ्ग	३०५९.८१
अर्घाखाँची	१२३९.०८	बाँके	१८८२.२७
गुल्मी	१११०.७६	बर्दिया	११०५.३६
लुम्बिनी प्रदेश	**१७८०९.३९**		

(श्रोतः https://mofaga.gov.np/)

यस प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुम हो भने प्रदेशका धेरै भूभाग मध्य पहाडमा पर्दछन्। रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा पहाडी जिल्लाहरु हुन् भने दाङ भित्री मधेसमा पर्ने जिल्ला हो। नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र वर्दिया गरी ५ जिल्लाहरु भने तराइ क्षेत्रमा पर्दछन्।


तालिका ५: लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक विभाजन

क्र. सं.	विवरण	प्रतिशत
१	उच्च हिमालय (Great Himalaya)	३.२%
२	मध्य हिमाल (Fore Himalaya)	८.४%
३	मिडल्यान्ड (Midlands)	२०.७%
४	महाभारत (Mahabharat)	११.९%
५	सिवालिक (Siwalik)	२३.२%
६	भित्री मधेश उपत्यका (Dun valley)	४.८%
७	तराइ (Terai)	२७.९%

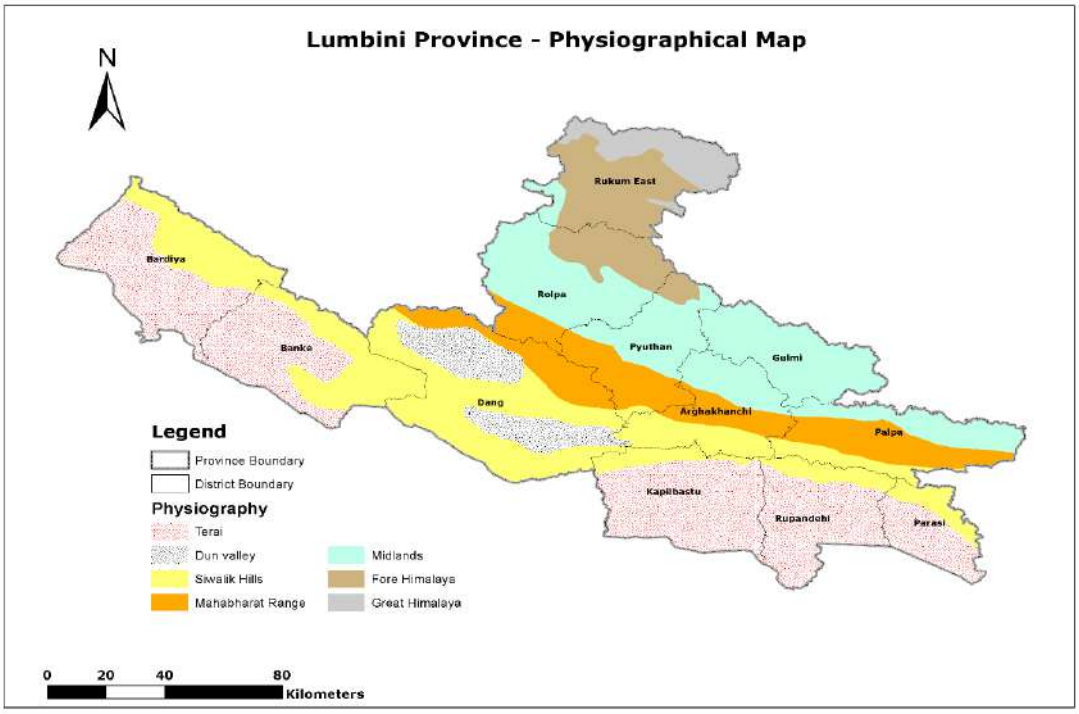

(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना - २०१९)

चित्र ४: लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक विभाजन

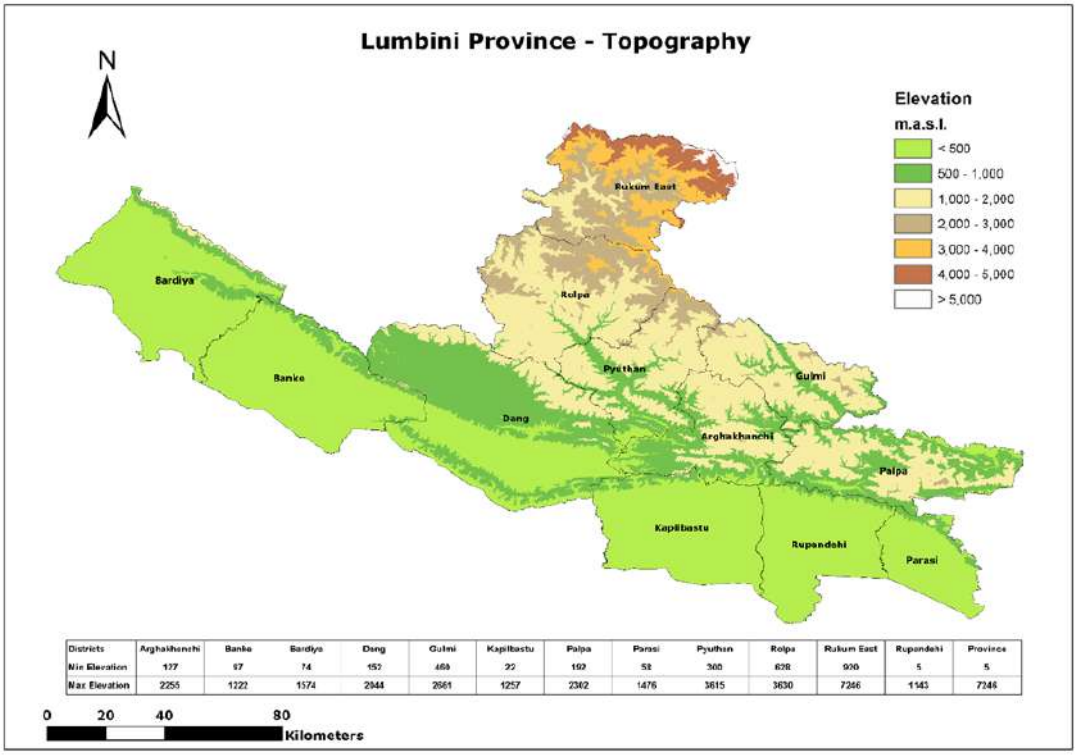


Districts	Arghakhanchi	Banke	Bardiya	Dang	Gulmi	Kapilbastu	Palpa	Parasi	Pyuthan	Rolpa	Rukum East	Rupandehi	Province
Min Elevation	177	97	74	152	469	22	192	52	305	628	920	5	5
Max Elevation	2255	1222	1574	2044	2561	1257	2362	1476	3615	3630	7246	1143	7246

(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना - २०१९)

चित्र ५: लुम्बिनी प्रदेशको Topographical नक्शा

२.३ नदी जलाधार

लुम्बिनी प्रदेशलाई मुख्यतया कर्णाली र नारायणी गरी २ वटा जलाधार क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ जसभित्र ८ वटा सहायक जलाधार क्षेत्रहरू पर्दछन्। यी जलाधार क्षेत्रहरुमा १९५५ कि.मि. लामो बहाब क्षेत्र भएका ४४ वटा नदी तथा खोलाहरू रहेका छन्। सबै भन्दा लामा नदीहरू पश्चिम रापती नदी (२०७.७ कि.मि.), ववई (१६८.८ कि.मि.) र माडी खोला (११५.७ कि.मि.) हुन्। सहायक जलाधार क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो पश्चिम रापती (३५.५३ प्रतिशत) हो भने दोश्रो ठुलो तिनाउ (२२.५१ प्रतिशत), तेस्रो ठुलोमा मानखोला बबई (१७.०८ प्रतिशत) रहेका छन्।

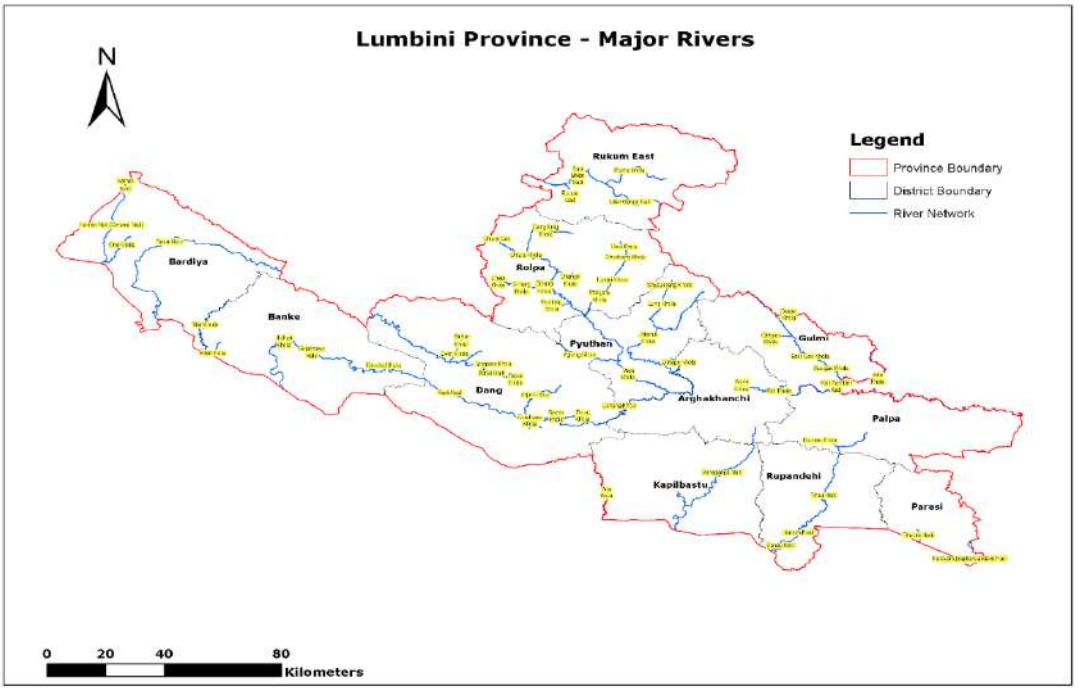

(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना - २०१९)

चित्र ६: लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने प्रमूख नदीहरु

तालिका ६: लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने सहायक जलाधार क्षेत्रहरुको विवरण

सहायक वेशिन	क्षेत्रफल प्रतिशतमा
पश्चिम रापती (L)	१६.६६%
पश्चिम रापती (U)	१८.८७%
नारायणी (L)	१.५०%
बाणगंगा तिनाउ	२२.५१%
कालिगण्डकी (L)	११.२५%
सानी भेरी	८.७३%
बबई मानखोला	१७.०८%
तल्लो कर्णाली	३.४०%

(श्रोतः भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग)

२.४ प्रदेशमा जलस्रोतको अवस्था


२.४.१ सतही जलस्रोतको अवस्था

सिँचाइ गुरुयोजना - २०१९ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश भित्र ६ वटा जलस्रोतका सब-वेशिनहरु पर्दछन् भने प्रदेशको वार्षिक सतही जलप्रवाह करिब ८ अरब घनमिटर प्रति वर्ष रहेको छ।

तालिका ७: लुम्बिनी प्रदेशको सतही जलप्रवाहको विवरण

सब-वेसिन	सतही जलस्रोत (Mm³/year)	लुम्बिनी प्रदेशभित्र पर्ने क्षेत्र (प्रतिशत)	लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने सतही जलस्रोत (Mm³/year)
११	३९४०	०.३२%	१२.५१
१२	२८९९	६०.९५%	१७६७.०२
१६	३७३३	६२.४७%	२३३२.०१
१७	१६५३	९९.५४%	१६४५.३५
१८	८७२२	१.९०%	१६६.०५
२३	२७२१	४०.०१%	१०८८.७०
२४	४६१	१००.००%	४६१.००
२५	१५८८	३१.३१%	४९७.१६
	जम्मा		**७९६९.८०**

(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना - २०१९)

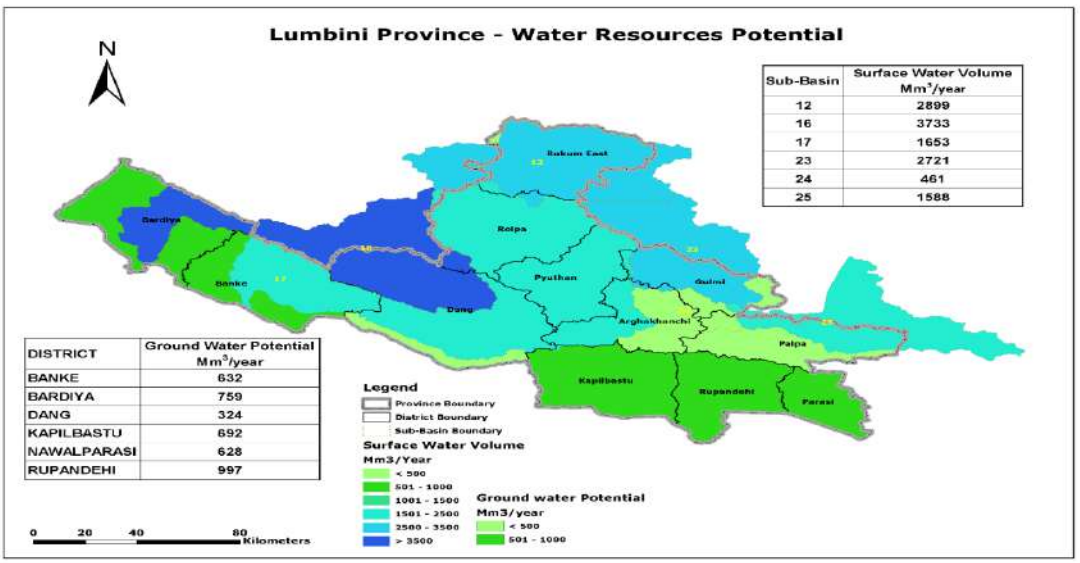


(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना - २०१९)

चित्र ७: लुम्बिनी प्रदेशको जलस्रोतको सम्भाव्यता

२.४.२ भूमिगत जलस्रोतको अवस्था

सिँचाइ गुरु योजना २०१९ बमोजिम नेपालमा करिब १२ अर्ब घ.मि. बार्षिक भूमिगत जलको भण्डारण हुने र धेरै जसो भूमिगत जलको अवस्थिति तराईको मैदानी भू-भागमा हुने हुँदा यस प्रदेशको तराई क्षेत्र, पहाडका बेसी तथा टार क्षेत्रहरु भूमिगत जलस्रोतको सम्भावना भएको क्षेत्र मानिन्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वर्षातको पानीको करिब ८-१० प्रतिशत भूमिगत स्रोतको रुपमा जमिनमुनि जान्छ। सुख्खा मौसममा नदीको बहाबमा करिब १० प्रतिशत जति योगदान भूमिगत जलले दिने गर्छ, त्यसकारण प्रमुख नदीको स्रोत भूमिगत जल र हिँउ नै हो भने साना खोलाहरूको स्रोत भूमिगत जल मात्रै भएको बिभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ। यस प्रदेशको तराईका भू-भागका अतिरिक्त दाङ, देउखुरी जस्ता दुन उपत्यकामा भूमिगत जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको र हाल सिँचाइ, घरेलु उपयोग तथा औद्यौगिक प्रयोजनमा भूमिगत जलको प्रयोग भईरहेको छ। तराईको खानेपानीको एक मात्र स्रोत भूमिगत जल रहेको छ भने पहाडमा ढुँगे धारा, कुवा आदिको स्रोत समेत पनि भूमिगत जल नै रहेको छ।

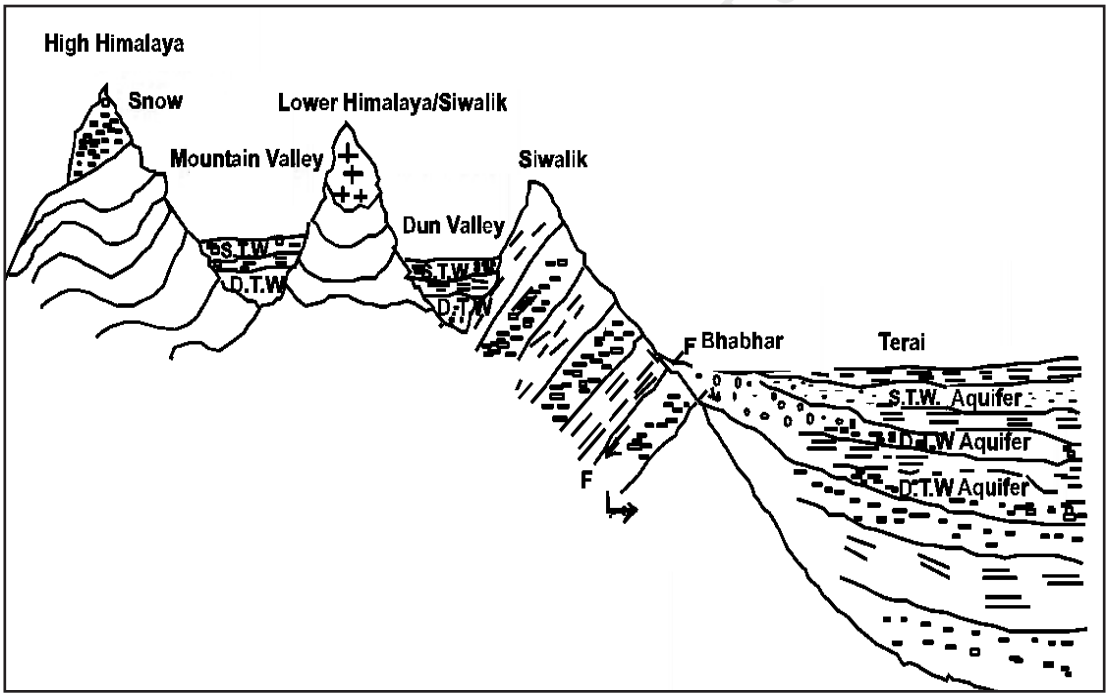

(स्रोतः सि. के. शर्मा १९९५)

चित्र ८: Schematic Geologocal cross-section of Nepal Himalaya

तराई क्षेत्रमा छिद्र सहितका माटोका पत्रहरू भएकोले तराईलाई भूमिगत जलस्रोतको मुख्य संभावित क्षेत्र मान्न सकिन्छ । तराइको भू-गर्भमा उत्तरी क्षेत्रको पहाडी भूभागबाट बहने साना ठुला नदिहरूले बगाएर

ल्याएको नदिजन्य पत्रैपत्रको थेग्रोहरू (Alluvial deposit) रहेको छ। यस्ता ठुला साना ग्राभेल, मोटो मसिनो बालुवा र मसिनो पाँगो माटोका थेग्रोहरूका पत्रहरूमा भएको छिद्रहरुमा भूमिगत जल संचित हुने गर्दछ। पहाडबाट निस्कने नदीहरूको तथा वर्षातको पानी उत्तरी तराइको भावर क्षेत्रबाट प्रचुर मात्रामा पुनर्भरण हुने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जमिनको प्रयोगमा आएको परिवर्तन, भावर र चुरे क्षेत्रको वन विनास, मौसमी चक्रमा आएको परिवर्तन, चुरे क्षेत्रको नदी नालामा भई रहेको अत्यधिक नदिजन्य पदार्थको उत्खनन लगाएतका कारणले भूमिगत जलको पुनर्भरणलाई प्रतिकुल असर गरिरहेको छ। तराई क्षेत्रमा हालसालै देखिएको चापाकल/ ट्युववेलहरू सुक्ने, ट्युववेलमा पानीको सतह घट्ने जस्ता समस्याहरू पानी पुनर्भरणमा आएको प्रतिकुलताका कारण श्रृजित समस्या रहेको देखिन्छ ।

उपयोग र नियन्त्रण कृषकको हातमा हुनु, सुख्खा खडेरीमा पनि संचालन हुने, जुनसुकै समयमा पानीको पहुँच हुने, धेरै संरचना आवश्यक नपर्ने, ठुलो लगानी आवश्यक नपर्ने, छोटो अबधिमा योजना सम्पन्न हुने, प्रविधिमा भएको विकासले सस्तो निर्माण र संचालन लगाएतका कारणले गर्दा तराई क्षेत्रको सिँचाइमा भूमिगत जलस्रोत लोकप्रिय र कृषकको रोजाईमा रहेको छ। बढ्दो भूमिगत जलको दोहनले देखिन सक्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न समयमा नै सजग हुन जरुरी छ। पानी खेर नजाने गरी प्रयोग/पूनः प्रयोग गर्ने, पानी पुनर्भरणको क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षण गर्ने, पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गर्ने, पानीका मुहान/स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने, र तीनै तहका सरकारहरूले जलस्रोत नियमन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न अत्यन्तै जरुरी देखिएको छ।

तालिका ८: लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावना

जिल्ला	भूमीगत जलस्रोतको सम्भावना ($Mm^3/year$)
बाँके	६३२
बर्दिया	७५९
दाङ्ग	३२४
कपिलवस्तु	६९२
नवलपरासी	६२८
रुपन्देही	९९७
जम्मा	४०३२

(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना २०१९)


२.५ भू-उपयोगको वर्गिकरण

लुम्बिनी प्रदेशको अधिकांश भूभाग (५३.४८%) बन जंगलले ओगटेको छ। कृषि योग्य भूमी करिब ६ लाख ७९ हजार हेक्टर (३५.१४%) रहेको छ।

तालिका ९: लुम्बिनी प्रदेशको भू-उपयोगको स्थिति

जिल्ला	कृषि- समथर गह्रा	कृषि - भिरालो पाखा	कृषि - उपत्यका, टार, तराइ	बाँझो	वन क्षेत्र	आवास क्षेत्र	जल क्षेत्र	बुट्यान/घाँसे मैदान	हिउँ/ हिमनदी
अर्घाखाँचि	०.१७%	१५.७३%	६.९८%	०.०९%	७६.०३%	०.०३%	०.२८%	०.७०%	०.००%
बाँके	०.००%	०.००%	३०.८२%	१.५७%	६०.७८%	१.६५%	१.५९%	३.६०%	०.००%
बर्दिया	०.००%	०.००%	३२.४२%	२.१०%	५५.२२%	२.०२%	५.०५%	३.१८%	०.००%
दाङ	०.०२%	३.८४%	३१.०९%	३.०३%	५६.१२%	०.७६%	४.१५%	१.००%	०.००%
गुल्मी	१३.७०%	२५.८०%	२.२४%	०.५०%	५४.४३%	०.४५%	०.९७%	१.९०%	०.००%
कपिलवस्तु	०.००%	०.१३%	५७.०७%	०.००%	३४.७२%	१.८६%	२.४७%	३.७४%	०.००%
नवलपरासी पश्चिम	०.००%	०.२९%	५६.६७%	१.०९%	३०.६९%	२.५८%	५.०८%	३.६१%	०.००%
पाल्पा	१.३३%	३९.९७%	४.०६%	०.३६%	५०.५७%	०.५४%	२.०४%	१.१३%	०.००%
प्युठान	३.८३%	१०.९३%	४.४०%	०.१०%	७३.४१%	०.०९%	२.०१%	५.२१%	०.००%
रोल्पा	५.०७%	१९.२६%	१.१४%	०.०१%	६९.११%	०.०४%	०.९१%	४.४६%	०.००%
रुकुम पूर्व	०.३९%	४.७१%	०.५३%	१०.५९%	४५.५८%	०.०२%	०.९४%	२९.८३%	७.४१%
रुपन्देही	०.००%	०.१७%	६८.५२%	०.२२%	१९.००%	६.७८%	१.९०%	३.४०%	०.००%
प्रदेश	१.६९%	९.१९%	२४.२६%	१.९०%	५३.४८%	१.२८%	२.४०%	५.१५%	०.६५%

(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना-२०१९)

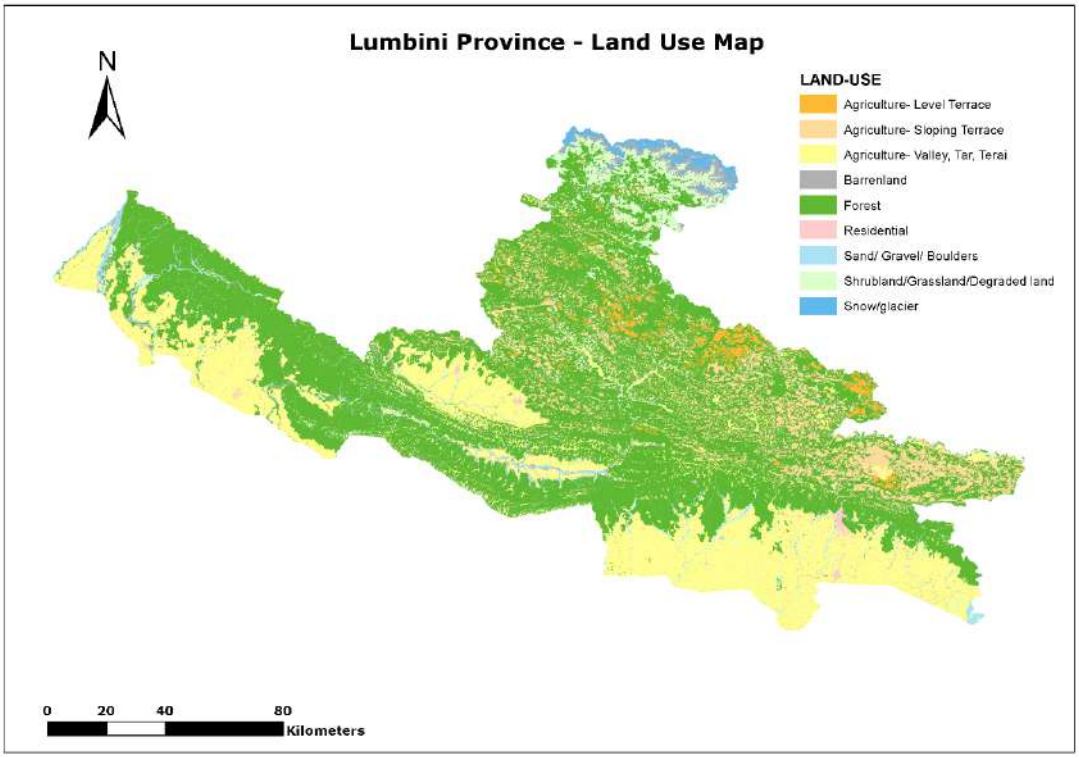

(स्रोतः सिँचाइ गुरुयोजना - २०१९)

चित्र ९: लुम्बिनी प्रदेशमा भू-उपयोगको अवस्था

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ

३. लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जाको अवस्था

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाहरूमध्ये भौगोलिक जटिलताका कारण तराई क्षेत्रको तुलनामा पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा विद्युतिकरण कम भएको पाईन्छ। २०८१ चैत्रसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ जुन २०७४ सालमा ७४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कका आधारमा रोल्पा तथा पूर्वी रुकुममा सबै भन्दा कम विद्युतिकरण भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, साना तथा लघु जलविद्युत, सौर्य प्रणाली, तथा अन्य विकेन्द्रीकृत प्रणालीहरूको विकासले विद्युत सेवा बिस्तार सम्भव भएको हो। यद्यपी, विद्युत सेवा बिस्तार तथा प्रयोगमा देखिएका केही चुनौतीहरू जस्तैः केही क्षेत्रमा नियमित रुपमा लाइन जाने, दूरदराजका गाउँहरूमा स्थिर लाइन पुग्न नसक्नु, विद्युत महसुल र विद्युतीय उपकरणहरू महँगो हुँदा विद्युतको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिने चुनौती थपिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३००० मेगावाट रहेता पनि हालसम्म ४२.२ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको देखिन्छ। सौर्य विद्युतबाट करिब १२० मेगावाट र हाईब्रिड प्रविधिबाट ०.०२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भईरहेको छ। यस प्रदेशमा रहेका निर्माणाधिन विद्युत आयोजनाहरूमध्ये निकट भविष्यमै जलविद्युत आयोजना र सौर्य विद्युत आयोजनाबाट करिब ५० मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ। साथै यस प्रदेशमा नेपाल सरकारको वास्केटमा रहेका साना जलविद्युत आयोजनाहरू बाट करिब ८४.४२ मेगावाट र सम्भावित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूबाट करिब ३००० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनुका साथै जलाशययुक्त आयोजनाबाट सिँचाइ प्रणाली विस्तार तथा पर्यटन प्रर्वधन समेत गर्न सकिने सम्भावना समेत रहेको छ।

तालिका १०: प्रदेश भित्रका विद्युत उत्पादन आयोजनाहरू

क्र.सं.	आयोजना	स्थान	जल विद्युत उत्पादन (मे.वा.)	उत्पादन सुरु
१	झिमरुक हाइड्रो पावर	झिमरुक नदी, प्युठान	१२.३	२०५१
२	रिडी हाइड्रो पावर	रिडी खोला, गुल्मी	२.४	२०६६
३	रुरु हाइड्रो पावर	हुन्दी खोला, गुल्मी	५	
४	गण्डक हाइड्रो	गण्डक नहर, नवलपरासी	१५	
५	तिनाउ हाइड्रो पावर	तिनाउ खोला , पाल्पा	१.७५	
६	गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर	सिस्नेखोला पाल्पा	०.७५	२०६४
७	धन्सीखोला	धन्सीखोला रोल्पा	०.९५	
८	रापि हाइड्रो पावर	रुकुमगाड रुकुम	५	२०७९
कुल			४२.२	

(स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बार्षिक प्रतिवेदन २०२४)

तालिका ११: सर्वेक्षण अनुमति लिएका जलविद्युत आयोजनाहरू

क्र.सं.	जिल्ला	स्थान	उत्पादन (मे.वा.)
१	पाल्पा	तिनाउ खोला	३.४४
२	गुल्मी	नेटा	२४.४
३	रुकुम पुर्व	रुकुम गाड	४.३७
४	रुकुम पुर्व	सिस्ने खोला	५.२४
५	रुकुम पुर्व	रारुसी	४४.५२
६	रुकुम पुर्व	रान्मामेकोट	४.३६
७	रुकुम पुर्व	शोभा	२३.२१
८	प्युठान	झिमरुक	१.५
९	प्युठान	लुंग	२.४२
जम्मा			**११३.४६**

(स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बार्षिक प्रतिवेदन २०२४)

तालिका १२: प्रदेशका सम्भावित ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू

क्र.सं.	जिल्ला	आयोजना	क्षेमता (मे.वा.)	कैफियत
१	कपिलबस्तु	रासी-कपिलबस्तु डाईवर्सन	४५	
२	पाल्पा	कालिगण्डकी	८७०	जलासय युक्त
३	पाल्पा	कालिगण्डकी-तिनाउ डाईवर्सन	१०५	
४	गुल्मी	रिडी खोला	९७	जलासय
५	गुल्मी	तल्लो बडीगाड	३८०	जलासय
६	रुकुम पुर्व	उत्तर गंगा	६००	जलासय
७	रोल्पा	माडी	२५३	जलासय
८	प्युठान	नौमुरे	२४५	जलासय
९	प्युठान	अपर झिमरुक	१००	जलासय
१०	प्युठान	तल्लो झिमरुक	१४३	जलासय
११	दांग	माडी-दांग डाईवर्सन	८६	
१२	बर्दिया	भेरी-बबई डाईवर्सन	४८	
कुल			**२९४२**	

(स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बार्षिक प्रतिवेदन २०२४)

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

तालिका १३: सम्भावित साना जलविद्युत आयोजनाहरू

क्र.सं.	जिल्ला	आयोजना	क्षेमता (मे.वा.)	कैफियत
१	गुल्मी	बडीगाड	७	
२	गुल्मी	छल्दीखोला	४.९६	
३	गुल्मी	अपर बडीगाड	५	
४	गुल्मी	हुक्दी	३.६	
५	गुल्मी	पानागाड	१.२	
६	रोल्पा	बोन्जनखोला	२	
७	रोल्पा	चुरियागाड	२.८	
८	रोल्पा	कालीगाउँ खोला	२	
९	रोल्पा	माडीखोला	३.६	
१०	रोल्पा	सिवानखोला	४.९६	
११	रोल्पा	लुन्ग्री खोला	१०	
१२	रुकुम पुर्व	लहुखोला	४	
१३	रुकुम पुर्व	सेर्पूदह	३०.०१	
१४	अर्घाखांची	बाणगंगा	३.२	
कुल जम्मा			**८४.४२**	

(स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बार्षिक प्रतिवेदन २०२४)

तालिका १४: उत्पादन अनुमति लिएका सौर्य ऊर्जाका आयोजनाहरू

क्र. सं.	उत्पादक	योजना	जिल्ला	क्षेमता (मे.वा.)	बर्ष	कैफिएत
१	पशुपती रिन्युएबल क.	धर्मनगर सोलार फर्म	कपिलबस्तु	१०	२०८०	
२	पशुपती रिन्युएबल क.	धर्मनगर सोलार फर्म	कपिलबस्तु	१५	२०८०	
३	फर्स्ट सोलार क.	भूकुटी ग्रिड	कपिलबस्तु	८	२०७७	
४	अर्खाभगबती भेन्चर	अर्घा सोलार	अर्घाखाँची	१०	२०८०	
५	प्राइम पावर क.	लमही सोलार	दाङ	१०	२०८०	
६	प्राइम पावर क.	कपिलबस्तु सोलार	कपिलबस्तु	३०	२०८१	
७	गोर्खा कन्जिनिएल इनर्जी	लमही सोलार	दाङ	३०	२०७५	
८	सुर्य पावर क	बिष्णु प्रिया सोलार	नवलपरासी	०.९	२०७४	

क्र. सं.	उत्पादक	योजना	जिल्ला	क्षेमता (मे.वा.)	बर्ष	कैफियत
९	रिडी हाइड्रो क.	बुटवल सोलार	रुपन्देही	८.५	२०७७	
१०	नेसनल सोलार क.	ग्रिड कनेकटेड सोलार	नवलपरासी	५	२०७९	
११	सौर्य विद्युत पावर	ग्रिड कनेकटेड सोलार	नवलपरासी	२	२०८०	
१२	पेवर इनर्जी क	नैनापुर सोलार प्रोजेक्ट-२	बाँके	१०	२०८०	
१३	पेवर इनर्जी क	नैनापुर सोलार प्रोजेक्ट-१	बाँके	१०	२०७८	
				१२२.४		

(स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बार्षिक प्रतिवेदन २०२४)

तालिका १५: क्षेत्रिय कार्यालय मातहत रहेका वितरण प्रणालीको विवरण

ने.बि.प्र.का क्षेत्रीय/प्रादेशिक कार्यालय	सब-स्टेसन संख्या	सब-स्टेसन क्षमता	३३ के.भी. लाइन कि.मि.	११ के.भी. लाइन कि.मि.	०.४/०.२३ के.भी. (कि.मि.)	ट्रान्सफर्मर संख्या/क्षमता (MVA)
नेपालगंज	१३	२०७	१२४२	३८८९	११७११	४८१३/४८१
बुटवल	२५	३६५	१३५८	४८३०	१४८४६	३३२९/२९४
कुल	**३८**	**५७२**	**२६००**	**८७१९**	**२६५५७**	**८१४२/७७५**

(स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बार्षिक प्रतिवेदन २०२४)

तालिका १६: उच्च क्षमताका विद्यमान प्रसारण लाइन

सि.नं.	१३२ के.भी. लाइन	लम्बाई (कि.मि)	कैफियत
१	भरतपुर-कावासोती-बर्दघाट	७०	Single
२	बर्दघाट-गण्डक	२८	Double
३	बर्दघाट-बुटवल	८६	Double
४	बुटवल-काली गण्डकी (निजि क्षेत्र)	११६	Double
५	बुटवल-शिवपुर-लमही	२३०	Double
६	लमही-झिमरुक (निजिक्षेत्र)	५०	Single
७	लमही-कोहलपुर	२५०	Double
८	कुसुम-हापुरे	२०.३	Single
९	बुटवल-लुम्बिनी	४४	Single

सि.नं.	१३२ के.भी. लाइन	लम्बाई (कि.मि)	कैफियत
१०	गुल्मी-अर्घाखाँची-गोरुसिन्घे	२२०	Double
११	लमही-घोराही	३८	Single
१२	घोराही-माडीचौर	८०	Double
१३	भुमही-हकुई	१६	Double

(स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बार्षिक प्रतिवेदन २०२४।)

यस प्रदेशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगञ्ज र बुटवलमा प्रादेशिक कार्यालयहरू रहेकोमा प्रादेशिक कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रहरू मार्फत विद्युत सेवा सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको छ। यस प्रदेशमा ३८ वटा विद्युत सब-स्टेसनहरू रहेकोमा कोहलपुर, लमही, शिवपुर, बुटवल, बर्दघाट, कुसुम र पाल्पा मुख्य मुख्य हुन्।

रोल्पाबाट प्यूठान भएर बगेर आउने माडी र झिमरुक नदी मिसिएपछि बग्ने राप्ती नदीको पानी उपयोग गरेर नौमुरे आयोजना अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। परियोजनाबाट २८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा दाङ, बाँके र कपिलवस्तु गरी ३ जिल्लाका ८३ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

४. मन्त्रालयको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बार्षिक प्रगति सारांश

४.१ वित्तीय प्रगति सारांश

यस मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको लागि आ.ब. २०८१/८२ मा तथा पुँजीगत गरी रु. ३,२६,९९,०० हजार बिनियोजन भएकोमा रु. २,५१,२७,४१ हजार खर्च भएको थियो। विनियोजनको तुलनामा ७६.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। आ.ब. २०८१/८२ मा बिनियोजन तथा खर्चको विवरण तपसिलको तालिका बमोजिम रहेको छ।

तालिका १७: आ.ब. २०८१/८२ को बिनियोजन र खर्च विवरण (रकम रु हजारमा)

सं.क्र	बजेट शिर्षक	वार्षिक	खर्च	वितिय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	तर्फ	२५,८८,४९	१८,३५,३५	७०.९० %	
२	पूँजीगत तर्फ	३,०१,१०,५१	२,३२,९२,०५	७७.३६ %	८५%
कूल जम्मा		**३,२६,९९,००**	**२,५१,२७,४१**	**७६.८४ %**	**८५%**

४.२ बजेट उपशीर्षकगत प्रगति सारांश

आ.व. २०८१/८२ मा यस मन्त्रालयमा समानिकरण अनुदान तर्फ १० वटा कार्यक्रम र नेपाल सरकार सशर्त अनुदान तर्फ १ वटा कार्यक्रम गरी ११ वटा बजेट उपशीर्षकका स्रोतहरूबाट आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएको भएका थिए। कार्यन्वयनमा भएका तथा पुँजिगत तर्फका कार्यक्रममा भएको बिनियोजन र खर्च सम्बन्धि विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ।

तालिका १८: बजेट उपशिर्षकगत बिनियोजन तथा खर्च विवरण (रकम रु हजारमा)

सि.न.	कार्यक्रमको नाम/ब.उ.शी.नं.	खुद बजेट	खर्च	खर्च %
अ	**वजेट**			
१	३०८०००११३ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय	४७३३०	२१३५५	४५.१२%
२	३०८०००१२३ जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	१४१७४७	१११८७६	७८.९३%
३	३०८०००१३३ भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	३६५७१	२८०१६	७६.६१%
४	३०८०००१४३ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयहरु	३१००१	२१७९६	७०.३१%
५	३०८०००१९३ उर्जा विकास कार्यक्रम	२२००	४९२	२२.३६%
	जम्मा	**२५८८४९**	**१८३५३८**	**७०.९१%**

सि.न.	कार्यक्रमको नाम/ब.उ.शी.नं.	खुद बजेट	खर्च	खर्च %
आ	**पूंजिगत वजेट**			
क	**समानिकरण अनुदान**			
१	३०८०००११४ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय	१४७५१	९९३	६.७३%
२	३०८०००१२४ जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	४८००	४५३६	९४.५०%
३	३०८०००१३४ भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	१२००	१०३६	८६.३३%
४	३०८०००१४४ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयहरु	२९००	२०९४	७२.२१%
५	३०८०००१५४ मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	८५९३७४	६२०८१०	७२.२४%
६	३०८०००१६४ भुमिगत स्यालो तथा डिपट्युववेल सिंचाई कार्यक्रम	३९९९००	२७४१६१	६८.५६%
७	३०८०००१७४ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	४७३१०	२९४९८	६२.३५%
८	३०८०००१८४ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	७७०८८९	६१५५८८	७९.८५%
९	३०८०००१९४ उर्जा विकास कार्यक्रम	१३४८००	९५५८६	७०.९१%
१०	३०८०००२०४ जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	६५५१२७	५६६५६१	८६.४८%
	जम्मा	**२८९१०५१**	**२२१०८६६**	**७६.४७%**
ख	**संघ शसर्त अनुदान**			
१	३०८९११२५४ मझौला सिंचाई आयोजना (संघ शसर्त अनुदान)	१२००००	११८३३९	९८.६२%
	जम्मा	**१२०००० **	**११८३३९**	**९८.६२%**
	पुँजिगत जम्मा	**३०११०५१**	**२३२९२०५**	**७७.३६%**
	कुल जम्मा (चालू+ पुँजीगत)	**३२६९९००**	**२५१२७४१**	**७६.८४%**

४.३ कार्यालयगत योजना कार्यान्वयनको अवस्था

समानिकरण अनुदान तर्फका १० वटा बजेट उप-शिर्षकहरूमा १७२८ वटा योजनाहरू र संघिय सशर्त तर्फ १ वटा बजेट उप-शिर्षकमा २ वटा गरी कुल १७३० वटा योजनाहरू आ.ब. २०८१/८२ मा संचालनमा रहेकोमा कार्यालयगत योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था तपसिल बमोजिम रहेको छ।

तालिका १९: कार्यालयगत योजना कार्यन्वयनको अवस्था

क्र. सं.	कार्यालयहरू	कुल आयोजना संख्या	निर्माणाधिन योजना	सम्पन्न योजना	कार्यान्वयन हुन नसकेका	कैफियत
१	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन नवलपरासी	५४	५	४०	९	
२	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन रुपन्देही	७१	१	६०	१०	
३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, कपिलवस्तु	४२	८	३०	४	
४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, पाल्पा	९७	७	७८	१२	
५	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, अर्घाखाँची	१३३	२	१२३	८	
६	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, गुल्मी	१४८	४	१३२	१२	
७	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब-डिभिजन, रुकूमपुर्व	६२	०	५९	३	
८	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, रोल्पा	१७४	६	१६२	६	
९	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, प्यूठान	१५२	७	१४३	२	
१०	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, दाङ	२७३	५	२६५	३	
११	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, बाँके	११०	१	९४	१५	
१२	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, बर्दिया	५४	४	४९	१	
१३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन रुपन्देही	८६	१०	६८	८	
१४	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन दाङ	८४	२	७१	११	
१५	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, बाँके	१३६	१२	१०७	१७	
१६	वाणगंगा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कपिलवस्तु	१	१	०	०	
१७	प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, दाङ	३	१	२	०	
१८	प्रदेश ऊर्जा कार्यालय, दाङ	५०	२	३९	९	
जम्मा		**१७३०**	**७८**	**१५२२**	**१३०**	

४.४ आ.ब. २०८१/०८२ को मुख्य उपलब्धीहरू

४.४.१ सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्य

आ.ब. २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय मातहतका निकायहरूबाट ५६ वटा सिँचाइ बाँध/मुहान, ५ वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना, ६० वटा डिप ट्युबवेल योजना, ३३० वटा स्यालो ट्युबवेल निर्माण पश्चात थप २३५३ हेक्टर खेति योग्य जमिनमा सिँचाइ सुबिधा विस्तार गरिएको छ गत आ.ब २०८१/८२मा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण तर्फ भएका मुख्य उपलब्धी निम्न बमोजिम रहेको छ।

- आ.ब. २०८१/८२ मा २३५३ हे. थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विकास गरिएको र प्रदेश सरकार स्थापना भए पछि कुल २३१३५ हे. थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विकास गरिएको।
- ७५२९३.५० हे. जमिनको सिँचाइ संरचना सुदृढीकरण गरिएको।
- ९५.०६ हे. खेतीयोग्य जमिन तटवन्धबाट उकास भएको।
- १७१२ घर तथा ९४४ हे. खेतियोग्य जमिन तट्बन्ध गरी सुरक्षित गरिएको।
- तट्बन्ध गरी सार्वजनिक सम्पतिहरू, विद्यालय, बाटो, पुल, मन्दिर आदिको संरक्षण भएको ।

आ.व. २०८१/८२ मा भएका अन्य सूचकहरूको परिमाणात्मक उपलब्धी निम्नानुसार रहेको।

तालिका २०: आ.ब. २०८१/८२ मा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा प्राप्त उपलब्धी

क्र. स.	सूचक	इकाई	आ.व.२०८१/८२	कैफियत
१	सिँचाइ बाँध/मुहान	वटा	५६.००	
२	पक्कि नहर/कुलो	कि.मि	१६१.९०	
३	स्यालो ट्युबवेल	वटा	२७८.००	
४	पावर ड्रिल स्यालो ट्यूववेल	वटा	५२.००	
५	डिप ट्युबवेल	वटा	६०.००	
६	लिफ्ट सिँचाइ	वटा	५.००	
७	सिँचाइको लागि बिधुतिकरण (HT Line)	वटा/किमी	१६.०२	
८	पाइपलाइन	किमी	१२२.७३	
९	पोखरी/जलासय	वटा	३३.००	
१०	थप सिँचाइ सुबिधा पुगेको क्षेत्र	हे	२३५३.००	
११	सिँचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र	हे	८१०७.५०	
१२	नदीनियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण)	कि.मि	२५.२०	

क्र. स.	सूचक	इकाई	आ.व.२०८१/८२	कैफियत
१३	नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन	हे	९५.०६	
१४	तट्बन्धबाट सुरक्षित भएको जमिन	हे	९४४.०९	
१५	तट्बन्धबाट सुरक्षित भएको	घर	१७१२.००	

ऊर्जा तर्फ

मन्त्रालयको ऊर्जा विकास कार्यक्रमबाट आ.ब. २०८१/८२ मा विभिन्न गतिविधि संचालन भएकोमा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका २१: २०८१/८२ मा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	उपलब्धी	कैफियत
१	ट्रान्सफर्मर खरिद	थान	४	
२	PSC पोल खरिद तथा जडान	थान	१२५	
३	STP पोल खरिद तथा जडान	थान	२८८	
४	विद्युतीकरण कार्य LT लाईन	कि.मि.	१४५	
५	विद्युतीकरण कार्य HT लाईन	कि.मि.	८०	
६	सुधारिएको चुलो जडान	थान	१३००	
७	सोलार ब्याकअप सिस्टम जडान)संस्थागत(	थान	२५	
८	सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडित क्षमता	कि .वाट पिक	१०२	
९	इन्ट्रीग्रेटेड सौर्य सडक बत्ती	थान	७०	
१०	इन्ट्रीग्रेटेड विद्युतीय सडक बत्ति जडान	थान	२४	
११	अन/अफ ग्रिड सडक बत्ति जडान	थान	५१५	
१२	हाईमाष्ट लाइटिङ्ग जडान	थान	२३	
१३	संस्थागत बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण	संख्या	१	
१४	घरेलु वायोग्यास प्लान्ट निर्माण	संख्या	५०	

४.४.२ ऐन, कानुन निर्माण

प्रदेशमा हाल कार्यान्वयन भई रहेका सिँचाइ ,जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, ऊर्जा सम्बन्धी बिभिन्न विकास गतिविधिहरूको योजना छनोट देखि योजना कार्यान्वयन सम्मको समग्र कार्यहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि निर्माण गरी एकरुपताका ल्याउन र कृषक उपभोक्ताहरूलाई सहज सेवा दिन कार्यविधि तयार गर्न समिति गठन गरी कार्य गरिएको थियो। कार्यबिधिको मस्यौदा तयार गर्न यस मन्त्रालयका सी.डी.हा.जि

तथा ऊर्जा महाशाखा प्रमुख श्री महेश पोखेलको अध्यक्षतामा सी.डी.ई श्री ईश्वर नाथ पक्वाँ, सि.डि.हा.जि. श्री केशब राज रिजाल, बरिष्ठ इन्जिनियर श्री भेषराज भुसाल र बरिष्ठ इन्जिनियर श्री सुबोध गुरागाई सदस्य रहेको समिति गठन गरी समग्र कार्यको सचिब श्री बिष्णु भण्डारीले संयोजन गरी तपसिल बमोजिमको ऐन तथा कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार गरिएको थियो।

» **प्रदेश ऊर्जा विधेयक —** यस अघि तयार भएको मस्यौदामा छलफल गरी परिष्कृत गरिएको र सरोकारवालहरू संग थप छलफल गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरी तयार भएको।

» **प्रदेश सिँचाइ विधेयक यस-** अघि तयार भएको मस्यौदामा छलफल गरी परिष्कृत गरिएको र सरोकारवालाहरू संग थप छलफल गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरी तयार भएको।

» **सिँचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन योजना छनौट, कार्यान्वयन तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि २०८१ -** मस्यौदा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरी तयार भएको।

» **नविकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१-** मस्यौदा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरी तयार भएको।

४.४.३ तालिम, गोष्ठी तथा अन्य कार्यहरू

क) तालिमहरू

मन्त्रालयबाट आ.ब. २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि निम्न किसिमका तालिम सञ्चालनको गरिएको थियो ।

तालिका २२: आ. व. २०८१/८२ मा सञ्चालित तालिमको विवरण

क्र.स.	तालिमको विषय	अवधी	सहभागी सङ्ख्या	कैफियत
१	सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम	४ दिन (मिति २०८१/५/१६ देखि १९ गते सम्म)	३०	
२	भौगोलिक सुचना प्रणाली (GIS) सम्बन्धि तालिम	५ दिन (मिति २०८१/०७/०२ देखि ०६ गते सम्म)	२२	
३	ERT/VES मेसिन संचालन तथा तथ्याङ्क विश्लेषण सम्बन्धि तालिम	४ दिन (मिति २०८१/०९/१७ देखि २० गते सम्म)	१७	

ख) गोष्ठीहरू

मन्त्रालयले गत आ.व.मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको प्रावधान बमोजिम त्रैमासिक रुपमा मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नको लागि माननीय मन्त्री श्री सीता शर्मा चौधरीको अध्यक्षतामा निम्नअनुसार ४ पटक समिक्षा गोष्ठि र १ पटक बजेट तर्जुमाको लागि माननीयहरूसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो।

तालिका २३: गोष्ठी तथा छलफल कार्यक्रमहरूको विवरण

क्र. स.	गोष्ठिको विषय	मिति	कैफियत
१	मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक तथा आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा वेरुजु समिक्षा गोष्ठी- २०८१	२०८१/०४/२४ र २५ गते	
२	मन्त्रालय स्तरिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक तथा प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा वेरुजु समिक्षा गोष्ठी- २०८१	२०८१/०८/२०	
३	मन्त्रालय स्तरिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा वेरुजु समिक्षा गोष्ठी- २०८१	२०८१/१०/१३ र १४	
४	मन्त्रालय स्तरिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक तथा तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा वेरुजु समिक्षा गोष्ठी- २०८२	२०८२/०१/१४	
५	आ.व. २०८२/८३ को वजेट तयारीको लागि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल कार्यक्रम	२०८२/०२/१२ र १३	

ग) सिँचाइ दिवस

सिँचाइ दिवस २०८१ "कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार" भन्ने मुल नाराका साथ मिति २०८१/१२/२५ गते सोमवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री सीता शर्मा चौधरी अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आथित्यतामा प्रशासनिक परिसरमा रहेको लुम्बिनी सभाहलमा मनाइएको थियो। उक्त अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव श्री वावुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्री डिल्लीराज अर्याल, यस मन्त्रालयका सचिब श्री विष्णु भण्डारी लगाएत प्रदेश सरकारका सचिवहरू, कृषक उपभोक्ताहरू, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अवसरमा सिँचाइ विकासको क्रमागत अवस्था, लुम्बिनी प्रदेशमा सिँचाइका गतिविधीहरू र प्रदेश सरकारवाट भए गरेका कार्यहरूको मन्त्रालयका सी.डी.हा.जि. श्री महेश पोखेलबाट प्रस्तुती भएको थियो। सोही अवसरका प्रमुख अथितिवाट विभिन्न कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, कृषक उपभोक्ताहरूलाई प्रशंसापत्र तथा नगद पुरस्कारले पुरष्कृत गरिएको थियो।

तालिका २४: पुरष्कृत हुने कर्मचारी, उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरूको विवरण

क्र. स.	उत्कृष्टताको विधा	मुल्याङ्कित कर्मचारी/उपभोक्ता संस्था/निर्माण व्यवसायीको नाम	पद	सिफारिस कर्ता/कार्यरत कार्यालय	कैफियत
१	उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुख	प्रविण कुमार	वरिष्ठ इन्जिनियर	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा	
२	उत्कृष्ट कर्मचारी ७/८ औँ	मधु न्यौपाने	वरिष्ठ हा.जि.	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय,बाँके	

क्र. स.	उत्कृष्टताको विधा	मुल्याङ्कित कर्मचारी/उपभोक्ता संस्था/निर्माण व्यवसायीको नाम	पद	सिफारिस कर्ता/कार्यरत कार्यालय	कैफियत
३	उत्कृष्ट कर्मचारी ५/६ औं	नारायण प्रसाद पन्थी	मेकानिकल अधिकृत	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही	
४		वीर बहादुर वि.सि.	अधिकृत प्राविधिक	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची	
५	उत्कृष्ट कर्मचारी श्रेणी विहिन	गुणानिधि पन्थी	का.स.	ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	
६	उत्कृष्ट जल उपभोक्ता संस्था	झुमरे कट्कुइयाँ कुलो सिँचाइ योजना ज.उ.स.,तुलसीपुर उ.न.पा.-८,९ दाङ		जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ	
७	उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायी	ज्योती कन्सट्रक्सन पाल्हिनन्दन.-५ नवलपरासी		भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

५. हाल सम्मको उपलब्धी

५.१ सूचक अनुसारको उपलब्धी

(क) जलस्रोत तथा सिँचाइ तर्फ

यस ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो स्थापनाकाल देखी नै प्रदेश भित्रका सतह सिँचाइ, भूमीगत सिँचाइ एवं जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेखनिय कार्य गर्दै आइरहेको छ। प्रदेश स्थापना पश्चात् सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा भएका कार्यहरुको प्रगति दर्शाउने प्रमुख सूचकहरुको अवस्था तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २५: सूचकका आधारमा वार्षिक उपलब्धीहरु (सिँचाइ तथा जलउत्पन्न)

क्र. स.	सूचक	इकाई	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	हाल सम्मको जम्मा
१	सिँचाइ बाँध/मुहान	वटा	३४	६०	६०	५७	६३	५५	५६	३८५
२	पक्कि नहर/कुलो	कि.मि	९०	१००	१५६	१६५	१५१	१६०	१६२	९८५
३	स्यालो ट्युबवेल	वटा	०					५०१	२७८	७७९
४	पावर ड्रिल स्यालो ट्यूबवेल	वटा	३२८	१८३	९१	१७८	१२३	१४७	५२	११०२
५	डिप ट्युबवेल	वटा	५४	५४	३९	३३	३४	१८	६०	२९२
६	लिफ्ट सिँचाइ	वटा	१३	१५	१३	१५	१८	१३	५	९२
७	सिँचाइको लागि बिधुतिकरण (HT Line)	वटा/ किमी	५४	३९	५६	५८	४२	३४	१६	२९९
८	पाइपलाइन	किमी	८४	११५	९७	११७	१८५	१६१	१२३	८८२
९	पोखरी/जलासय	वटा	१५	१४	१४	३४	८६	३९	३३	२३५
१०	थप सिँचाइ सुबिधा पुगेको क्षेत्र	हे	२५२६	४९०८	२९२२	२९५४	३१५९	४३१४	२३५३	२३१३५
११	सिँचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र	हे	९४५५	११८१२	१०९९३	११६९९	१२०६६	१११६१	८१०८	७५२९४

क्र. स.	सूचक	इकाई	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	हाल सम्मको जम्मा
१२	नदीनियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण)	कि.मि	३५	३१	२८	२५	३१	३२	२५	२०९
१३	नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन	हे	८२	८०	९९	९०	१२२	८९	९५	६५६
१४	तट्बन्धबाट सुरक्षित भएको जमिन	हे	३३३४	३१८१	२१०४	१६०६	१४९९	१५२७	९४४	१४१९५
१५	तट्बन्धबाट सुरक्षित भएको	घर	२२६७	२३८८	२६४७	१०७७	१११६	१२२१	१७१२	१२४२८

(ख) ऊर्जा विकास तर्फ

प्रदेश स्थापना पश्चात् ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा भएका कार्यहरुको अवस्था दर्शाउने प्रमुख सूचकहरुको अवस्था तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २६: सूचकका आधारमा वार्षिक उपलब्धीहरु (ऊर्जा)

क्र. स.	विवरण	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको उपलब्धी					हाल सम्मको जम्मा	कैफियत
			२०७७/ ७८	२०७८/ ७९	२०७९/ ८०	२०८०/ ८१	२०८१/ ८२		
१	ट्रान्सफर्मर खरिद	थान	०	२७	१५	१	४	४७	
२	PSC पोल खरिद तथा जडान	थान	०	१३	०	५८	१२५	१९६	
३	STP पोल खरिद तथा जडान	थान	०	०	०	१४	२८८	३०२	
४	काठको पोल प्रतिस्थापन (STP 8/9M पोल)	थान	४९२०	५०४	८८१	१४६९		७७७४	
५	काठको पोल प्रतिस्थापन (PSC पोल)	थान	४६					४६	
६	विद्युतीकरण कार्य LT लाईन	कि.मि.				४.२	१४.५	१८.७	
७	विद्युतीकरण कार्य HT लाईन	कि.मि.		०.५५	०	०	८	८.५५	
८	सुधारिएको चुलो जडान	थान	३१०	८३१	८००	११५०	१३००	४३९१	
९	सोलार ब्याकअप सिस्टम जडान (संस्थागत)	थान		९	३१	२१	२५	८६	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आर्थिक वर्ष अनुसारको उपलब्धी					कैफियत
			२०७७/७८	२०७८/ ७९	२०७९/ ८०	२०८०/ ८१	२०८१/ ८२	हाल सम्मको जम्मा
१०	ग्रिड टाई नेट मिटरिंग सिस्टम जडान (संस्थागत)	कि .वाट पिक	३९			७४		११३
११	सौर्य उर्जा प्रविधि जडित क्षमता	कि .वाट पिक		२७	७६	१२३	१०२	३२८
१२	साना तथा लघु जलविद्युत मर्मत सुधार, सन्चालन	वटा	१		१	३		५
१३	सौर्य ब्याकअप सडक बत्ती जडान	थान			६४			६४
१४	इन्टीग्रेटेड सौर्य सडक बत्ती	थान				३३	७०	१०३
१५	इन्टीग्रेटेड विद्युतीय सडक बत्ति जडान	थान				१५	२४	३९
१६	अन/अफ ग्रिड सडक बत्ति जडान	थान				६४७	५१५	११६२
१७	हाईमाष्ट लाइटिङ्ग जडान	थान				२०	२३	४३
१८	विद्युतीय सडक बत्ती जडान	थान				६६२		६६२
१९	संस्थागत बायोग्यँस प्लान्ट निर्माण	संख्या				१	१	२
२०	घरेलु बायोग्यास प्लान्ट निर्माण	संख्या					५०	५०


ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

५.२ प्रदेश स्थापना पश्चातको विनियोजन तथा खर्चको सारांश


प्रदेशको स्थापना पश्चात् विभिन्न आर्थिक बर्षहरुमा भएको बजेटको विनियोजन र विनियोजनको तुलनामा भएको खर्चको अवस्था तल उल्लेखित तालिका तथा चित्रहरुको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २७: वार्षिक विनियोजन तथा खर्चको सारांश


क्र. सं.	आ. व.	विनियोजन रु. हजारमा			खर्च रु हजारमा			खर्च %		
		चालू	पुँजिगत	जम्मा	चालू	पुँजिगत	जम्मा	चालू	पुँजिगत	जम्मा
१	७६/७७	१५८९८०	३७४१७३०	३९००७१०	१४३३००	२९९८१३९	३१४१४३९	९०.१४	८०.१३	८०.५४
२	७७/७८	१८६३१२	३०११३९२	३१९७७०४	१४९७२२	२६८२९१०	२८३२६३२	८०.३६	८९.०९	८८.५८
३	७८/७९	२३४०१८	३७४६०६५	३९८००८३	१८१५८४	२९९५८५०	३१७७४३४	७७.५९	७९.९७	७९.८३
४	७९/८०	२७१६५१	३५२६७००	३७९८३५१	१९१५४८	२९६४४७९	३१५६०२७	७०.५१	८४.०६	८३.०९
५	८०/८१	२१३७५८	३९१७६३०	४१३१३८८	१७५२९४	२९१३४२०	३०८८७१४	८२.०१	७४.३७	७४.७६
६	८१/८२	२५८८४९	३०११०५१	३२६९९००	१८३५३६	२३२९२०६	२५१२७४२	७०.९०	७७.३६	७६.८४

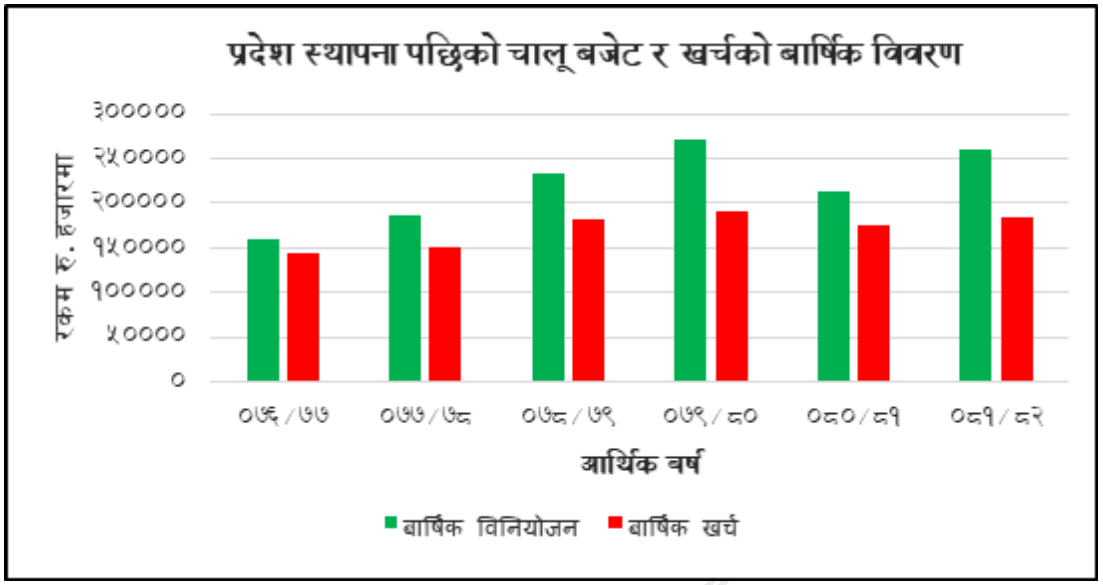

चित्र १०: प्रदेश स्थापना पछि चालू बजेट र खर्चको विवरण

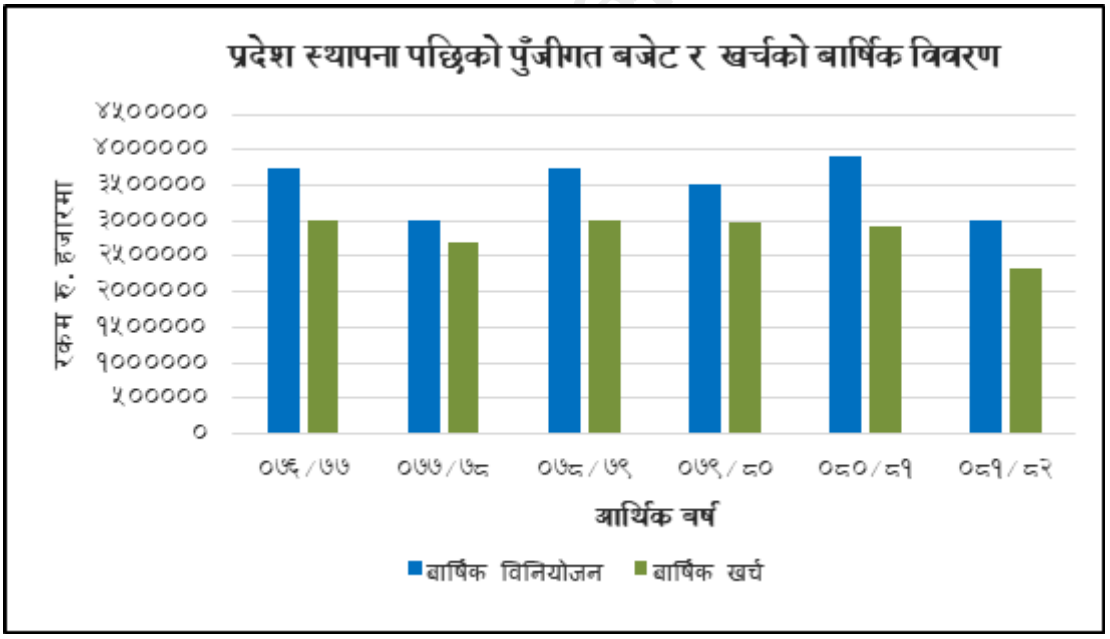

चित्र ११: प्रदेश स्थापना पछि पूँजीगत बजेट र खर्चको विवरण

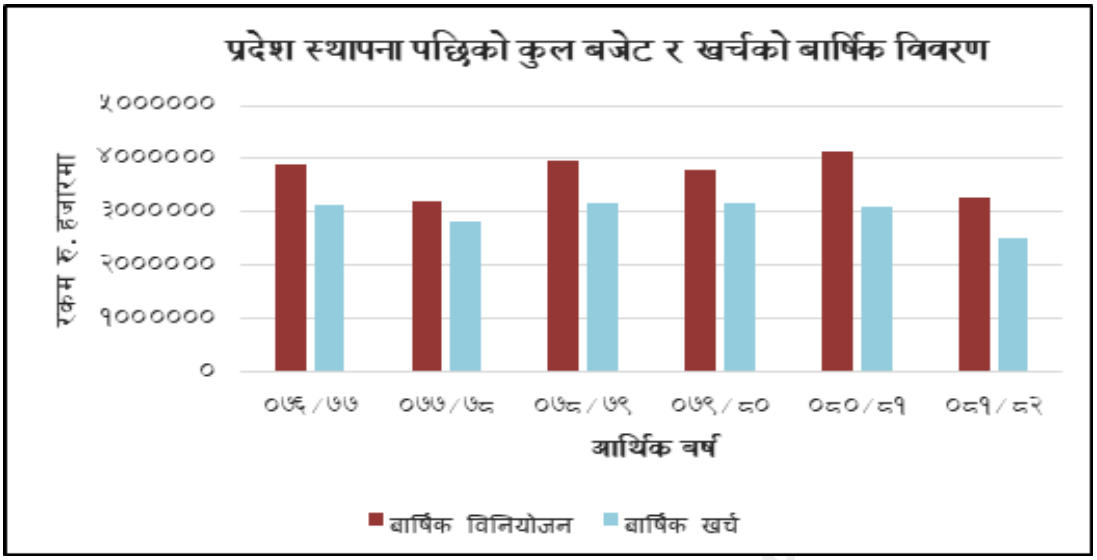

चित्र १२: प्रदेश स्थापना पछि कुल बजेट र खर्चको विवरण

माथि उल्लेखित विवरणबाट के देख्न सकिन्छ भने प्रदेश स्थापना पश्चात् चालू शिर्षकमा हुने बजेट विनियोजनमा क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ, तर पुँजीगत शिर्षकमा हुने बजेट विनियोजन सुरुवाती केही आर्थिक बर्षहरुमा केही वृद्धि भएको देखिएको भए तापनि पछिल्ला बर्षहरुमा पुँजिगत बजेटमा उल्लेखनिय कमी आएको छ। यसरी पुँजिगत बजेटमा आएको कमीका कारण सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासको प्रचुर संभावना यस प्रदेशमा भएको भए तापनि सो बमोजिमको लाभ हासिल गर्न कठिनाइ भएको छ। सिँचाइ जन्य संरचना, तटबन्ध, स्यालो तथा डिप ट्यूवेल, सौर्य ऊर्जा प्रणाली लगायतको अत्याधिक माग जनमानसबाट प्राप्त भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट हुने बजेट विनियोजनमा यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन हुनु आवश्यक देखिन्छ।

५.३ मन्त्रालयबाट योजना स्वीकृति (Project Appraisal) भई कार्यान्वयनमा गएका केही योजनाहरु

यस ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विभिन्न आर्थिक बर्षहरुमा सतह सिँचाइ, भूमीगत सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा तयार भएका विस्तृत प्रतिवेदनहरुको चेकजाँच गरी योजनाको कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान (Project Appraisal) गरिएका मन्त्रालयको रेकर्डमा भएका केही योजनाहरुको विवरण अनसूची २ मा प्रस्तुत गरिएको छ। योजना कार्यान्वयको लागि उपयुक्त भए नभएको निक्यौंल गरेर मात्र योजनाको कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाइने हुँदा कुनैपनि योजनाको सफल कार्यान्वयन तथा सो बाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न Project Appraisal लाइ एक महत्वपूर्ण चरणको रुपमा मन्त्रालयले अंगिकार गरेको छ। कार्यान्वयन स्वीकृती प्राप्त भएका योजनाहरुको लागत अनुमान तथा बहुबर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम स्रोत सहमति प्राप्त गरेपश्चात् खरिद प्रकृया अघि बढ्दछ।

५.४ ऐन/कानुन निर्माण

प्रदेश स्थापना पश्चात् मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयहरुमा कार्यान्वयन प्रकृया स्पष्ट गर्न, योजनाहरुको कार्यान्वयनलाइ वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शि र जवाफदेही बनाउँदै कार्यान्वयन प्रकृयाको सरलीकरण गर्न आवश्यक ऐन/कानुनहरुको निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न कानूनहरुको निर्माण भइसकेको अवस्था रहेको छ भने केही कानुनहरुको मस्यौदा तयारी भएको र हुने क्रममा समेत रहेको छ। हालसम्म मन्त्रालयबाट तयार भएका र हुने क्रममा रहेका कानुनहरुको विवरण तपशिल बमोजिमको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका २८: मन्त्रालयबाट तयार भएका र हुने क्रममा रहेका कानुनहरुको विवरण

क्र. सं.	ऐन/ कानुन	हालको अवस्था	कैफियत
१	घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान कार्यविधि, २०७५	स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको	
२	भूमीगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७	स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको	
३	प्रदेशमा विद्युतीय उर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	प्रदेश सभाबाट संशोधनका लागि फिर्ता भएको	
४	प्रदेशको सिँचाइलाइ व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक	प्रदेश सभाबाट संशोधनका लागि फिर्ता भएको	
५	नविकरणीय उर्जा प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१	मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार भएको	
६	सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन योजना छनौट, कार्यान्वयन तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०८१	मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयार भएको	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

६. समस्या तथा चुनौतीहरू

६.१ प्रमुख समस्या

- बिगत केहि आ.व देखि प्रदेश संचित कोषमा रकम अभावले गर्दा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी हुन नसकेको कारण योजना कार्यन्वयनमा जटिलता थपिदै जानु।
- पावरड्रिल स्यालो ट्युबवेलको अत्यधिक माग हुने तर न्यून बजेट बिनियोजनको कारण माग सम्बोधन गर्न नसकिएको।
- साना तथा खुद्रे योजनाहरूको संख्या धेरै भएकोले गुणस्तर कायम र कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको।
- क्रमागत योजनाहरूमा न्यून बजेट बिनियोजन भएको हुँदा अपेक्षिकृत प्रगति हुन नसकेको।
- बाढि पहिरो तथा डुवानका कारण सिँचाइका संरचनाहरूमा क्षतिको साथै वस्ति समेत जोखिममा परेको अवस्था सम्वोधन गर्न बजेट न्युन हुने गरेको।
- जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा मौजुदा सवारी साधनहरू (चार पांग्रे गाडी) निकै पुराना र जिर्ण भएकोले सञ्चालन खर्च अत्यधिक धेरै हुने हुँदा समस्या हुने गरेको।
- संघिय सशर्त तर्फका योजनाहरूको बहुवर्षिय हुनु पर्ने तर गुरु योजना स्वीकृति गर्न स्रोतको सुनिश्चिता गर्न नसकिने हुँदा समस्या भएको।
- योजनाको लागि न्यूनतम आवश्यक बजेट बिनियोजन नहुँदा स्रोतको सुनिश्चितता लिन कठिनाई भएको।
- संघ सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको सञ्चालन तथा मर्मतको लागि सशर्त अनुदानमा अत्यन्त न्यून बजेट बिनियोजन हुने गरेको।

६.२ अवसर र चुनौती

खेतियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपलब्धता रहनु, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा सकारात्मक सोचको विकास हुनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन समिति र कोषको व्यवस्था हुनु, नदी किनारमा तटबन्ध सहितको सडक निर्माण हँदै जानु एवम् जल उत्पन्न प्रकोप संग सामना गर्न संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्था रहनु जस्ता प्रमुख अवसरहरू रहेका छन्।

प्रदेशभित्र करिब ३००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना पहिचान हुनु, बिजुली निर्यातको लागि बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशासन लाइन निर्माणाधीन हुनु, बुटवल-भैरहवा औद्योगिक करिडर, कोहलपुर-नेपालगन्ज औद्योगिक करिडर तथा भैरहवा बिशेष औद्योगिक र नयाँ विकास हुने क्रममा रहेका रहेका मोतीपुर तथा नौवस्ता जस्ता औद्योगिक क्षेत्र का साथै उद्योग ग्रामहरूमा विद्युत मागको सम्भावना हुनु, सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अधिक सम्भावना हुनु साथै हरित ऊर्जाको उपयुक्त बिकल्पको रुपमा देखेकोले हाइड्रोजन ग्यास

उत्पादन र वितरण गरी सुपथ मूल्यमा प्रदेशको ऊर्जा आवश्यकता पुरा गर्ने सम्भावना हुनु जस्ता अवसरहरू पनि रहेका छन्।

जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धिले हिमालमा हिउँको मात्रा कम हुँदै गएको, भू-उपयोगमा आएको परिवर्तन, पानी पुनर्भरणमा कमि तथा वनजङ्गल विनाशका कारण समेत पानीको स्रोत सुक्दै गएको, वातावरण प्रदूषणले समेत पानीको स्रोतमा असर पारेको, अव्यवस्थित विकास निर्माणले पानीको स्रोतमा प्रभाव पारेको, बढ्दो सहरीकरणले जलस्रोतमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको जस्ता समस्याहरु मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेका छन् ।

नदी तथा जलाधिकार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु, नदी कटान क्षेत्र र पहिरोजन्य जोखिम क्षेत्र को नक्शाङ्कन गर्नु, नदी नियन्त्रण कार्यलाई समुदायमा आधारित आय र रोजगारीसँग आबद्ध गर्नु, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नु, स्थानीय तह र समुदायलाई बाढी पहिरो बिरुद्द लड्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, साथै नदी कटान क्षेत्र को पुनर्स्थापना गर्नु जस्ता प्रमुख चुनौतीहरू रहेका छन्।


परम्परागत तथा खनिज ऊर्जा खपतलाई विद्युतीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नु, विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नु, प्रदेशमा उत्पादित साना साना परिमाणका सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु, विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्नु, छरिएका बस्तिमा विद्युत सुबिधा पुर्याउनु जस्ता चुनौतीहरु पनि रहेका छन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

अनुसूची १. मन्त्रालय मातहत कार्यालयहरुको दरवन्दी

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको संगठन संरचना


(कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, रुपन्देही, नवलपरासी ब.सु.प.)

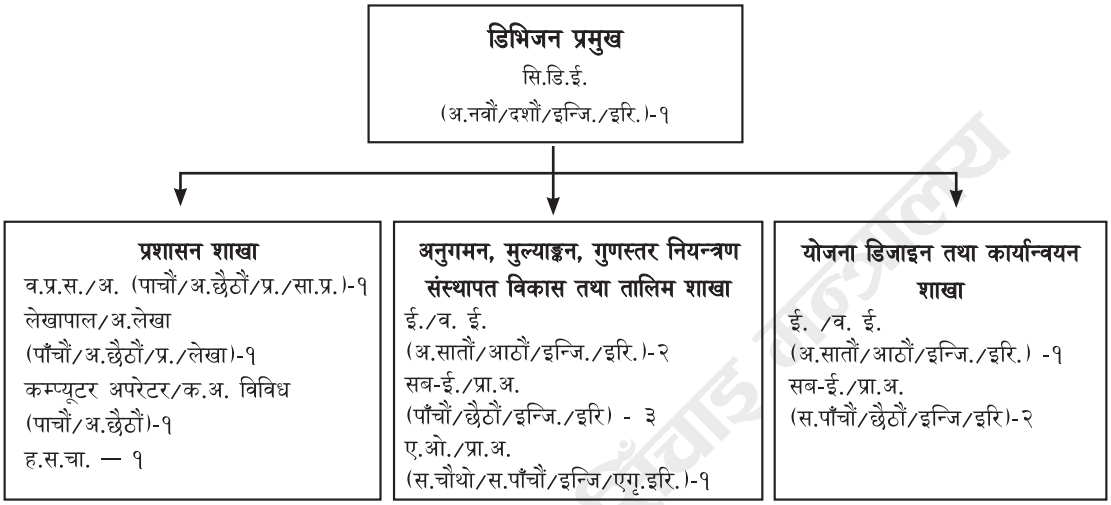

क्र. सं.	पद	सेवा	समूह	उपसमूह	श्रेणी / तह	दरबन्दी जम्मा	कैफियत
१	डि.ई./सि.डि.ई.	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	अ.नवौं/दशौं	१	
२	इञ्जिनियर/व.इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	अ.सातौं/आठौं	३	
३	व.प्रशासन सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाचौं/छैठौं	१	
४	लेखापाल/अधिकृत लेखा	प्रशासन	लेखा		स.पाचौं/छैठौं	१	
५	सब-इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	स.पाचौं/छैठौं	५	
६	कम्प्यूटर अपरेटर	नेपाल विविध			स.स्तर पाँचौं/छैठौं	१	
७	एशोसियशन अर्गनाइजर (ए.ओ.) /प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	एगृ.इरि		स.स्तर चौथो/पाँचौं	१	
८	हलुका सवारी चालक					१	
९	कार्यालय सहयोगी					२	
जम्मा						१६	

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको संगठन संरचना


(अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा)

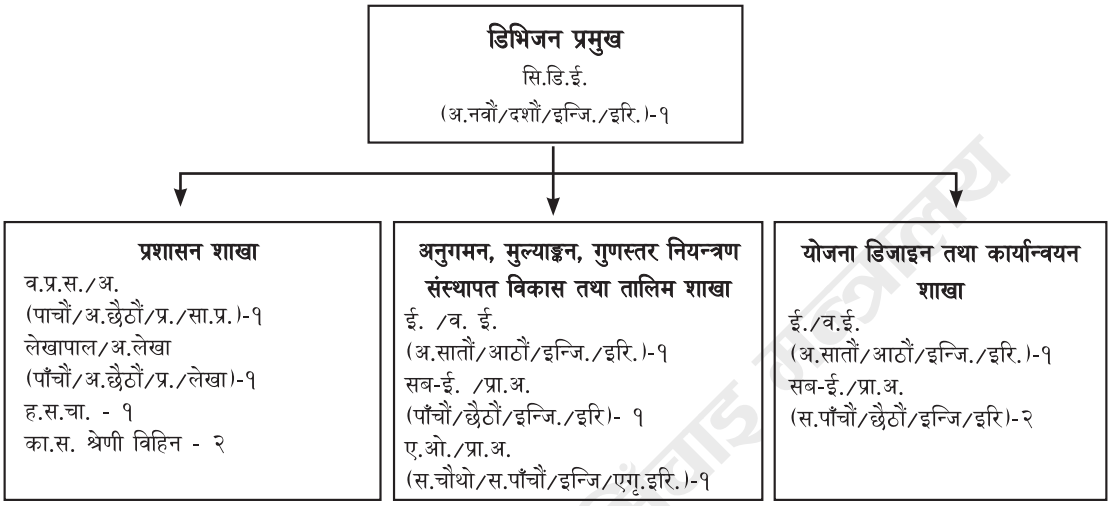

क्र. सं.	पद	सेवा	समूह	उपसमूह	श्रेणी / तह	दरबन्दी जम्मा	कैफियत
१	डि.इ./सि.डि.इ.	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	अ.नवौं/दशौं	१	
२	इञ्जिनियर/व.इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	अ.सातौं/आठौं	२	
३	व.प्रशासन सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाचौं/छैठौं	१	
४	लेखापाल/अधिकृत लेखा	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैठौं	१	
५	सव-इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	स.स्तर पाँचौं/छैठौं	३	
६	एशोसियशन अर्गनाइजर (ए.ओ.) /प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	एगृ.इरि		स.स्तर चौथो/ पाँचौं/ छैठौं	१	
७	हलुका सवारी चालक					१	
८	कार्यालय सहयोगी					२	
जम्मा						१२	

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सव - डिभिजन कार्यालयको संगठन संरचना


(रुकुम पूर्व)

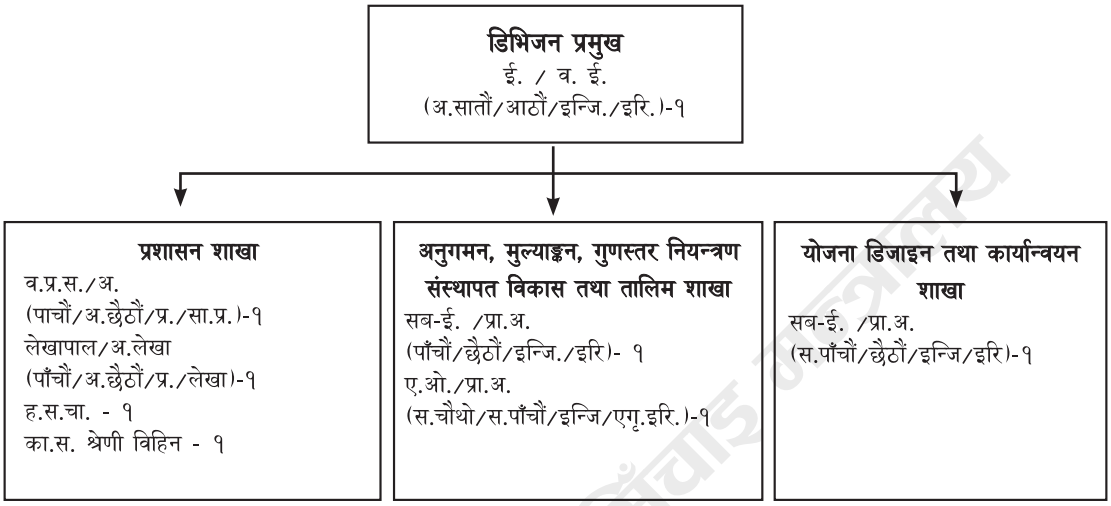

क्र. सं.	पद	सेवा	समूह	उपसमूह	श्रेणी / तह	दरबन्दी जम्मा	कैफियत
१	इञ्जिनियर/व.इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	अ.सातौं/आठौं	१	
२	व.प्रशासन सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाचौं/छैठौं	१	
३	लेखापाल/अधिकृत लेखा	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैठौं	१	
४	सव-इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	स.स्तर पाँचौं/छैठौं	२	
५	एशोसियशन अर्गनाइजर (ए.ओ.) /प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	एगृ.इरि		स.स्तर चौथो/पाँचौं/छैठौं	१	
६	हलुका सवारी चालक					१	
७	कार्यालय सहयोगी					१	
जम्मा						८	

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको संगठन संरचना


(दाङ्ग, बाँके, रुपन्देही)

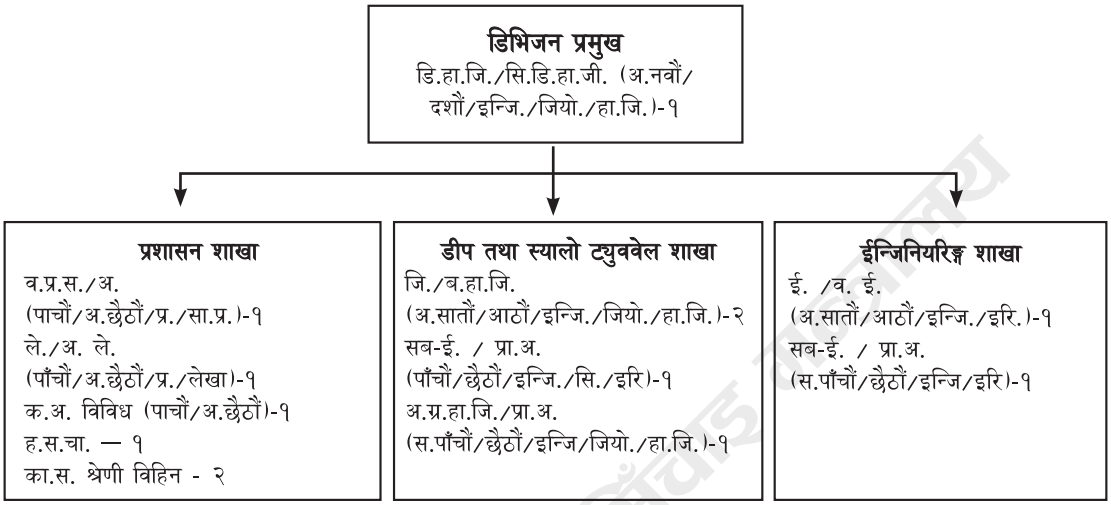

क्र. सं.	पद	सेवा	समूह	उपसमूह	श्रेणी / तह	दरबन्दी जम्मा	कैफियत
१	डि.हा.जि./सि.डि.हा.जी.	इन्जिनियरिङ	जियो	हा.जि.	अ.नवौं/दशौं	१	
२	हाइड्रोजियोलोजिष्ट/ ब.हा.जि.	इन्जिनियरिङ	जियो	हा.जि.	अ.सातौं/आठौं	२	
३	इञ्जिनियर/व.इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	अ.सातौं/आठौं	१	
४	व.प्रशासन सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.स्तर पाँचौं/छैठौं	१	
५	लेखापाल/अधिकृत लेखा	प्रशासन	लेखा		स.स्तर पाँचौं/छैठौं	१	
६	सब-इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	स.स्तर पाँचौं/छैठौं	२	
७	सि.मेकानिक्स/प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	मेका.	मेका.	स.स्तर पाँचौं/छैठौं	१	
८	सब-इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	इले.	इले.	स.स्तर पाँचौं/छैठौं	१	
९	अ.ग्र.हा.जी./प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	जियो	हा.जि.	स.स्तर पाँचौं/छैठौं	१	
१०	स.कम्प्यूटर अपरेटर/क.अ.	नेपाल विविध			स.स्तर चौथो/पाँचौं	१	
११	हलुका सवारी चालक					१	
१२	कार्यालय सहयोगी					२	
जम्मा						१५	

सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना


(प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय दाङ्ग, बाणगगां सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय कपिलवस्तु)

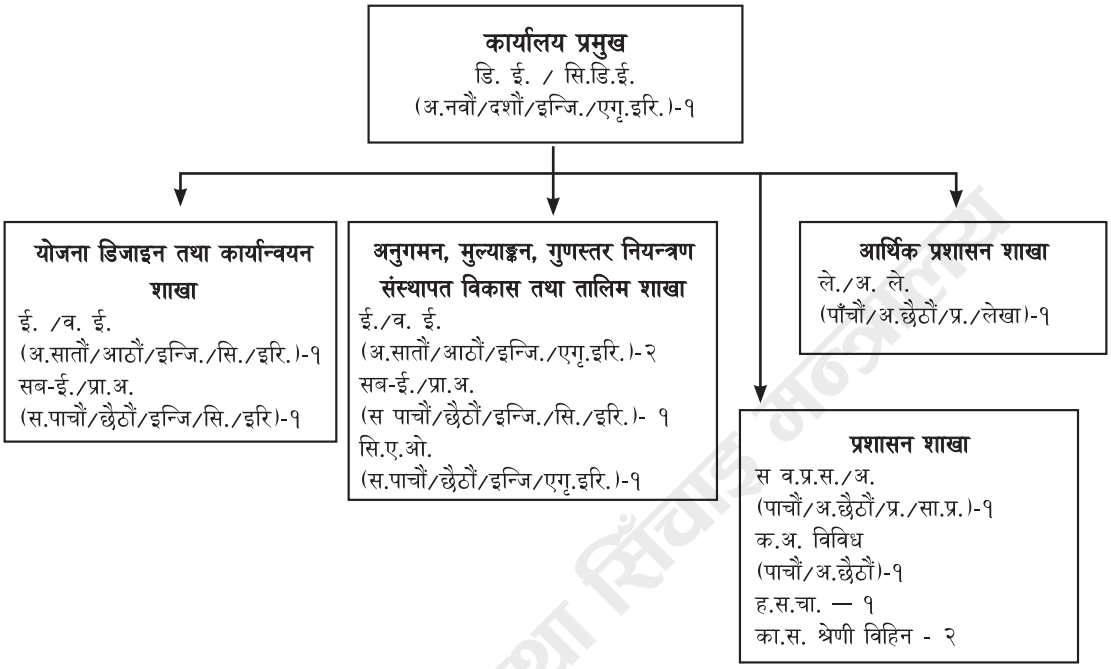

क्र. सं.	पद	सेवा	समूह	उपसमूह	श्रेणी / तह	दरबन्दी जम्मा	कैफियत
१	डि.ई./सि.डि.ई.	इन्जिनियरिङ	एगृ.इरि		अ.नवौं/दशौं	१	
२	इञ्जिनियर/व.इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	अ.सातौं/आठौं	१	
३	इञ्जिनियर/व.इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	एगृ.इरि		अ.सातौं/आठौं	२	
४	व.प्रशासन सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाचौं/छैठौं	१	
५	लेखापाल/अधिकृत लेखा	प्रशासन	लेखा		स.पाचौं/छैठौं	१	
६	सव-इन्जिनियर/प्राविधिक अधिकृत	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरिगेशन	स.पाचौं/छैठौं	२	
७	एशोसियशन अर्गनाइजर (ए.ओ.) /प्रा. अ.	इन्जिनियरिङ	एगृ.इरि		स.पाचौं/छैठौं	१	
८	स.कम्प्यूटर अपरेटर/क.अ.	नेपाल विविध			स.पाचौं/छैठौं	१	
९	हलुका सवारी चालक					१	
१०	कार्यालय सहयोगी					२	
जम्मा						१३	

प्रदेश उर्जा कार्यालयको संगठन संरचना

(भालुवाङ्ग)

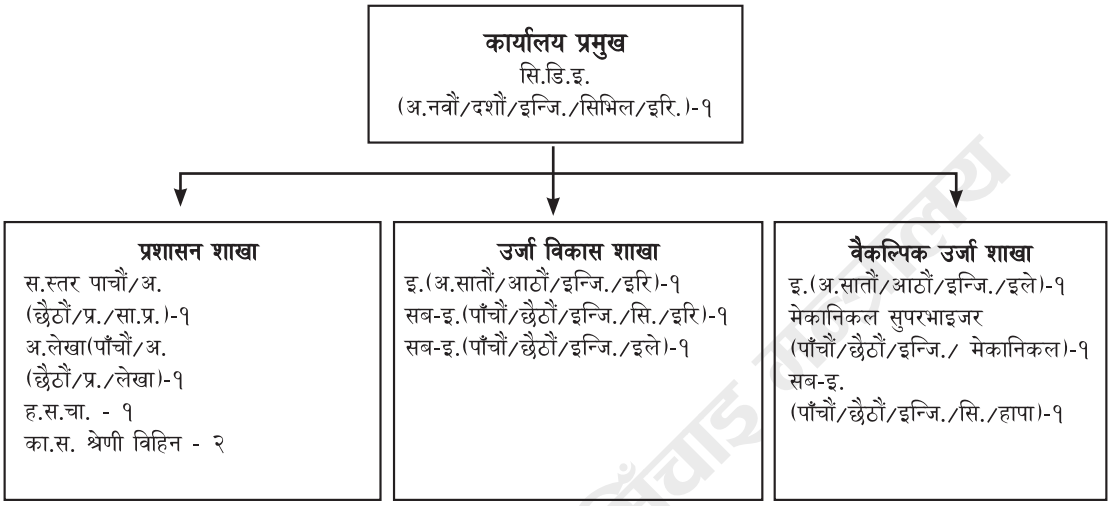

क्र. सं.	पद	सेवा	समूह	उपसमूह	श्रेणी / तह	दरबन्दी जम्मा	कैफियत
१	सि.डि.इ.	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरि.	अ.नवौं/दशौं	१	
२	अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाचौं/अ.छैठौं	१	
३	अधिकृत लेखा	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैठौं	१	
४	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरि.	अ.सातौं/आठौं	१	
५	इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	इले		अ.सातौं/आठौं	१	
६	सब-इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	इले		स.स्तर पाँचौं/अ.छैठौं	१	
७	मेकानिकल सुपरभाइजर	इन्जिनियरिङ	मेकानिकल		स.स्तर पाँचौं/अ.छैठौं	१	
८	सब-इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	इरि.	स.स्तर पाँचौं/अ.छैठौं	१	
९	सब-इन्जिनियर	इन्जिनियरिङ	सिभिल	हापा	स.स्तर पाँचौं/अ.छैठौं	१	
१०	हलुका सवारी चालक					१	
११	कार्यालय सहयोगी					२	
जम्मा						१२	

अनुसूची २ :- जिल्लागत परिचयात्मक विवरण

पृष्ठभूमि

नेपालमा परापुर्बकालदेखि किसानहरुले सामुदायिक स्रोत, साधन, सिप र प्रविधिबाट सिंचाइ कुलो, पैनी तथा अस्थाई बाँधहरुको निर्माण गरी सिँचाइ गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको आधुनिक सिँचाइको इतिहास चन्द्र नहर (वि.सं. १९७९-१९८५), जुद्ध नहर (वि.सं. २०००) सर्लाही, जगदीशपुर बाँध, कपिलवस्तु र पार्दी बाँध, पोखरा निर्माणबाट सुरु भएको देखिन्छ। वि.सं. २००७ साल भन्दा अगाडिसम्म सिँचाइ क्षेत्रमा सरकारको सिमित संलग्नता, सिँचाइ विकासका कार्यहरु तत्कालिन बडाहाकिम मार्फत हुने गर्दथे र तत्कालिन अवस्थामा स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको थियो। वि.सं. २००९ मा नहर विभाग स्थापना भइ सिँचाइ गतिविधि संस्थागत रुपमा संचालन भएकोमा वि.सं. २०१३ देखि मात्र नेपाली प्राविधिकले नहर विभागमा नेतृत्व गरेको इतिहास भेटिन्छ।

संगठनात्मक फेरबदलको क्रममा तत्कालिन नहर बिभागबाट २०२३ सालमा सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, त्यसपछि २०२९ सालमा सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुदै २०४४ सालमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य सम्पादन गर्न छुट्टै सिँचाइ विभागको स्थापना भएको देखिन्छ। तत्कालिन सिँचाइ बिभाग अन्तर्गत २०४५ सालदेखि ५ वटा क्षेत्रिय निर्देशनालयहरु, ७५ वटा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयहरु र केन्द्रिय आयोजनाहरु स्थापना गरि सिँचाइ गतिविधि संचालन भएको थियो । यसैक्रममा स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५६ जारी भइ लागु भै वि.सं. २०५८ सालमा सिँचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भए पच्यात ५ वटा क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, २६ वटा सिँचाइ बिकास डिभिजन, २० वटा सिँचाइ बिकास सब-डिभिजन, ८ वटा सिँचाइ व्यस्थापन डिभिजन र ३ वटा यान्त्रिक डिभिजनहरु स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०५६ सालमानै नदि नियनत्रण सम्बन्धि कार्य गर्न ७ वटा डिभिजन र ५ वटा सब-डिभिजन सहित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको स्थापना भएको थियो। बि.स. २०७२ मा सबै जिल्लामा सेवा संचालन सहज बनाउने हेतुले सिँचाइ बिभाग तर्फ सिँचाइ बिकास डिभिजन/सब-डिभिजनको संख्या ७३, सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन १३, भूमिगत सिँचाइ बिकास डिभिजन ११ र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन बिभाग तर्फ २४ वटा डिभिजन र २ वटा सब-डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरि देशैभरि सिँचाइ तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य गर्दै आइरहेको अवस्था रहेको छ ।

मातहत कार्यालयहरुको परिचयात्मक विवरण

२०७४ सालमा संघियता लागु हुने क्रममा सिँचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागहरुलाई मिलाएर संघमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना भएको र प्रत्येक जिल्लामा सिँचाइ र जल जलउत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्य गर्ने गरि दुवै डिभिजन कार्यालय गाभेर एउटै जलस्रोत तथा सिँचाइ बिकास डिभिजन/सब-डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको थियो ।

यसै क्रममा वि.सं. २०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापना भई भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्न यस प्रदेशमा १२ वटा जलस्रोत तथा सिँचाइ बिकास डिभिजन कार्यालय, ३ वटा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई बिकास डिभिजन कार्यालय, २ वटा सिँचाइ व्यस्थापन कार्यालय र १ आयोजना कार्यालय गरि कुल १८ वटा सिँचाइ कार्यालयहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको थियो । वि.सं. २०८१ सालमा मात्र माडीलुङ्ग्री करिडर सिँचाइ आयोजना खारेज गरि प्रदेशमा उर्जा सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न हटाएर प्रदेश ऊर्जा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। हाल यस लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा अन्तर्गत तपसिल बमोजिमका १८ वटा कार्यालयहरु रहेका छन् ।

मातहतका कार्यालयहरुको परिचयात्मक विवरण

क्र. सं.	कार्यालयको हालकोनाम	ठेगाना	कार्यालयको इतिहास	कार्यक्षेत्र
१	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नवलपरासी (ब.सु.प.)	सुनवल न.पा ३ भुमही	२०४५-जिल्ला सिँचाइ कार्यालय २०५८-पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं ७,२०७२-सिँचाइ बिकास डिभिजन, र २०७४ मा हालको नाम	नवलपरासी (ब.सु.प)
२	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देही	सिद्दार्थनगर न.पा ५ भैरहवा	२०४५-जिल्ला सिँचाइ कार्यालय २०५८-पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं ६ र २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	रुपन्देही
३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कपिलबस्तु	कपिलबस्तु न.पा. १ भिक्षुचोक	२०४५- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय २०५८ - पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं ५ , २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	कपिलबस्तु
४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पा	तानसेन न.पा. ६ बर्तुङ्ग	२०४५- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, २०५८ - पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं ३, २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	पाल्पा
५	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँची	सन्धिखर्क न.पा. १	२०४५- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, २०५८ -पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास सबडिभिजन नं ५, २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	अर्घाखाँची

क्र. सं.	कार्यालयको हालकोनाम	ठेगाना	कार्यालयको इतिहास	कार्यक्षेत्र
६	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मी	रेसुङ्गा न.पा.२ उदिनढुङ्गा	२०४५- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, २०५८ -पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास सबडिभिजन नं ४, २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	गुल्मी
७	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय रुकुम (पुर्व)	सिस्ने गाँ.पा. ६ रुकुमकोट	पहिले रुकुम जिल्लाबाट कार्य हुदै आएकोमा २०७४ मा जिल्ला विभाजन भै हालको नामको कार्यालय स्थापना भएको	रुकुम पुर्व
८	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पा	रोल्पा न.पा.४ लिबांग	२०७२ अघि प्युठान डिभिजन बाट कार्य भएको, २०७२-सिँचाइ बिकास डिभिजन, र २०७४ मा हालको नाम	रोल्पा
९	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्युठान	प्युठान न.पा.४ बिजुवार	२०४५- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, २०५८ -मध्यपश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं ४, २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	प्युठान
१०	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ	तुलसीपुर उ.म.न.पा.६	२०४५- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, २०५८ -मध्यपश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं १, २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	दाङ
११	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके	नेपालगंज उ.म.न.पा.९ बाँकेगाउँ	२०४५- जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, २०५८-मध्यपश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं २, २०७२- सिँचाइ बिकास डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	बाँके
१२	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दिया	गुलेरिया न.पा ५	२०७२ भन्दा अगाडी बाँके डिभिजनबाट कार्य हुने गरेको, २०७२- सिँचाइ बिकास सब-डिभिजन र २०७४ मा हालको नाम	बर्दिया

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	कार्यालयको हालकोनाम	ठेगाना	कार्यालयको इतिहास	कार्यक्षेत्र
१३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही	बुटवल उ.म.न.पा ५	२०७२ साल भन्दा अगाडी भूमिगत जलस्रोत बिकास परियोजना, फिल्ड कार्यालय, त्यसपछि भूमिगत जलस्रोत बिकास समिति, शाखा कार्यालय र २०७२ मा हालको नाम	रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा र गुल्मी
१४	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ	लमही न.पा.५	२०७२ साल भन्दा अगाडी भूमिगत जलस्रोत बिकास परियोजना, फिल्ड कार्यालय, त्यसपछि भूमिगत जलस्रोत बिकास समिति, शाखा कार्यालय र २०७२ मा हालको नाम	प्युठान, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम, कपिलबस्तु र दाङ
१५	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके	नेपालगंज उ.म.न.पा.१८ कारकादो	२०७२ साल भन्दा अगाडी भूमिगत जलस्रोत बिकास परियोजना, फिल्ड कार्यालय, त्यसपछि भूमिगत जलस्रोत बिकास समिति, शाखा कार्यालय र २०७२ मा हालको नाम	बाँके र बर्दिया
१६	बाणगंगा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय	कपिलबस्तु न.पा. १ भिक्षुचोक	२०७२ अगाडी सिँचाइ डिभिजन कपिलबस्तुबाट कार्य हुदै आएको,२०७२ देखि हालको नाम	बाणगंगा सिँचाइ योजना
१७	प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय	लमही न.पा.५	२०७२ अगाडी प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइआयोजना बाट कार्य हुदै आएको,२०७२ देखि हालको नाम	प्रगन्ना सिँचाइ योजना
१८	प्रदेश उर्जा कार्यालय, दाङ	राप्ति गा.पा.२ लालमटिया	२०७८ मा प्रदेश उर्जा कार्यालय दाङ स्थापना भएको, २०७९ मा कार्यालय खारेजी भै मन्त्रालयबाट कार्य हुदै आएकोमा २०८१ मा पुनःयस कार्यालयको स्थापना भएको	प्रदेशका सबै जिल्ला

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

मातहत कार्यालयहरुको उदेश्यहरु

क) जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन/सबडिभिजन कार्यालयहरुको उदेश्य

- जिल्लामा उपलव्ध जलस्रोतको समुचित उपयोग गरी सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार गर्दै कृषि उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्ने।
- जिल्लाको कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइको विकास तथा विस्तार गरी वर्षैभरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउने।
- सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्मित संरचनाहरूको समयमै उचित मर्मत संभार गरी दिगो र भरपर्दो बनाउने।
- निर्माण संपन्न भइ संचालनमा रहेका मझौला सिँचाइ प्रणालीहरुको दक्षता (Efficiency) बृद्धि तथा उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास गरी सिँचाइ सेवालाइ दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी वनाउन सिँचाइ प्रणालीहरुको पुर्ण रुपमा ब्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दै जाने।
- नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा प्रयोग आवश्यक संरचनागत तथा गैरसंरचनागत कार्य गरी जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्ने साथै जोखिम रहित जग्गा उकास गर्ने।
- मझौला तथा साना प्रकृतिका पहिरोहरुको ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र संरचनागत तथा गैरसंरचना गत कार्य गरी जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्ने।
- सिँचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका पुर्वाधार सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने।

ख) भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरुको उदेश्यहरु

- भूमिगत जलस्रोतको अन्वेषण, भूमिगत जलको माध्ययमबाट, सिँचाइ, सुविधा उपलब्ध गराउने यस कार्यालयको मुख्य उदेश्य रहेको छ।
- जिल्लाको कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइको विकास तथा विस्तार गरी वर्षैभरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउने।
- निर्माण संपन्न भइ संचालनमा रहेका भूमिगत सिँचाइ प्रणालीहरुको दक्षता (Efficiency) बृद्धि तथा उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास गरी सिँचाइ सेवालाइ दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी वनाउन सिँचाइ प्रणालीहरुको पुर्ण रुपमा ब्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दै जाने।

ग) सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयहरुको उद्देश्यहरु

- नहर, बाँध तथा अन्य संरचनाहरुको रेखदेख तथा हेरविचार गर्ने।
- कृषक उपभोक्ताहरुको माग बमोजिम पानी उपलब्ध गराउन सिँचाइ प्रणालीको संचालन

तालिका अध्यावधिक राख्ने र सो संचालन तालिका अनुसार नहर संचालन गर्ने गराउने।

- सिँचाइ प्रणाली संचालनमा सम्बन्धित जल उपभोक्ता संस्थाहरुको सहभागिता क्रमिक रुपमा बढाउदै लैजाने र सिँचाइ नीति अनुसार व्यवस्थापन पक्ष क्रमिक रुपमा सम्बन्धित उपभोक्ताहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने।
- सिँचाइ नीति अनुसार सिँचाइ सेवा शुल्क लगत अध्यावधिक राख्ने र जल उपभोक्ता संस्थालाई सिँचाइ सेवा शुल्क उठाउन सहयोग गर्ने।
- कार्यालय अन्तर्गतका नहर प्रणालीहरुको नियमित मर्मत गर्नु पर्ने संरचनाहरुको सम्बन्धित उपभोक्ताहरुसँग सरसल्लाह र समन्वय गरी प्राथमिकताको आधारमा मर्मत संभार गर्दै जाने।

घ) प्रदेश उर्जा कार्यालयको उदेश्यहरु

- घरेलु वायोग्यास प्रणाली निर्माण तथा जडान गर्ने ।
- लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना मर्मत तथा ग्रिडमा जडान गर्ने ।
- विद्युतीय सवारी साधन चार्जिंग स्टेशन पर्बर्दन तथा बिकास गर्ने ।
- विद्युत प्रणाली सुधार तथा बिस्तार कार्य गर्ने ।
- सुधारिएको चुलो तथा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा पर्वदनात्मक कार्य गर्ने ।
- सौर्य उर्जा प्रविधि (अन ग्रिड/अफ ग्रिड) को पर्बर्दन तथा बिकास गर्ने ।
- प्रदेश भित्र विद्युतको पहुंच नपुगेको वस्तीहरुमा घरेलु सौर्य प्रणाली जडान
- वस्तिहरुमा सौर्य सडक बत्ति जडान तथा मर्मत गर्ने।
- सार्वजनिक निकायहरुमा इनर्जी अडिट तथा विद्युत प्रणाली सुधार गर्ने।
- सम्भाव्य २० मे.वा. सम्मको जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जाका आयोजना विकास गर्ने।
- प्रदेश भित्र ग्रिडमा आवद्ध तथा अफ ग्रिड लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

जिल्लागत सिँचाइको बस्तुस्थिति

सिंचित क्षेत्र सम्बन्धि जिल्लागत विवरण

क्र.सं.	जिल्ला	जिल्लाको कुल क्षेत्रफल (हे)	खेति योग्य जमिन (IMP २०१९) (हे)	सिँचाइ योग्य जमिन क्षेत्रफल (IMP २०१९) (हे)	हाल सम्म सिँचाइ सुबिधा विकास भएको क्षेत्रफल (हे)			प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नदि नियनत्रण बाट भएको उपलब्धि (हे)	
					प्रदेश स्थापना अघि	प्रदेश स्थापना पछि	कुल क्षेत्र	उकास क्षेत्र	संरक्षण भएको
१	नवलपरासी	६३४८८	४१३७६	४०८२८	३६८१३	४९१९	४१७३२	४.६७	११७
२	रुपन्देही	१२९७४९	८९६३०	८९१९७	७४००७	४६४७	७८६५४	१३०	१९०
३	कपिलबस्तु	१६५११७	९४४३५	९४०४८	४२६२०	२८४७	४५४६७	६३	१०५
४	पाल्पा	१४६१९०	६६३१२	८६८८	६२७५	१२७	६४०२	७२	२२७
५	अर्घाखाँची	१२३९०८	२८३३९	७८३२	२७१८	४६४	३१८२	२३.६५	३७६.५
६	गुल्मी	१११०७६	४६२५२	१७१००	२९०९	४२४	३३३३	१४.८३	१४०८
७	रुकुम (पुर्व)	११६११३	९४७६	२८४४	१९७७	३२१	२२९८	१३.८५	४१.०८
८	रोल्पा	१८८५४१	४८०२२	५७५०	३३४८	५१३.५	३८६२	६९.११	११३५.८८
९	प्युठान	१३२०१३	२५३०८	७५६४	३६९०	५९२	४२८२	९४	१३०८
१०	दाङ	३०५९८१	१०६९६४	८३८४४	५०६४१	३५०३	५४१४४	६२.२४	१२५४६.८८
११	बाँके	१८८२२७	५८००५	५७७१८	३१०१५	२५७७.५	३३५९३	९७	३६४
१२	बर्दिया	११०५३६	६४९६६	६४७७९	८२७१९	२२०२	८४९२१	११.८४	३४.६
जम्मा		**१७८०९३९**	**६७९०८५**	**४८०१९२**	**३३८७३२**	**२३१३५**	**३६१८६७**	**६५६**	**१७८५४**

* नवलपरासी र बर्दिया लगाएतका तराईका जिल्लामा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ योजनाहरुको सिँचित क्षेत्रफल overlap भई दोहोरो गणना हुँदा सिँचाइ बिकास भएको क्षेत्र बढी देखिन गएको हुन सक्ने ।

मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा रहेका महत्वपूर्ण केहि सिँचाइ योजनाहरुको विवरण

बाणगंगा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कपिलवस्तु

राणाकालिन समयमा निर्मित राजकुलो पञ्चायतकालमा तत्कालिन बडाहाकिम कुन्ज बिहारीबाट १४ (चौध) वटा पञ्चायतका ६० (साठी) भन्दा बढी मौजाहरूका किसानहरुलाई सिँचाइ सुबिधा पुर्याउने उदेश्यले सो क्षेत्रका किसानहरुको जनश्रमदानबाट बाणगङ्गा नदीको पानी सङ्कलन गरी आवश्यकता अनुसार वितरण गर्ने लक्ष्य अनुरुप साबिक निग्लिहवा ३ र ४ (हाल कपिलवस्तु वडा नं. ९ र १०) को जगदीशपुर गाउँबाट वस्ती सारी "जखिरा ताल" निर्माण गरिएको थियो। तसर्थ सो जलाशय नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल बन्न पुग्यो।

तत्कालिन नहर बिभाग अन्तर्गत बाणगङ्गा सिँचाइ योजना (बि.सं. २०२८ - २०३५)बाट बाणगङ्गा सिँचाइ प्रणालीको बिकास गर्न पहिलो चरणको सरकारी लगानीको सुरुवात भयो। सिञ्चित क्षेत्र विकास योजना (२०३९/०४० - २०४५/०४६) बाट विशेष गरी प्रशाखा नहरहरू र जलाशयको विस्तारका कार्यहरू भए। बाणगङ्गा प्रणालीमा योजना समाप्त मानी यसमा मर्मत मात्र हुने गरी बि.स. २०४६बाट जिल्ला सिँचाइ कार्यालय (विभिन्न नाम) मातहत राखियो। सरकारीस्तरबाट नै यस प्रणालीमा नहर सञ्चालन तथा अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्यहरू हुने गर्दथ्यो। बि. स. २०४९ सालमा सम्पूर्ण बाणगङ्गा सिँचाइ प्रणालीको रेखदेख एवं संरक्षणकालागी "बाणगङ्गा सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता समिति" गठन गरियो। सिँचाइ नीति अनुसार ठुला संरचना, ताल, फिडर, मूल, शाखा र प्रशाखा नहरहरू हरु सरकारको मातहतमा रहने र साना कुलो-कुलेसोहरूलाई समिति (उपसमिति) मातहत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरियो। तसर्थ यहाँ संयुक्त व्यवस्थापन प्रणाली विद्यमान छ।

समयमा मर्मत, सम्हार नभएर जिर्ण अवस्थामा पुगेको यस प्रणालीलाई पुनरुत्थान गर्ने हेतुले बि. सं. २०७२/१२/१७ मा बाणगङ्गा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनको स्थापना भयो। प्रदेश स्थापना पश्चात हाल यो प्रणाली लुम्बिनी प्रदेश, उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालय, बाणगङ्गा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको मातहत रहेको छ।

बि.सं. २०७२/७३मा तत्कालिन नेपाल सरकार, सिँचाइ विभाग, ठूलो सिँचाइ पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन हस्तान्तरण परियोजना अन्तर्गत प्रमुख पुनर्स्थापनाको लागि यो प्रणाली छनोट गरिएकोमा विभागवाट मिति २०७४/०३/०९मा रू.१,१५,०४,२९,६२०.०० (अक्षरुपिः रुपैंया एक अर्ब, पन्ध्र करोड, चार लाख, उनन्तिस हजार, छ सय बिस मात्र)को लागत अनुमान (Estimate cost) स्वीकृत भएकोमा आ.ब. ०७४/७५-२०७९/८० सम्म बहुबर्षीय ठेक्काहरू (करिब २५ करोड) र जनश्रमदान (करिब ६४ लाख) बाट केहि पूर्वनिर्धारित कार्यहरू भए। समायोजन पश्चात संघ सशर्त कार्यक्रम र प्रदेश समानीकरण बजेटबाट उल्लिखित लागत अनुमानमा भएका, थपिएका नयाँ समस्याहरूलाई परिमार्जन गर्दै उपभोक्ता समितिको प्राथमिकता अनुसार साल बसाली मर्मत कार्यहरू हुँदै आइरहेको छ।

प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ योजना, दाङ

प्रगन्ना कुलो सिँचाइ प्रणाली देशको मध्यपश्चिमी भागमा पर्ने दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा अवस्थित किसान प्रबन्धित सिँचाइ प्रणाली हो। करिब १०० वर्षअघि सरकारको कुनै आर्थिक सहयोग बिना किसानहरु आफैले यो प्रणाली विकास गरेका थिए। यस प्रणालीको कुल नेट कमाण्ड क्षेत्र ५८०० हेक्टर रहेको छ।

प्रगन्ना कुलो सिँचाइ प्रणालीको कुवेत फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट (KFAED) को ऋण सहयोगमा पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरण गरिएको थियो। स्थानीय परामर्शदाताले सन् १९९६ मा तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार KFAED ले २६ अक्टोबर १९९८ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता (ऋण नं. ५५२) बमोजिम १५ लाख ५० हजार कुवेती दिनार बराबरको आर्थिक ऋण सहयोग गर्न सहमत भएको थियो । यसको प्रभावकारी अवधि १ जनवरी १९९९ देखि ६ जुलाइ २००६ हो । सो आयोजनाको सम्पूर्ण काम १६ ठेक्कामा सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाको सबै पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरण कार्यको निर्माण जुन २००२ (जेठ, २०५९) मा सुरु भएको थियो र ०९ जुलाई २००६ (२५ असार २०६३) सम्म तोकिएको मितिभन्दा अगावै सम्पन्न भएको थियो।

यस प्रणालीको मुख्य पानीको स्रोत पश्चिम रापी नदी हो। पश्चिम रापी नदी देशको मध्य-पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित एक बाह्रमासे नदी हो। नदी महाभारत शृङ्खलाबाट निस्कन्छ। झिमरुक र माडी नदी पश्चिम रापीका दुई प्रमुख सहायक नदी हुन्। यस नदीको जलक्षेत्रमा मुख्यतया वन, बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, जलस्रोत र चरन क्षेत्र पर्दछन् । पूर्व—पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ पुलको ७०० मिटर डाउनस्ट्रीममा रहेको बेसिनको क्याचमेन्ट क्षेत्र करिब ३९०३.७४ किलोमिटर छ ।

पश्चिम रापी नदीको दाहिने किनारमा ३ वटा साइड इन्टेक निर्माण गरिएका छन्। बराखुट्टी बनकूलो उप सिँचाइ प्रणाली (४५० हेक्टर) को लागि ०+००० किलोमिटरमा १.६५ क्युमेक क्षमताको इन्टेक नम्बर १, कालापानी तथा जोगिया उप सिँचाइ प्रणाली (४४०० हेक्टर) को लागि ०+५३१ किलोमिटरमा २२ क्युमेक क्षमताको इन्टेक नम्बर २ र भानपुर—मझमेरिया उप सिँचाइ प्रणाली (९५० हेक्टर) को लागि ५+३०४ किलोमिटरमा ४.७५ क्युमेक क्षमताको इन्टेक नम्बर ३ पश्चिम रापी नदीको दाहिने किनारमा निर्माण गरिएको छ। यसबाहेक सिवालिक पर्वतश्रृङ्खलाबाट निस्कने दोलाई खोला र सिङ्गाई खोलालाई पनि कमाण्ड क्षेत्रमा पानी आपूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ। दोलाई खोलामा २ वटा weir निर्माण गरिएको छभने सिङ्गाई खोलामा १ वटा weir रहेको छ।

प्रगन्ना कुलो सिँचाइ प्रणालीले देउखुरी उपत्यकाको ५८०० हेक्टर भुभागमा ४ वटा मुल नहरबाट पानी वितरण गर्दै आएको छ । बराखुट्टी बनकुलो मुल नहरको लम्बाइ १०.५९ कि.मि., कालापानी मुल नहरको १५.३४ कि.मि., भानपुर मझमेरिया मुल नहरको १२ कि.मि. र जोगिया मुल नहरको १३.९२ कि.मि. रहेको छभने यस लगायत थुप्रै शाखा प्रशाखाहरु पनि रहेका छन् ।

देउखुरी उपत्यकाको सवैभन्दा ठुलो र प्रमुख सिँचाइ प्रणालीको रुपमा परिचित यस प्रगन्ना सिँचाइ प्रणालीमा थुप्रै समस्याले आक्रान्त पारेको छ । रास्ती नदिमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननका कारण पानीको वहाव बायाँ तर्फ केन्द्रित हुदाँ दायाँ तर्फ रहेका ३ वटै मूहानहरुमा पानी पुर्याउन कठिन हुँदै गएको, वर्षेनी कम्तिमा ४/५ पटक नदी खनेर channelization गर्नु पर्ने, शाखा तथा प्रशाखा नहरमा रहेका गेटहरु लगायतका संरचनाहरु अत्यन्तै जिर्ण अवस्थामा रहेका, बस्ति विकासले खेतियोग्य जमिन खण्डिकरण भएको, खहरे, खोल्सी लगायत थुप्रै नालाहरुको निकासी अतिक्रमण भएको हुदाँ वर्षातको समयमा बस्ति तथा खेतियोग्य जमिन डुवान हुने, नारायणपुर, बलरामपुर, भुतपुर तथा पिपरखुट्टीमा हालसम्म पनि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसक्नु प्रमुख समस्याहरु रहेका छन् ।

किरण नाला लिफ्ट सिँचाइ योजना, खजुरा बाँके

बाँके जिल्लामा राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा भुतपुर्व सैनिकहरुलाई बस्ति बासाएको राधापुर क्षेत्रमा रहेको किरणनाला सिँचाइ योजना आ.ब. २०५१/०५२ मा सुरु भै २०५२/२०५३ ILC कार्यक्रमबाट निर्माण संम्पन भएको थियो । मूलनहर तथा साखा नहरको कार्य मझौला सिँचाइ योजना अन्तर्गत बिभिन्न कार्यहरु निर्माण भएका छन । यो योजनाको सम्बन्धि संछिप्त विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

- योजनाको नाम/ठेगाना : किरण नाला लिफ्ट सिँचाइ योजना, खजुरा गा.पा. १ बाँके
- योजनाको प्रकार : बिद्युतिय तथा सोलार लिफ्ट
- घरधुरी/जनाशंख्याः ३०५/१५२५
- मूल नहरको लम्बाई : १.४ कि.मि, शाखा नहरको लम्बाई : ७.६५ कि.मि
- पानीको स्रोत : किरण नाला, स्रोतको प्रकार : पेरिनियल
- सिंचित क्षेत्रफल : GCA : २५२ हे, NCA २४५ हे
- निर्मित संरचना : शाखा नहर पक्कि भएको ६६५० मि, Reservoir Chamber १ गोटा, Electric Pump-४ (३० hp, २५ hp र १५ hp), Solar Pump- ३ गोटा, Solar Panel-४४ गोटा (मर्मत गर्नु पर्ने)
- मर्मत गर्नु पर्ने : पम्प सिस्टम फेर्नु पर्ने, सोलार प्यानलहरु मर्मत गर्नु पर्ने, मूल तथा शाखा नहर पक्कि गर्नु पर्ने तथा मर्मत गर्नु पर्ने

रामपुर फाँट सिँचाइ योजना, पाल्पा

रामपुर फाँट सिँचाइ योजना (७६९ हे) पहाडी जिल्लाहरुमा रहेका सिँचाइ योजनाहरु मध्ये ठुलो योजना हो । पाल्पा जिल्लाको रामपुर नगरपालिकामा रहेको यो योजना २०४९ सालमा निर्माण भएको थियो । निस्दी

खोलाको बाया भागमा बाध बाधी करिब २२ कि.मि. मूल नहरबाट २००० ली/से पानी रामपुर फाँटमा पुर्याइएको छ । हाल यो योजना अबस्थामा रहेता पनि योजनाको बाँध निर्माण गर्ने लगाएत मूल नहर पक्कि गर्ने र अन्य संरचना बृहत मर्मत गर्नु पर्ने आबस्यकता रहेको छ र यसको लागि करिब ५७ करोड रकम आबस्यक देखिन्छ ।

मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ योजना, रुपन्देही

मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली रुपन्देही जिल्लाको दक्षिण भेगमा पर्ने मर्चवार क्षेत्र अन्तर्गत दानव र तिनाउ नदिको संगम स्थल दुईमुहान भन्ने स्थान, पूर्वको सिपवा गा.बि.स र पश्चिम माझगावा गा.बि.समा अवास्थी मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ योजना २०३८ साल देखि स्थापना भएको र २०५३ सालमा पुरा भएको हो । यस योजनाको सिंचित क्षेत्र ५६०० हेक्टर छ भने लाभान्वित घर संख्या ६३०० र लाभान्वित जनसंख्या ४४००० रहेको छ । यस योजनाको निर्माण कार्य दुई चरणमा सम्पन्न भएको (पहिलो चरण २०३७/०३८ -२०४७/०४८ र दोश्रो चरण २०४८/४९-२०५३/५४) थियो । यस योजनाको निर्माण कार्यमा UNCDF (संयुक्त राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोष) को आर्थिक सहयोग र UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) को प्राविधिक सहयोग रहेको थियो । यस योजनाको पहिलो चरणमा निर्मित मुख्य संरचनाहरु; पम्पीङ्ग स्टेशन र पम्प हाउस निर्माण, ११ के.भि.ए. बिधुत सब-स्टेशन निर्माण, १६ कि.मि ११ के.भि.ए ट्रान्समिसन लाइन (बनगाई देखि तेलियागढ पम्प हाउस सम्म), १० वटा पम्पिंग सेट जडान कार्य, हेड रेगुलेटर, डिसिलटिङ्ग बेसिन र फ्लस क्यानल निर्माण, करिब २२ कि.मी. ग्राभेल रोड र करिब २८ कि.मी. मेन र सेकेण्डरी नहर प्रणाली निर्माण भएको थियो । दास्रो चरणमा निर्मित मुख्य संरचना; ९२ कि.मी. थप नहर प्रणाली (मेन, सेकेण्डरी र टर्सरी नहर तथा स्ट्रक्चरहरु निर्माण), ३८ कि.मी. ड्रेनेज प्रणाली निर्माण, ३६ कि.मी. ग्रेवल इन्सपेक्सन रोड निर्माण कार्य भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघिय बिकास कोष र नेपाल सरकार समेतको गरी करिव १८ करोड रुपैया लागतमा २०४८ सालबाट निर्माण भएको योजना २०५४ मा जल उपभोक्ता समितिलाई आयोजना हस्तान्तरण भयो ।

मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ योजनाको हाल Canal Development works सम्पन्न नभएको हुनाले योजनाको सुरु सिंचित क्षेत्र ५६०० हे. Ha बाट घटेर २००० हे. पुग्न गएको तथा नहर भत्किएको र झाँडीले ढाकेको हुँदा पानी बग्नै समस्या छ । यस योजना पूर्ण क्षेम्तामा संचालन गर्नको लागि यस प्रणालीको बृहत स्तरको सुदृढीकरण अति आबस्यक देखिएको देखिन्छ ।

सोह्र-छतीस मौजा सिंचाइ योजना, रुपन्देही

जंगबहादुर राणाको पालामा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको मानिएको सोह्र र छत्तीसको आयु १०० वर्षभन्दा बढी हुन आउछ । किसानको परिश्रम, पानी वितरण, संस्थागत कार्यप्रणाली, सिँचाइ प्रणालीको मर्मत स्याहारका सुदृढ नियम र जनसहभागिता परिचालनका दृष्टिले सोह्र र छत्तीस सिँचाइ प्रणाली उदारणिय रहेको छ । सिँचाइ प्रणाली संगठित हुदाका समयमा ३६ वटा मौजा अर्थात् गाउहरु मिलेर बनाइएकोले छत्तीस मौजा र

१६ मौजा मिलेर बनाइएकोले सोह्र मौजा नामकरण हुन गएको हो । यसमध्ये छत्तीस मौजा सिँचाइ प्रणालीमा ६० मौजा आबद्ध छन् । सोह्र र छत्तीसको मूल नहरलाई तपाहा भनिन्छ ।

सोह्र-छतीस मौजा सिंचाइ योजना रुपन्देही जिल्लाको उत्तर भेगमा पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका, तिनाउ नदिमा Series Of Bed Bar बनाएर Side Intake , सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरि संचालन गरिएको छ । उक्त सिँचाइ योजनाको स्थापना १९०३ देखि १९२२ तिर भएको देखिन्छ त्यस पश्चयात हरेक आ.व. मा निर्माण कार्य चली नै रहेको छ । यस योजनाको सिंचित क्षेत्र ५००० हेक्टर हेक्टर रहेको छ । यस योजनामा हाल सम्म निर्माण भएको संरचनाहरु; १५ कि.मि. मुख्य नहर, ३० कि.मि. शाखा/प्रशाखा नहर, ८ वटा बेडबार (हाल ३ वटा बेडबार बाढीले बगाएको अवस्था), ३ ठाउमा Escape र ८ वटा V.R.B (Village Road Bridge) निर्माण भएका छन् ।

यस योजना हाल संचालन अवस्थामा रहेता पनि भत्किएको Bed Bar पुन निर्माण गर्न अति आवश्यक रहेको साथै मूल नहर, शाखा नहरको बिस्तार कार्य र V.R.B को निर्माण पनि आवश्यक रहेको देखिन्छ । बुटवलको हाटबजार हुँदै सहरको बीचबाट बग्दै आएको यो सिचाई प्रणालीमा नगरबासीले प्लाष्टिक फाल्ने, बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका जस्ता सघन सहरी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यस योजनाको संरचना संरक्षण गर्न, अतिक्रमण हटाउन तथा सिंचित जमिन बचाउन समेत चुनौती थपिएको छ ।

डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजनाहरु

शान्तिपुर जमुनि भूमिगत सिंचाइ योजना - वढैयाताल वर्दिया :- शान्तिपुर जमुनी भूमिगत सिँचाइ योजना आ.ब. २०६१/०६२ मा NISP कार्यक्रमबाट बिश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस योजनामा १४ थान छुट्टाछुट्टै डिप डिप ट्यूववेल सिंचाइ प्रणालीहरु रहेका छन् भने यस योजनाको सिंचित क्षेत्रफल ५६० हे रहेको छ । डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीबाट वाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलव्ध हुने भएता पनि हाल यस योजनाको ८ थान डिप ट्युबवेल मात्र अवस्थामा र वाँकि मध्ये ६ थान पनि आंशिक मात्र संचालनमा रहेका छन् । यस योजनाका सबै डिप ट्युबवेलहरु मर्मत संभार गरी संचालन गर्न सकिने हुँदा यसको लागि करिब करोड ५० लाख लागत आवश्यक रहेको देखिएको छ ।

राधापुर सितापुर डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजना, बाँकेः- यस योजनामा १९ वटा डिप ट्युबवेलहरु रहेका छन् भने यो योजना NISP कार्यक्रमबाट ९ वटा र ILC कार्यक्रमबाट १० वटा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यस योजनाको सिंचित क्षेत्र ७६० हे रहेको छ । यस योजनामा ४ वटा प्रणालीमा Open Canal प्रणाली छ भने बाँकी १५ वटामा uPVC भूमिगत पानि वितरण प्रणाली रहेको छ । बिश्वबैंक को आर्थिक सहयोगमा IWRMP कार्यक्रम बाट यस योजनामा केहि मर्मतको कार्य भएता पनि मर्मत कार्य अधुरो रहेको देखिन्छ ।

धर्ना डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजना, दाङः- यो योजना निर्माण २०६१/६२ मा भएको थियो । यहाँ १४ गोटा डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली रहेका छन् भने सिंचित क्षेत्र ५६० हे रहेको छ । हालसम्म पनि उल्लेखनीय

मर्मत सम्भार नभएपनि हाल यो योजनाका प्राय सबै प्रणालीहरु संचालनमा रहेका छन् । पम्प फेर्ने, वितरण प्रणाली मर्मत, पम्पघर मर्मत गर्न करिब ६ करोड ५० लाख रकम आबस्यक रहेको छ ।

यसैगरी दाङ जिल्लाका टरिगाउँ क्लस्टरमा, सोनपुर-फल्कापुर, लालमटिया, धनौरी डिप ट्यूववेल क्लस्टरमा रहेका करिब ४० डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली, कपिलबस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकामा रहेको भलबाड डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजनाका १७ प्रणाली, रुपन्देही जिल्लाको परोहा-सेमलार क्लस्टर १० वटा, र नवलपरासी (ब.सु.प.) को जहदा-जमुनिया क्लस्टरमा रहेका १६ वटा MTW र २४ वटा DTW तथा बर्दघाट-सुनवल-सरावल क्लस्टरमा रहेका १८ वटा डिप ट्युबवेल प्रणालीहरु लगाएत क्लस्टरको रुपमा बिकास नभएका एकल प्रणालीहरुमा पनि आबस्यक मर्मत सम्भार गरि संचालन गर्नु पर्ने आबस्यकता रहेको छ । डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीमा सबमरसिवल पम्प (Submersible Pump) जडान गरिएको हुन्छ र सबै पम्पहरुको निश्चित आयु हुने भएकोले सामान्यतया जडान भएको १५ बर्षमा पम्प फेर्नु पर्ने, पानि वितरण प्राणालीमा प्रयोग भएका पाइपहरु टुट्ने फुट्ने समस्याले पानि प्रवाहमा समस्या श्रीजना हुँदा मर्मत गर्नु पर्ने, ट्रान्सफर्मर चोरी हुने तथा पड्किने समस्या देखिएकोले फेर्नु पर्ने वा मर्मत गर्नु पर्ने, पम्पघर/पेनलबोर्ड लगाएतका संरचना समयमा मर्मत गर्न आबस्यक देखिन्छ । केहि प्रणालीमा अझै रहेका डिजेल बाट चल्ने VT पम्पहरु रहेकोले विद्युतीय पम्पले प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने आबस्यकता रहेको छ । पुराना प्रणालीहरुमा आबस्यक मर्मत गर्न सकेमा ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीबात बाहैं महिना सिँचाइ सुबिधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

अनुसूची ३. लुम्बिनी प्रदेशको भू-उपयोगको अवस्था

क्षेत्रफल हेक्टरमा

सि. नं.	भू- उपयोगको वर्गीकरण	नवमयराशी (ब.कि.मि.)	चेपनेछेपी	कपिलवस्तु	पाल्पा	अर्घाखाँची	गुल्मी	रुकुम पूर्वी भाग	रोल्पा	प्युठान	दाङ	बाँके	बर्दिया	प्रदेश जम्मा
१	कृषि- समथर गह्रा			१९३९	२०७	१५१७६	६६०	९५६१	५०६४	७३				३२६८०
२	कृषि-भिरालो पाखा	२०८	२४५	५८४३३	१९४८८	२८५९१	७९२६	३६३१४	१४४३३	११७४८				१७७६०७
३	कृषि - उपत्यका, टार, तराइ	४११६८	८९३८५	५९४०	८६४४	२४८५	८९१	२१४७	५८११	९५१४३	५८००५	६४९६६		४६८७९८
४	बाँझो	७८९	२८२	४२०	१०९	५५६	१७८१९	२४	१३४	९२७३	२९४९	४२१६		३६६७५
५	वन क्षेत्र	२२२९३	५७३११	७३९२७	९४१७८	६०३१८	७६६६४	१३०३१९	९६९.४९	१७१७३०	११४३८७	११०६४४		१०३३५०२
६	आवास क्षेत्र	१८७६	८८४७	७०७३	३४	४०४	२६	६७	१२३	२३२२	३१०३	४०५५		२४८१३
७	जल क्षेत्र	३६८७	२४८५	४०८१	२९७५	३५३	१०७५	१५८४	१७१७	२६६०	१२६३५	२९९७	१०११३	४६३६२
८	बुट्यान/घाँसे मैदान	२६१९	४४३०	६१७३	१६५७	८६१	२१०७	५०१७१	८४१९	६८९६	३०६४	६७६८	६३७५	९९५४०
९	हिउँ/ हिमनदी							१२४७२						१२४७२
	जम्मा	७२६४०	१३०४५६	१६५०७६	१४६१७४	१२३८७४	११०८१२	१६८२१३	१८८५६८	१३२०७०	३०५१८८	१८८२०९	२००३६९	१९३२५५९

(स्रोत: सिँचाइ गुरुयोजना २०१९)

अनुसूची ४ लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा सिँचाइ योग्य भूमी

क्षेत्रफल हेक्टरमा

सि. नं.	विवरण	नवमयराशी (ब.कि.मि.)	चेपनेछेपी	कपिलवस्तु	पाल्पा	अर्घाखाँची	गुल्मी	रुकुम पूर्वी भाग	रोल्पा	प्युठान	दाङ	बाँके	बर्दिया	प्रदेश जम्मा
१	कृषि योग्य भूमी	४१३७६	८९६३०	९४४३४	६६३१२	२८३३९	४६२५२	९४७७	४८०२२	२५३०८	१०६९६४	५८००५	६४४९६६	६७९०८५
२	सिँचाइ योग्य भूमी	४०८२८	८९१९७	९४०४८	८६८८	७८३२	१७१००	२८४४	५७५०	७५६४	८३८४४	५७७१८	६४७७९	४८०१९२
३	कृषि योग्य भूमीको तुलनामा सिँचाइ योग्य भूमीको प्रतिशत	९८.६८%	९९.५२%	९९.५९%	१३.१०%	२७.६४%	३६.९७%	३०.०१%	११.९७%	२९.८९%	७८.३९%	९९.५१%	९९.७१%	७०.७१%

अनुसूची ५ लुम्बिनी प्रदेशको सिँचित क्षेत्रको अवस्था

क्षेत्रफल हेक्टरमा

क्र. स.	जिल्ला	कृषि योग्य भूमी	सिँचाइ योग्य भूमी	प्रदेश स्थापना पूर्व (सिँचाइ गुरुयोजना अनुसार)			प्रदेश स्थापना पश्चात			हालसम्को जम्मा		
				सतह	भूमिगत	जम्मा	सतह	भूमिगत	जम्मा	सतह	भूमिगत	जम्मा
१	नवलपरासी (ब.सु.प.)	४१३७६	४०८२८	१७३३१	१९४८२	३६८१३	१४६०	३४५९	४९१९	१८७९१	२२९४१	४१७३२
२	रुपन्देही	८९६३०	८९१९७	२४६५६	४९३५१	७४००७	१९३०	२७१८	४६४७	२६५८६	५२०६९	७८६५४
३	कपिलवस्तु	९४४३४	९४०४८	३२३८६	१०२३४	४२६२०	१०७७	१७७०	२८४७	३३४६३	१२००४	४५४६७
४	पाल्पा	६६३१२	८६८८	६०२४	२५१	६२७५	१०४	२३	१२७	६१२८	२७४	६४०२
५	अर्घाखाँची	२८३३९	७८३२	२३४०	३७८	२७१८	४५६	८	४६४	२७९६	३८६	३१८२
६	गुल्मी	४६२५२	१७१००	२८५६	५३	२९०९	४१६	८	४२४	३२७२	६१	३३३३
७	इकुम पूर्वी भाग	९४७७	२८४४	१९७७	०	१९७७	३२१	०	३२१	२२९८	०	२२९८
८	रोल्पा	४८०२२	५७५०	३३४८	०	३३४८	५१२	२	५१४	३८६०	२	३८६२
९	प्युठान	२५३०८	७५६४	२४३७	२५३	३६९०	५८७	५	५९२	४०२४	२५८	४२८२
१०	दाङ	१०६९६४	८३८४४	३६९५१	१३६९०	५०६४१	१९२	३३११	३५०३	३७१४३	१७००१	५४१४४
११	बाँके	५८००५	५७७१८	१०९४५	२०७७०	३१०१५	८८६	१६९२	२५७८	११८३१	२१७६२	३३५९३
१२	बर्दिया	६४९६६	६४७७९	५६४९६	२४२२३	८०७१९	१२०	२०८२	२२०२	५६६१६	२६३०५	८२९२१
जम्मा		६७९०८५	४८०१९२	१९८७४७	१३७९८५	३३६७३२	८०६१	१५०७५	२३१३५	२०६८०८	१५३०६०	३५९८६७

अनुसूची ६

आ.व. २०८०/८१ सम्मको जिल्लागत सुचाङ्कमा आधारित प्रगति विवरण (प्रदेश स्थापना पश्चात)

क्र. सं.	जिल्ला	सिंचाइको क्षेत्र		सिंचाइ बाँध/मुहान		पक्की नहर/कुलो		स्याला ढुवबेल		पावर ट्रिल्ल स्याला ढुवबेल		छिप ढुवबेल		सिप्ट सिंचाइ		सिंचाइको लागि विद्युतिकरण		पाइपलाइन		पोखरी/जलाशय		सिंचाइ सुबिधा पुगेको क्षेत्रफल		सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्रफल		नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन		तटबन्धबाट सुरक्षित भएको जमिन		तटबन्धबाट सुरक्षित भएको	
			बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि.	बटा	कि.मि.	कि.मी	कि.मी	बटा	कि.मी	बटा	कि.मी	है	कि.मि	है	कि.मि	है	कि.मि	है	घर
१	नवलपरासी (ब.सु.प.)	सतह	८	२७.७८	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	३	०	०	०	३	१,४६०	५,५१५	९.३६	४.७	११७	७०७
		भूमिगत	०	०	१७१	८९	५९	५९	०	०	०	०	०	०	०	३४५.८	७१.८	७१.८	०	३४५८.५	१०८०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	८	२७.७८	१७१	८९	५९	५९	१	३५.१	०	०	१	०	३	७१.८	७१.८	७१.८	३	४९१८.५	६५९.५	९.३६	४.७	११७	७०७
२	रुपन्देही	सतह	४	५५.८७	०	०	०	०	४	२४.६	०	६८.९	०	६८.९	०	०	०	०	०	१९२९.५	४६८०	९.२५	१३०	१९०	१७८
		भूमिगत	०	०	७१	१७८	३९	३९	०	२४.६	०	६८.९	०	६८.९	०	०	०	०	०	२७१७.५	१२४२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	४	५५.८७	७१	१७८	३९	३९	४	२४.६	०	६८.९	०	६८.९	०	०	०	०	०	४६४७	५९२२.५	९.२५	१३०	१९०	१७८
३	कपिलवस्तु	सतह	३८	३१.५८	०	०	०	०	२	२	२	१	०	१	०	५३.३८	४९.९	४९.९	०	१७६९.५	४७०	५.१४	६३	१०५	१६६
		भूमिगत	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२८४०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		बाणगंगा	०	२८.७९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५.३८	५०.९	५०.९	०	२८४६.५	१२६७४	५.२६	६३	१०५	१६६
		जम्मा	३८	६०.३७	४६	९७	४७	४७	२	२	२	१	०	१	०	५५.३८	५०.९	५०.९	१५	१०४	२७९०	१४.७२७	७२	२०७	१०९
४	पाल्पा	सतह	२३	१०९.१	०	०	०	०	२	२	०	०	०	०	०	०	५०	५०	१५	१०४	२७९०	१४.७२७	७२	२०७	१०९
		भूमिगत	०	०	०	०	८	८	०	०	०	०	०	०	०	१.२	०	०	०	२२.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	२३	१०९.१	०	०	८	८	२	२	२	१	०	१	०	१.२	५०	५०	१५	१२६.५	२७९०	१४.७२७	७२	२०७	१०९

क्र.सं.	जिल्ला	सिंचाइको क्षेत्र	सिंचाइ बाँध/मुहान		पक्की नहर/कुलो		स्याली ट्युबवेल		पावर ड्रिल स्याली ट्युबवेल		हिप ट्युबवेल		सिप्ट सिंचाइ		सिंचाइको लागि विद्युतिकरण		पाइपलाइन		पोखरी/जलासय		सिंचाइ सुबिधा पुगेको घर क्षेत्रफल		सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्रफल		नदीमा निर्भरता (तटबन्ध निर्माण)		नदी निर्भरताबाट उकास भएको जमिन		तटबन्धबाट सुरक्षित भएको		तटबन्धबाट सुरक्षित भएको घर	
			संख्या	कि.मि	संख्या	कि.मि	संख्या	कि.मि	संख्या	कि.मि	संख्या	कि.मि	संख्या	कि.मि	संख्या	कि.मि.	संख्या	किर्मी	संख्या	कि.मि	संख्या	हे.	संख्या	हे.	कि.मि	हे.	कि.मि	हे.	कि.मि	हे.	घर
५	अर्घाखाँची	सतह	४०	११६.९	०	०	०	०	०	०	०	०	७	०	०	०	५५.८	०	८५	०	४५६	१९११	८.३७३	२३.६५	०	०	०	०	०	४३३
		भूमिगत	०	०	१५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	७.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	४०	११६.९	१५	०	०	०	०	०	०	०	७	०	०	०	५५.८	०	८५	०	४६३.५	१९११	८.३७३	२३.६५	०	०	०	०	०	४३३
६	गुल्मी	सतह	२४	१०७.७	०	०	०	०	०	०	०	०	२	०	०	०	०	०	६	०	४१६	२८२७	७.७४४	१४.८३	०	०	०	०	०	५४८
		भूमिगत	०	०	१५	०	०	०	१६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	८	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	२४	१०७.७	१५	०	०	०	१६	०	०	०	२	०	०	०	०	०	६	०	४२४	२८२७	७.७४४	१४.८३	०	०	०	०	०	५४८
७	रुकुम पूर्वी भाग	सतह	५२	१७.७९	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	११८	०	५६	०	३२१	४४६	१०.१७२	१३.८५	०	०	०	०	०	६९९
		भूमिगत	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	५२	१७.७९	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	११८	०	५६	०	३२१	४४६	१०.१७२	१३.८५	०	०	०	०	०	६९९
८	रोल्पा	सतह	३६	१०७.८	०	०	०	०	०	०	०	०	५	०	०	०	१७९	०	४१	०	४२३	२२३०.५	२२.९३	६९.११	०	०	०	०	०	७३४
		भूमिगत	०	०	३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		मा.लु. को.सि.आ.	१७	१९.९७	०	०	०	०	०	०	०	०	९	०	०	०	३	०	८९	०	८९	२४२	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	५३	१२७.८	३	०	०	०	१५	०	०	०	१४	०	०	०	१८२	०	४१	०	५१३.५	२४७२.५	२२.९३	६९.११	०	०	०	०	०	७३४

क्र.सं.	जिल्ला	निर्माणको क्षेत्र		निर्माण वाँध/मुहान		पाईप नहर/कुलो		स्याला टुक्रेवेल		पावर ड्रिल स्याला टुक्रेवेल		हिप टुक्रेवेल		सिपट निर्माण		निर्माणको लागि विद्युतिकरण		पाइपलाइन		पोखरी/जलासय		निर्माण सुविधा पुगेको घर क्षेत्रफल		निर्माण संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्रफल		नदीमा निर्माण (तटबन्ध निर्माण)		नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन		तटबन्धबाट सुरक्षित भएको जमिन		घर
			बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि	बटा	कि.मि.	बटा	किर्मी	बटा	कि.मि	बटा	हे	हे	हे	कि.मि	हे	हे	हे	हे	हे	हे	
			३८५	९८५	७७९	११०२	२९२	९२	२९९	८८२	२३५	२३१३५	७५२९४	२०९	६५६	१४१९५	१२५२८															
९	प्युठान	सतह	१३	९९.१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२६.५	०	१०	०	५१८	४२७०	०	२३.२५	९४	१३०८.८	०	१२६२				
		भूमिगत	०	०	०	१०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५	०	०	०	०	०	०	०				
		मा.लु. को.लि.आ.	९	१२.८९	०	०	०	०	०	०	०	०	८	०	०	०	३.१	०	०	०	६९	२०५	०	२३.२५	०	०	०	०				
		जम्मा	२२	११२	०	१०	०	०	०	०	०	०	८	०	०	०	२९.६	०	१०	०	५९२	४४७५	०	२३.२५	९४	१३०९	०	१२६२				
१०	दाङ	सतह	१०७	१६२.७	०	०	०	०	०	०	०	०	४६	२७	०	०	८.४३	१२२	११	०	१९२	१७९४६	१३९०	०	०	०	०	५४७९३				
		भूमिगत	०	०	८६	२१९	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३३११	१३९०	०	०	०	०	०	०				
		प्रगत्ना	०	४३.८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१००.२४	०	०	०	०	०	०	०	३५३०	०	०	०	०	०	०				
		जम्मा	१०७	२०६.५	८६	२१९	५३	०	५३	०	५३	०	४६	१२७.२	३	६	३.५६	१३१	११	०	३५०३	२२८६६	५८३५	७४.०४	०	०	०	५४७९३				
११	बाँके	सतह	११	२३.९३	०	०	०	०	०	०	०	०	४	५	४	४	४.५६	६०.६	४	०	८८६	५८३५	११०८	१२.२२६	९७	०	०	१६६३				
		भूमिगत	०	०	२४८	१६४	४५	४५	४५	४५	४५	४५	०	२४.७	०	०	६०.६	६५.२	०	०	१६९१.५	११०८	०	१२.२२६	९७	०	०	१६६३				
		जम्मा	११	२३.९३	२४८	१६४	४५	४५	४५	४५	३	३०	४	३०	४	४	६५.२	६५.२	४	०	२५७७.५	६९४३	६९४३	१२.२२६	९७	३६४	३४.६	१३६				
१२	बर्दिया	सतह	३	१९.१९	०	०	०	०	२	१.६	४	३.५	१२०	४९२०	११.९७	११.८४																	
		भूमिगत	०	०	१५७	२६६	४१	०	२३.२	५६.३	२०८२	१२५२	०	०	०	०																	
		जम्मा	३	१९.१९	१५७	२६६	४१	२	२४.८	५९.८	४	२२०२	५३७२	११.९७	११.८४	३४.६																	

अनुसूची ७

प्रदेश स्थापना पश्चात कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भएका मुख्य सिँचाइ योजनाहरूको विवरण

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
१	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी**			
१	कुकुरमारा सिंचाई योजना	बर्दघाट,१६	१६०	खजुरा खोला
२	लौकेश्वोर सिंचाई योजना	सुनवल	७२०.००	तुरिया नदि
२	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही**			
१	छत्तीस मौजा सामुदायिक सिँचाइ प्रणाली	बुटवल-तिलोत्तमा रुपन्देही	३६००	तिनाउ नदी
२	रोहिणी सिँचाइ योजना	तिलोत्तमा-देवदह, रुपन्देही	१५००	रोहिणी नदी
३	सियारी बबुरिया सिँचाइ योजना	सियारी गा.पा, रुपन्देही	९१०	सियारी खोला
४	कंचन बाँध सिँचाइ योजना	विष्णुपुरा, रुपन्देही	१५१०	कंचन खोला
५	इन्गुरिया लिफ्ट सिँचाइ योजना	साल्झण्डी रुपन्देही	२०७	इङ्गुरिया खोला
६	मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ योजना	मर्चवारी, रुपन्देही	५६००	
७	पाचमोहनिया सिँचाइ योजना	सियारी गा.पा, रुपन्देही	४३०	पाचमोहनिया खोला
८	खडवा मोतिपुर सिँचाइ योजना	मायादेवी-५,६	१२००	
९	तल्लो खैरेनी चप्पर कुलो सिँचाइ योजना	रुपन्देही	२००	चप्पर खोला
१०	चारतपाह सिँचाइ योजना	रुपन्देही	३३००	तिनाउ (दानव)
११	कोलुवा सिँचाइ योजना	देवदह-३	१५०	कजरार खोला
१२	भवानीपुर देविदमार सिँचाइ योजना	देवदह-०४	२००	बड्की खोला
१३	पहेला खोला सिँचाइ योजना	सैनामैना-११	२००	पहेला खोला
१४	कंचन सिँचाइ योजना साल्झण्डी	साल्झण्डी	२००	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
३१२७१	१५५००	२०७५-७६	२०७७-७८	४००	१७००	संचालित	
२६१२५२	१४७८६१	२०७७-७८	२०८०-८१	७००	३४५०	संचालित	
४७८०४२.००	४१९५२०.७८	७३-७४	७७-७८	५०७०.००	१९३२०.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
४७२४८६.००	४१५२८६.२६	७३-७४	७८-७९	१९००.००	७२००.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
१९६०३१.००	१०५०६४.७३	७२-७३	७७-७८	६००.००	३३००.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
२०१६९३.००	१३६८२८.५०	७१-७२	७७-७८	४७८०.००	४४२२८.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
७१२४१.००	५५६१०.०६	७३-७४	७६-७७	३००.००	१६००.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
						मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
७७९४८.००	४९२८५.६७	७७-७८	७९-८०	११३०.००	५३६०.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
						मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
४९७२८.००	२८७८८.८४	७२-७३	७६-७७	२५०.००	१५००.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
१९०२५०.००	३८५५९.६३	७१-७२	७३-७४	५८४२.००	३७१५४.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने र थप शाखा नहर निर्माण गर्नुर्ने।	
४८६००.००	३१३७३.९९	७६-७७	७७-७८	३००.००	१५००.००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
६८६६३.००	३८५७०.००	७६-७७	७८-७९			मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
५९१८०.००	२८५५८.९८	७६-७७	७७-७८			मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
						मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
१५	१६ मौजा सिँचाइ योजना	बुटवल-तिलोत्तमा रुपन्देही	९००	तिनाउ नदी
१६	झिम्झिमे सिँचाइ योजना	साल्झण्डी गा.पा-१ र २	२४०	कंचन खोला
१७	सियारी तिनाउ लिफ्ट सिँचाइ योजना	सियारी गा.पा-३	१००	तिनाउ नदी
१८	दयानगर दानव लिफ्ट सिँचाइ योजना	सियारी गा.पा-४	१०५	दानव नदी
३	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा**			
१	रामपुर फाँट सिं.यो.	रामपुर	८००.००	निस्दीखोला
२	अलैचे बडहरे सिं.यो.	रामपुर-१		
३	गेब्दीखोला ठुलो कुलो सिं.यो.	रामपुर-१०	२०.००	गेब्दीखोला
४	बर्दले फाँट सिं.यो.	रामपुर-१०	१००.००	झम्मा खोला
५	जलुके फाँट सिं.यो.	तिनाउ-१		
६	खहरे खोला सिं.यो.	बगनासकाली-९	२१.००	खहरे खोला
७	मोहने सिं.यो.	माथागढ़ी-२	२५.००	गेरौंदी खोला
८	धाबफाँट सिं.यो.	रैनादेबी छहरा-७		
९	टाहारी कुलो सिं.यो.	रैनादेबी छहरा-३	३१.००	बुढीखोला
१०	बधवारी लालपाटि सि.यो.	बगानसकाली-२	४२.७५	तिनाउ खोला
११	कंडेल कुलो सि.यो.	रामपुर-७	३४.२०	बहखोला
१२	कराङ्ग फाँट सिं.यो.	माथागढ़ी-७	३२.००	बसेनी खोला
१३	मनासेवा गडवास सिं.यो.	माथागढ़ी-६	५५.००	झुम्सा खोला
४	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची**			
१	शुक्मी पन्चासे सि. यो.	स. न. पा. -१ अ. खाँ.	२२.००	बांगीखोला
२	माटे रनुवाटारी सि. यो.	स. न. पा. -१ अ. खाँ.	४५.००	बांगीखोला
३	चौवाटार सि. यो.	छत्रदेव -६ अ. खाँ.	१००.००	जेरेखोला
४	खहरे कुलो सि. यो.	छत्रदेव -२ अ. खाँ.	५४.००	खहरेखोला
५	बाँझाखर्क सि. यो.	मालारानी - ८ अ. खाँ.	४३.००	गाजरी ढुंगा खोला
६	द्वारे खोला सि. यो.	मालारानी -७ अ. खाँ.	३३.००	द्वारे खोला
७	चिउरीबास खोलाखर्क खारखोला सि. यो.	पाँणिनी -५ अ. खाँ.	२०.००	खारखोला
८	लामाताल लिफ्ट सि. यो.	सि. न पा ७ अ. खाँ.	४५.००	रासी नदि
९	लापे लिफ्ट सि. यो.	सि न पा ८ अ. खाँ.	७५.००	रासी नदि
१०	खरघाट नयाँबस्ती सि. यो.	सि न पा ९ अ. खाँ.	२५.००	रङसिङ खोला
११	मुसिबाङ सि. यो.	सि न पा १३ अ. खाँ.	४६.००	मुसीवान खोला

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
११२६०	७९१५१	७६-७७	७७-७८	३६६४	१७३८८	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
५४८४५	३१५८५	७१-७२	७८-७९	३८४	२०७७	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
३०९३१	२४८२५	८०-८१	८०-८१	४००	२४००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
२०६१५	१७५९२	८०-८१	८०-८१	३८०	२०००	मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने	
९७२०९	७४९१८	०७५/७६	०७६/७७			बृहद मर्मत गर्नु पर्ने	
११८९२	११२३५	०७५/७६	०७६/७७			संचालनमा रहेको	
९९१०	६३२९	०७५/७६	०७६/७७	६५	३९०	संचालनमा रहेको	
४९३६२	२९४८०	०७५/७६	०७६/७७	१९८	१३८३	संचालनमा रहेको	
११३०९	९०२९	०७५/७६	०७६/७७			संचालनमा रहेको	
११०४९	५९११	०७६/७७	०७९/८०	७२	४८४	संचालनमा रहेको	
१०४१८	४९८१	०७७/७८	०७७/७८	६५	४१०	संचालनमा रहेको	
	५३५०	०७७/७८	०७७/७८			संचालनमा रहेको	
८२५३	४१२९	०७७/७८	०७७/७८	५५	३२८	संचालनमा रहेको	
३८९१४	१९७४५	०७७/७८	०७९/८०	१५२	१०२६	संचालनमा रहेको	
३८३०३	१७८३९	०७७/७८	०७९/८०	७५	४०५	संचालनमा रहेको	
२९३०५	११९४५	०८०/८१	०८१/८२	५३	५४२	संचालनमा रहेको	
३७९४७	२४७४५	०७६/७७	०७९/८०	५३	६०१	संचालनमा रहेको	
१८३६९.००	१३५००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	६०.००	३६४.००		
४९८७२.००	२००००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	१०३.००	५७६.००		
४३०९०.००	३००००.००	२०७५/७६	२०७९/८०	२२०.००	१४५०.००		
४५९०३.००	१९५००.००	२०७६/७७	२०७८/७९	७५.००	३९५.००		
१५२००.००	९३००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	३९.००	२७५.००		
२३१६१.००	१२३००.००	२०७७/७८	२०८०/८१	६०.००	३६०.००		
६६३९.००	५१००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	४५.००	३०९.००		
२५९९०.००	१२१००.००	२०७५/७६	२०७९/८०	१००.००	५००.००	मर्मत गर्नु पर्ने	
३९६१८.००	२७८००.००	२०७५/७६	२०७८/७९	२५०.००	१५००.००		
४१३०५.००	२११००.००	२०७६/७७	२०७८/७९	४५.००	२५०.००		
४२४०१.००	१९९००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	६५.००	४४९.००		

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
१२	बिक्रमसोता सि. यो.	सि न पा १४ अ. खाँ.	३५.००	वाणगंगा
१३	पौदीखोला पौडर्लटारी सि. यो.	स न पा ६ अ. खाँ.	३५.००	पौदीखोला
१४	फुदवाङ फाँट सि. यो.	स न पा ६ र ७ अ. खाँ.	२०.००	फर्ज्याङखोला/ बांगीखोला
१५	दमाईढुंगा सि. यो.	शि न पा ४ अ. खाँ.	२८.००	शितखोला
१६	भाविन कफली सि. यो.	शि न पा ४ अ. खाँ.	२०.००	शितखोला
१७	जौबारी चंखेली एक्लेखेत सि. यो.	शि न पा २ अ. खाँ.	२०.००	शितखोला
१८	हर्सिङखोर सि. यो.	स न पा १० अ. खाँ.	२४.००	बांगीखोला
१९	जरेखोला बगाले पांच सय फाँट सि. यो.	स न पा ४ अ. खाँ.	३२.००	जरेखोला
५	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मी**			
१	हुग्दी तुराङ्ग सिँचाइ योजना	चन्द्रकोट-०८	९८.००	हुग्दी खोला
२	बोहा फाँट सि.यो.	त्रकोट-०४	६२.००	कोर्दी खोला
३	चौरासीफाँट सि.यो.	इस्मा-०६	१४०.००	अर्जेखोला
४	झेदिखोला सिँचाइ योजना	मुसिकोट-०७	८८.००	झेदिखोला
५	गान्टारी सिं. .यो.	मालिका -०५	६०.००	छाल्दी खोला
६	कुमलटारी सी.यो.	गुल्मिदरबार-०६	१२०.००	बाड खोला
७	कुमलटारी सी.यो.	धुर्कोट-०६	३०.००	छाल्दी खोला
८	अस्लेवा चौर सिँचाइ योजना	सत्यवती-०१	५५.००	
९	भैसेरुम्टा सिँचाइ योजना	मालिका-०६	१२०.००	अर्जेखोला
६	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सव डिभिजन कार्यालय, रुकुमपूर्व**			
१	महत सिँचाइ योजना	भुमे-६	२२	डुबका खोला
२	लाखरखोला सिँचाइ योजना	भुमे-९	२८	मुलखोला
३	इतिघारी प्लास्टिक पोखरी सि.यो.	सिस्ने-२	५	उबाखोला
४	दादिंग प्रथम सिँचाइ योजना	सिस्ने-४	१७	मुलखोला, तानेखोला
५	सिमाकुलो सिँचाइ योजना	भुमे-३	१५	भैरमखोला
६	ठुलाखोला सिस्नेरी फाँट सि.यो	सिस्ने-७	१८	ठुलोखोला
७	प्लास्टिक पोखरी कोल सि.यो.	पुथाउतरगंगा-१२	१४	कोलखोला
८	बिरगुमखाना नमुना न.प्र.सि.यो.	पुथाउतरगंगा-१३	१६	धसुवा खोला
९	दादिंग दोस्रो सिँचाइ योजना	सिस्ने-४	१५	जरुवापानी
१०	कोर्जाखोला सिँचाइ योजना	भुमे-७	२०	कोर्जाखोला
११	मगराखोला सिँचाइ योजना	भुमे-६	१८	मगरखोला
१२	खराबांग सिँचाइ योजना	पुथाउतरगंगा-९	५०	पईने खोला
१३	रान्सी सिँचाइ योजना	पुथाउतरगंगा-१४	१५	मुलखोला
१४	सिमचौर सिँचाइ योजना	भूमे-९	१६	ठाडो खोला

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
४८९६१.००	२१२००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	१९६.००	१५६८.००	मर्मत गर्नु पर्ने	
२९९३४.००	९०००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	४१.००	२४५.००		
२१८०४.००	१६०००.००	२०७८/७९	२०८०/८१	१२०.००	५८४.००		
३२१३१.००	१९०००.००	२०८०/८१	२०८०/८१	५०.००	२६०.००		
२३७१६.००	१२८००.००	२०८०/८१	२०८१/८२	४१.००	२९०.००		
२४२७५.००	८५०००.००	२०८०/८१	२०८१/८२	३६.००	१९५.००		
३२८२८.००	१७४००.००	२०८०/८१	२०८१/८२	५५.००	२६३.००		
२१६०५.००	७९००.००	२०८१/८२	२०८१/८२	१०५.००	६०२.००		
४८२००.००	२५०००.००	२०७७/७८	२०८१/८२	१४४.००	११७९.००		
२६०००.००	२२०००.००	२०७६/७७	२०७९/८०	४५.००	२००.००	पहिरोले क्षतिग्रस्त	
७०३५०.००	४६०००.००	२०७६/७७	२०८१/८२	२८९.००	१४५०.००		
३२५००.००	२३०००.००	२०७७/७८	२०८०/८१	५६.००	४८०.००		
३१४००.००	२७६००.००	२०७६/७७	२०७८/७९	५४.००	२९७.००		
४९९८०.००	३६०००.००	२०७७/७८	२०७८/७९	५८.००	५०१.००		
२४८००.००	२३०००.००	२०७७/७८	२०८१/८२	३५.००	३००.००		
२५५००.००	१९८००.००	२०७६/७७	२०७९/८०	४०.००	२००.००		
३४८००.००	३२८००.००	२०७७/७८	२०८१/८२	६५.००	५५०.००		
१९५१३.४६	१८९३४.७६	०७५/०७६	०७९/०८०	१५०	७३५.०		
१९०९०.००	१६५००.००	०७६/०७७	०७९/०८०	४०	२१९.०		
७६५६.००	७०००.००	०७६/०७७	०७९/०८०	५१	३३६.०		
७७४६२.००	५९००.००	०७६/०७७	०७९/०८०	४०	२४०.०		
११३४.००	१०४५.००	०७६/०७७	०७९/०८०	९३	४९७.०		
७३०४.००	५६०५.००	०७६/०७७	०८०/०८१	५४	२५९.०		
४०८८.००	३६८७.००	०७६/०७७	०७९/०८०	६३	३१५.०		
५२९४.००	३३५०.००	०७६/०७७	०७९/०८०	५१	३५०.०	मर्मत गर्नुपर्ने	
९९६०.००		०७६/०७७	०७९/०८०	९८	४९६.०		
७०००.००	५८५१.००	०७५/०७६	०७८/०७९	६७	३५३.०		
७४६०.००	४०००.००	०७६/०७७	०८१/०८२	८८	२६४.०		
२७२८३.००	१८८००.००	०७५/०७६	०८०/०८१	११५	६६०.०		
१५२९२.००	११०००.००	०७८/०७९	०८०/०८१	६०	३००.०		
११३१३.००	११०००.००	०७८/०७९	०८०/०८१	७५	४००.०		

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
१५	सेराबांग सिँचाइ योजना	भूमे-५	२५	बिमाखोला
१६	छिपेखोला सि.यो.	सिस्ने-२	२५	छिपेखोला
१७	तिलतारा सि. विकास खवांगबगर	भुमे-३	३	तिपरखोला
१८	गुनाम सिँचाइ योजना	भूमे-७	२०	ओडारखोला
१९	हाईबुंग सुपिस्याला फाँट सि.यो.	भूमे-६	१५	हाईबुंगखोला
७	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा**			
१	तीनखोला सिँचाइ योजना	परिवर्तन १, रोल्पा	१६	तीन खोला
२	खैरेनीमुल सुनारडेरा धउलागाँउ सिँचाइ योजना सुनिलस्मृति ६	सुनिलस्मृति ६, रोल्पा	१३	खैरेनी मुल
३	चिसाखोला भिङ्ग्रीपाटी सिँचाइ योजना, लुङ्ग्री ३	लुङ्ग्री ३, रोल्पा	१४	जुतुङ खोला
४	बाँधकुलो सिँचाइ योजना, त्रिवेणी ५, रोल्पा	त्रिवेणी ५, रोल्पा	११	झागर खोला
५	झेनामखोला सालिबाङ सिँचाइ योजना, रुन्टीगढी ७	रुन्टीगढी ७, रोल्पा	१०	झेनाम खोला
६	गुनामखोला कालीजंग धनचौर सिचाई योजना	रुन्टिगढी १, रोल्पा	२५	गुनामखोला
७	मनगाड सिचाई योजना	सुनिलस्मृति ५,रोल्पा	४०	खालु खोला
८	झागरखोला सिचाई योजना	त्रिवेणी ५, रोल्पा	२५	झागर खोला
९	घान्टुखोला सिँचाइ योजना	रोल्पा २, रोल्पा	४०	घान्टु खोला
१०	चिउरिधारा सिँचाइ योजना	रोल्पा न.पा. १०, रोल्पा	३०	बिबाङ खोला
११	कलमखोला सिँचाइ योजना	सुनिलस्मृति १, रोल्पा	४५	कलम खोला
१२	धम्पाखोला हरिगाउ सिँचाइ योजना	सुनिलस्मृति २, रोल्पा	१४०	धम्पा खोला
८	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्यूठान**			
१	सिरुवारी पिपलटारी सि यो	नौबहिनी ६	३६	
२	दहरेखोला सि यो	झिमरुक गा पा ६	१७	
३	बाङ्गेसाल लिफ्ट सि यो	सरुमरानी २	४५	रास्ती नदि
४	झिमरुक खोला दम्तीगाँउ कुमालबस्ती लिफ्ट सिँचाइ योजना	प्यूठान न पा ८, प्यूठान	११.५	
५	जोगिमारा खनालपोखरी सि यो	स्वर्गद्वारी ४ प्यूठान	८.५	
६	जाडिफाँट सि यो	एरावती गा पा प्यूठान	२२	
७	चालिसे आमबोटे सयमुरे	झिमरुक ४	१६	
८	नौबहिनी खवाङ्ग सि यो	नौबहिनी गा पा ४	८०	
९	आगबेशि रजवारा सि यो	गौमुखी ३ प्यूठान	२८	
१०	लामासेरा साठीमुरे सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०३		
११	दहखोला सिं.यो.	प्यू.न.पा.-०९		
१२	अर्लावांग सिँचाइ किलो	ऐरावती गा.पा.-०६		

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
२९९८०.००	२५२७०.००	०७५/०७६	०८०/०८१	१९७	१६००		
१६०००.००	१४२००.०	०७५/०७६	०८१/०८२	५५	२७६		
२१००.००	१५००.००	०८०/०८१	०८१/०८२	११	६७		
७५००.००	५२००.००	०७६/०७७	०८०/०८१	८०	४५०.०		
५४००.०	४६००.००	०७७/०७८	०७८/०७९	५३	२५७.०		
२३८९८		२०७९/८०	२०८०/८१	७७	४४८		
१६६६९		२०७९/८०	२०८०/८१	६५	४०२		
१५९०८.००		२०८०/८१	२०८१/८२	३५	१८२		
१७५५६.००		२०८०/८१	२०८१/८२	४९	२३९		
१३७२२.००		२०८०/८१	२०८१/८२	३९	२७०		
१९८८५.००		२०७७/७८		५४	३१३	पहिरोले क्षतिग्रष्त	
२४३५५.००		२०७७/७८	२०७९/८०	१५०	८२०		
१९९५१.००		२०७८/७९	२०७९/८०	७०.००	२९०.००		
२२४५५.००		२०७७/७८	२०८०/८१	९०.००	५००.००		
५८८६३.००		२०७७/७८		१४५	९५७		
१७६८५.००		२०७७/७८		६०	३००		
७७२२२.००		२०७७/७८		३३३	१७२२		
२७,८७०.००	१२,०००.००	२०७३/७४	२०७५/०७६				
१०,२६१.००	६,७७१.००	२०७३/७४	२०७५/०७६				
२३,७१९.००	१४,५५०.००	२०७२/७३	२०७५/७६	७२	५०२	आंशिक संचालन	
४,६११.००	४,४३९.००	२०७६/०७७	२०७६/०७७				
५,१८५.००	४,४४५.००	२०७६/०७७	२०७६/०७७				
१३,९४१.००	७,२००.००	२०७६/०७७	२०७६/०७७				
९,८३३.००	६,२००.००	२०७६/०७७	२०७६/०७७				
२२,८८२.००	१२,८९३.००	२०७६/७७	२०७७/७८				
१५,०८६.००	७,५९१.००	२०७६/७७	२०७७/०७८				
१,६३०.००	१,४४०.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
१,६४०.००	१,४४०.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
१,६४५.००	१,४३९.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
१३	बरवांग ठुलो कुलो सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०६		
१४	जाउले खेत आफ सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०८, प्यूठान		
१५	गोर्खे कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०७ र ०८		
१६	गोठिमारी दहखोला सि यो	झिमरुक ६ प्यूठान	३०	
१७	नौबहिनी बाँसकोट सि यो	नौबहिनी ७ प्यूठान	१५	
१८	भुसवाङ्ग जिउनेखोला सि यो	प्यूठान न पा १०	२६	
१९	फड्केबाँसखोला	झिमरुक ५	१२	
२०	बल्देमाक्रे सि यो	नौबहिनी ६	१२	
२१	दाङ्गवाङ्ग डावर कुलो सि यो	एरावती १ प्यूठान	४०	
२२	दाङ्गवाङ्ग डावर कुलो सि यो	एरावती १ प्यूठान		
२३	काउले राटामाटा कैनपानी सि यो	झिमरुक ८ प्यूठान	११४	
२४	काउले रातामाटा कैनपानी सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		
२५	देउराली सि यो	नौबहिनी ७ प्यूठान	२७	
२६	देउराली सि यो	नौबहिनी ७ प्यूठान		
२७	बिकासे कुलो सि यो	ऐरावती गा पा ६ प्यूठान	८०	छापे खोला
२८	फड्केबाँस खोला सि.यो.	झिमरुक गा.पा-०५, प्यूठान		फड्केबाँस खोला
२९	मजुवा फापरकटेरी आगबेसी सि.यो.	गौमुखी ३ प्यूठान		
३०	कोइराफेदी साठीमुरे लामासेरा सि.यो.	गौमुखी ७ र झिमरुक-०३ , प्यूठान		झिमरुक नदि
३१	झिमरुक खोला कुमालबस्ती लिफ्ट सिँचाइ योजना	प्यू.न.पा.-०८		
३२	मार्सीवाङ्ग लिफ्ट सि.यो.	माण्डवी गा.पा.-०३		
३३	मजुवा बुडादेवी सि.यो.	प्यू.न.पा.-०९		
३४	जाउले खेत आप सिँचाइ कुलो	स्वर्गद्वारी न.पा.-०८, प्यूठान		
३५	स्याउलीघारी बस्ति तथा फाँट सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०७ र ०८		
३६	रानी कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०७ र ०८		
३७	लादम सि.यो.	ऐरावती गा.पा.-०६		
३८	रानी कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०५		
३९	कोइराफेदी साठीमुरे लामासेरा सि.यो.	गौमुखी ७ र झिमरुक-०३ , प्यूठान		
४०	रिठ्ठाखेत कुँवरखेत मसानघाट सि.यो.	नौबहिनी गा.पा.-०७ र ०८		
४१	राम्फेंदी सि.यो.	गौमुखी गा.पा.-०७		
४२	धवांग चुनाहा कुलो सि.यो.	ऐरावती गा.पा.-०४		
४३	शिवशक्ति लिफ्ट सि.यो.	प्यू.न.पा.०१		

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
१,७५७.००	१,५८४.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
१,६६२.००	१,४४०.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
१,८३८.००	१,५७८.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
१२,९८६.००	७,५९१.००	२०७६/०७७	२०७७/०७८				
९,६८८.००	६,८७५.००	२०७६/०७७	२०७७/०७८				
११,९८१.००	९,२७०.००	२०७६/७७	२०७७/०७८				
७,६३३.००	५,६००.००	२०७६/०७७	२०७७/०७८				
८,१७५.००	६,१२५.००	२०७६/७७	२०७७/०७८				
२९,६८८.००	८,५३८.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
७,८५०.००	७,२५९.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
३६,२६२.००	२२,२३२.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
७,७६४.००	७,१००.००	२०७७/७८	२०७७/०७८				
७,७०९.००	७,०९२.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
७,५७२.००	६,९७२.००	२०७७/०७८	२०७७/०७८				
४९,९७१.००	३५,५६७.००	२०७६/७७	२०७७/७८	५८	६२०		
१,७४०.००	१,४७०.००	२०७७/७८	२०७७/७८				
१,९७६.००	१,८४४.००	२०७७/७८	२०७७/७८				
२,२०७.००	१,९२०.००	२०७७/७८	२०७७/७८				
२,२९४.००	२,१०९.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,४७४.००	२,३८०.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,१२५.००	१,९१९.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
३,३०८.००	२,८८०.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,२१०.००	१,९२०.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,२०९.००	१,९१८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,२०४.००	१,९१८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,२०१.००	१,९१९.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,२०७.००	१,९१८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,२०१.००	१,९१९.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
१,५५२.००	१,४३८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,५७७.००	२,३९८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,०५५.००	१,९१८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
४४	मेहेरिया खोरिया सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		
४५	दंगाल खोला खैरेनी सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६,०७, र ०८		
४६	घारी कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०२		
४७	गोर्खे कुलो सि.यो.	बिजुवार, प्यूठान		
४८	बुढी ढुङ्गा सि.यो.	प्यू.न.पा.-०३		
४९	विकासे कुलो सि.यो.	ऐरावती गा.पा.-०६		
५०	माना गाउ सि.यो.	प्यू.न.पा.-०८		
५१	नौकुलो सि यो	प्यूठान न पा प्यूठान	११७	जुम्री खोला
५२	नौ कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०१,०२ र ०३		
५३	दिवांग सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.०९		
५४	विकासे कुलो सि.यो.	ऐरावती गा.पा-०६		
५५	दंगाल खोला खैरेनी सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६, ०७ र ०८		
५६	झिमरुक खोला दम्ती गाउँ कुमाल बस्ति लिफ्ट सि.यो.	प्यू.न.पा.-०८		
५७	डाबर कुताफाँट बर्राबोट सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.प.-०७		
५८	नेवारा छम सि.यो.	नौबहिनी गा.पा.-०६		
५९	अग्निखर्क राल्पा सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६		
६०	बर्बांग ठुलो कुलो सि.यो.	झिमरुक न.पा.-०६		
६१	सिरखोला नेटा चिसावांग सि.यो.	झिमरुक न.पा.-०६		
६२	साजनबोट सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६		
६३	मोतर्ने सिँचाइ कुलो	प्यू.न.पा.-०४		
६४	छतीस बगर कुलो सिँचाइ	प्यू.न.पा.-०२		
६५	धनमुडा सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६		
६६	नयाँ कुलो सि.यो.	नौबहिनी गा.पा.-०७		
६७	चाका सि.यो.	स्वर्गदारी न.पा.-०८		
६८	हरिया कुलो सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०५ र ०६		
६९	समुन्द्रफाँट सि.यो.	ऐरावती गा.पा.-०४		
७०	बदर कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०४		
७१	रामफेदी सि.यो.	गौमुखी गा.पा.-०७		
७२	छम सिमला खोला खेत सि.यो.	नौबहिनी गा.पा-०६		
७३	धाइरे पाङ्गवाङ्ग सि.यो.	प्यू.न.पा.-०८		
७४	गैडा पलासे सिँचाइ कुलो	मल्लरानी गा.पा.-०२		

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
५,१४४.००	४,७९०.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
५,१४९.००	४,७९५.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
३,३१०.००	२,८७५.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
२,०५६.००	१,९१८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
३,६०४.००	३,३५०.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
५,१५२.००	४,६६५.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
१,५३०.००	१,४३८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
४८,०४०.००	२९,०००.००	२०७८/०७९	२०७९/०८०	४५९			
५,२८१.००	४,१०५.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
४,१२४.००	३,८४७.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२८५.००	२,११५.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
५,१५४.००	४,८१०.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,५८०.००	२,१३०.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
३,३३५.००	२,६९३.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२२३.००	१,९०६.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२२३.००	१,९३२.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२२३.००	१,९२०.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२०७.००	१,९१५.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२२७.००	१,९७८.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२२४.००	१,९१५.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,८०४.००	२,४१०.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,२२३.००	१,९९३.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
३,३४६.००	२,८८२.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
३,३४८.००	२,८८५.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
३,३३३.००	२,८५८.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
१,६७०.००	१,१४६.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
३,१०४.००	२,८९२.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,५८२.००	२,४१४.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,५७७.००	२,४१४.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
३,०९२.००	२,८७०.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,०६२.००	१,९१९.००	२०७९/८०	२०७९/८०				

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
७५	गोर्खे कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०७		
७६	छातीपाटा किटघाट सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०७		
७७	अगरा सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		
७८	चालिसे आमबोटे सयमुरे सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०४		
७९	गर्तंग खोला सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०४ र ०५		
८०	पिरमाने सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०७		
८१	खुर्पे खोला सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०१		
८२	पाडेमाला जाबुने सि.यो.	झिमरुक न.पा.-०८		
८३	उपाद्रे कुलो सि यो	प्यूठान न पा १, २, ३ र ४, प्यूठान		
८४	मेहेरिया खोरिया सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		
८५	धनवाङ्ग खोला ठुलो खोला सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०३, प्यूठान		
८६	उपाद्रे कुलो सि यो	प्यूठान न पा १,२ र ४, प्यूठान	११४	झिमरुक नदि
८७	उपाद्रे कुलो सि यो	प्यूठान न पा १, २ र ४, प्यूठान		
८८	झिमरुक खोला दम्तीगाँउ कुमालबस्ती	प्यूठान न पा ८, प्यूठान	११.५	
८९	सालघारी लिफ्ट सि यो	प्यूठान न पा १ प्यूठान	२९	
९०	सालघारी लिफ्ट सि यो	प्यूठान न पा १ प्यूठान		
९१	दुर्गा लिफ्ट सि.यो.	ऐरावती गा पा ५, दर्गा, प्यूठान	१८	झिमरुक नदि
९२	सिरखोला पारपाखा सि यो	प्यूठान न पा ९ प्यूठान	७०	सिर खोला र दह खोला
९३	सिरखोला पारपाखा सि यो	प्यूठान न पा ९ प्यूठान		
९४	कुसुन्डे खोला मुकचौर सि.यो.	माण्डवी गा.पा.-०४		
९५	दिवांग सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०९, प्यूठान		
९६	धनवाङ्ग खोला ठुलो कुलो सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०३, प्यूठान		
९७	हरियाली सि.यो.	प्यू.न.पा.-०९	६३	झिमरुक नदि
९८	हरियाली सि.यो.	प्यू.न.पा.-०९		
९९	हरियाली सि.यो.	प्यूठान न पा ९ प्यूठान		
१०१	नौ कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-१,२ र ३		
१०२	तेर्छे कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०४		
१०३	उपाद्रे कुलो सि यो	प्यू.न.पा.-०१, ०२ र ०४		
१०४	लुप्लुंग लिफ्ट सि.यो.	नौबहिनी गा.पा.-०८		
१०५	जिम्रपाटा सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
३,१६२.००	२,८८०.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
५,१५५.००	४,८०८.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,०६५.००	१,९५६.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
५,१५४.००	४,७८७.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
३,०९२.००	२,८८७.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,०७७.००	१,९२४.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
१,०००.००	९८७.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
५,३३२.००	४,४४९.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
१,६४३.००	१,४१७.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
७,११५.००	६,७७३.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
२,१०१.००	१,९२०.००	२०७९/८०	२०७९/८०				
४९,३७०.००	२३,०२०.००	२०७७/७८	२०७९/०८०				
	५,२०५.००	२०७७/७८	२०७७/७८				
८,९०२.००			२०७९/०८०				
२४,००७.००	१४,१२७.००	२०७६/७७	२०७९/०८०				
	१,७८१.००	२०७७/७८	२०७७/७८				
१३,९०३.००	५,४२३.००	२०७६/०७७	२०८०/८१	४६	३९२		
३७,१६२.००	२१,६१६.००	२०७८/०७९	२०८०/०८१	३६५	१६४०		
३,४७०.००	२,८८५.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३,६२३.००	३,३६०.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३,८३३.००	२,३००.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
४,८५८.००	३,४७०.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३४,२३७.००	११,२२४.००	२०७८/७९	२०८०/८१	३००	१२३०		
	४,३१८.००	२०७८/७९	२०७८/७९				
६,५२४.००	६,२१५.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
२,९९१.००	२,५८०.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३,६३५.००	३,३६४.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३,७१३.००	३,५५१.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
	६,५६१.००	२०७७/७८	२०८०/०८१				
३,८९२.००	३,३२०.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
१०६	भ्यागुते छोप्रे सिँचाइ कुलो योजना	झिमरुक गा.पा.-०५		
१०७	लुटथान घारी कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-०१, खैरा		
१०८	उपल्लो मलवांङ सिँचाइ कुलो योजना	ऐरावती गा.पा.-०२		
१०९	कानाकुमला टिमुरचौर सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		
११०	ठुलाबगर सि.यो.	माण्डवी गा.पा.-०४		
१११	नौ कुलो सि.यो.	प्यू.न.पा.-१,२ र ३		
११२	भिंगृकोट आपचौर सि.यो. (पोखरी निर्माण)	स्वर्गद्वारी न.पा.-४		
११३	रामफेदी सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		
११४	पकला ढावाग सिँचाइ कुलो योजना	ऐरावती गा.पा.-०५		
११५	सिमकुलो सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		
११६	चुकाफाँट सि.यो.	माण्डवी गा.पा.-०४		
११७	पाडेमाला जाबुने सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८	४८	पाडेमाला खोला, सिमा खोला, च्याठा खोला
११८	खुक्ली खोला सिं.यो.	माण्डवी गा.पा.-०२		खुक्ली खोला
११९	कल्लेरी खोला अन्तरे सि.यो.	माण्डवी गा.पा.-०२		कल्लेरी खोला
१२०	कुसुन्डे दारिमचौर सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०३		आहाल खोला
१२१	अधुवाबारी खेत सि.यो.	सरुमरानी गा.पा.-०२		गनाहा खोला
१२२	बाँझीपुर सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०४		
१२३	वनसारी तल्लो मसिना सि.यो.	ऐरावती गा.पा.-०२		वनसारी खोला
१२४	बुढीगहरा फाँट कुलो खेत सि.यो.	सरुमरानी गा.पा.-०२		गनाहा खोला
१२५	ब्याडखोला कोलचौर सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०८		ब्याड खोला
१२६	छहरे खोला सालीबिसौना सि.यो.	गौमुखी गा.पा.-०५		छहरे खोला
१२७	कटौजे सि.यो.	ऐरावती गा.पा.-०६		छापे खोला
१२८	नयाँ कुलो सि.यो.	नौबहिनी गा.पा.-०७		पधेरी खोला
१२९	तेर्छे सि.यो.	प्यू.न.पा.-०४		जुम्री खोला
१३०	समुन्द्रकोट सि.यो.	ऐरावती गा.पा.-०४		झिमरुक नदि
१३१	कुता खोला राट्टारी सि.यो.	झिमरुक गा.पा.-०७		कुता खोला
१३२	बुढीखेत जस्पुर खोला सि.तो.	सरुमरानी गा.पा.-०४		जस्पुर खोला
१३३	भिंग्रीकोट आँपचौर बाँझपोखरी जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण	स्वर्गद्वारी न.पा.-०४	६	गोगन पानी
१३४	जोगिदुङ्गा खेत सि. यो.	सरुमरानी गा.पा.-०२,	४	गनाहा खोला
१३५	जुकेपानी सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६	९	जुकेपानी खोला
१३६	पोखरीडाँडा सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६ र ०८	१८	
१३७	दंगाल खोला सोहबिसे सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०७	१५	दंगाल खोला

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
३,३३४.००	२,८३७.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
२,२२४.००	१,९३२.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
१,६६७.००	१,४६१.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३,३३३.००	२,८७४.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३,३३४.००	२,९८६.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
१,८८६.००	१,७३३.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
२,६४५.००	२,४८८.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
२,७७८.००	२,३६९.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
२,२२८.००	१,९२७.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
२,७७८.००	२,४०१.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३,८३३.००	३,४२७.००	२०८०/०८१	२०८०/०८१				
३३,३५४.००	१२,०९३.००	२०७८/७९	२०८०/०८१	१२२	६२६		
३,०००.००	१,५५२.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,५००.००	१,५७९.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,५००.००	१,२४०.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०००.००	१,०४०.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
१,५००.००	८१७.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
१,५००.००	१,१९९.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०००.००	१,०३८.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
१,५००.००	९०२.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०००.००	१,२३१.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०००.००	८८३.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०००.००		२०८१/८२	२०८१/८२				
१,५००.००	१,०४६.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०००.००	१,०७५.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
१,२८५.००	६४४.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
१,२००.००	९९८.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,५७७.००	२,३६७.००	२०८१/८२	२०८१/८२	३०	२९९		
२,२२५.००	१,९५०.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०६७.००	१,९२७.००	२०८१/८२	२०८१/८२	२३	१५०		
२,५८६.००	२,४०६.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,६०५.००	२,४०३.००	२०८१/८२	२०८१/८२	३५	२५०		

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	मुहान नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र
१३८	सातमुले दहचौर सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०८		दह खोला
१३९	खैरेनी लिफ्ट सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०९	५	माडी खोला
१४०	खैरेनी सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६	५	दंगाल खोला
१४१	लामाचौर लिफ्ट सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०९	९	माडी खोला
१४२	कागपाती खोला उपल्लो कुलो सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०४	२४	कागपाती खोला
१४३	लुप्लुंग लिफ्ट सि.यो.	नौबहिनी गा.पा.-०८		
१४४	घोरखोला किमिचौर सि.यो.	स्वर्गद्वारी न.पा.-०३, प्यूठान	५६	घोर खोला
१४५	कडेनी थापाचौर नाथेबिस्ना सिं.यो.	झिमरुक गा.पा-०७, प्यूठान	८०	गब्दी खोला
१४६	कडेनी थापाचौर नाथेबिस्ना सिं.यो.	झिमरुक गा.पा-०७, प्यूठान		
९	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ**			
१	बेलाकुलो सिँचाइ योजना	राजपुर-०२, दाङ	२२०.००	मररी खोला
२	मनिकापुर सिँचाइ योजना	तुलसीपुर-१८,दाङ	१५०.००	चौवाखोला
३	पश्चिम बाइसे सिँचाइ योजना	शान्तिनगर-२,५,६,७	१३५.००	बौलाहाखोला
४	पुर्वे बाइसे सिँचाइ योजना	दंगिशरण	१०५०.००	बौलाहाखोला
१०	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके**			
१	वानियाभार सिँचाइ योजना	वैजनाथ ४	९५.००	आमसोती/काठकुवा
२	धुमैया सिँचाइ योजना	रासी सोनारी ५	२२२.००	धुमैया
३	झिंगौरा बाँध सिँचाइ योजना	वैजनाथ ८	२५५.००	जेठी नाला/ बुढिया नाला
४	वल्छैया सिँचाइ योजना	रासी सोनारी ५	१३५.००	वल्छैया
५	लालपुर लिफ्ट सिँचाइ योजना	वैजनाथ ६	९८.००	मान खोला
११	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दिया**			
१	कोथर्निया लगनिया सिँचाइ योजना	बाँसगढी २ र ३ बर्दिया	३३० /३००	कुथर्निया नाला
२	राजापुर सिँचाइ योजना	बढैयाताल-७ बर्दिया	१६५ /१५०	मिड्खिया नाला

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सुरु भएको आ.व.	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लाभान्भित		हालको अवस्था	कैफियत
				घरधुरी	जनसङ्ख्या		
२,५००.००	३४५ मि.	२०८१/८२	२०८१/८२				
२,०६७.००	१,२४५.००	२०८१/८२	२०८१/८२	२७	१६०		
१,५६१.००	१,४४४.००	२०८१/८२	२०८१/८२	२५	१४०		
२,०६३.००	१,७२७.००	२०८१/८२	२०८१/८२	३२	२१०		
१,६२४.००	१,४५६.००	२०८१/८२	२०८१/८२	४२	३००		
२,०६५.००	१,६७३.००	२०८१/८२	२०८१/८२				
३४,२४०.००	१४,८७२.००	२०८०/८१	२०८१/८२	१६८	७५३		
४३,५४९.००	२७,०७८.००	२०७७/७८	२०८१/८२	१८४	९२०		
८,२०४.००	७,५४७.००	२०७७/७८	२०७७/७८				
७०७५६.००	४८०५९.००	२०७८/०७९	२०८०.०८१	४००.००	२०००.००		
४९५९०.००	२५०३८.००	२०७८/०७९	२०८०.०८१	१९२.००	११७०.००		
४५४०९.००	४९०८.००	२०७९/०८०	२०८०/०८१	३६०.००	१८००.००		
५४६७४.००	५८६३५.००	२०७८/०७९	२०८०/०८१	१८००.००	९०००.००		
६९६५४.००	२०९३४.००	२०७६/०७७	२०७९/०८०	२४०.००	१२००.००		
४९२९८.००	१९४००.००	२०७६/०७७	२०७८/०७९	२४७.००	१८३४.००		
५४३७७.००	२४९८३.००	२०७६/०७७	२०८०/०८१	३४५.००	२२१७.००		
५८७८६.००	११८६२.००	२०७८/०७९		१७४.००	१८३४.००		
६९४८३.००	२६८८५.००	२०७८/०७९		११००.००	५६००.००		
१७१४१७	११९१००	२०७६/०७७	२०७८/०७९	३२०	१८००		
५६६००	३९४८७	२०७८/०७९	२०८१/०८२	२६५	१५००		

प्रदेश स्थापना पश्चात कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भएका मुख्य नदी/पहिरो नियन्त्रण योजनाहरूको विवरण

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
१	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी**			
१	तुरिया नदी नियन्त्रण	सुनवल,रामग्राम	तुरिया नदी	४९९००
२	झरही नदी नियन्त्रण	सुनवल,रामग्राम,पाल्हिनन्दन	झरही नदी	९९९००
३	भलुही नदी नियन्त्रण	रामग्राम	भलुही नदी	२९९९
४	सोमनाथ खोला नियन्त्रण	सुनवल-३	सोमनाथ खोला	२९९९
५	खजुरा खोला नियन्त्रण	बर्दघाट-७	खजुरा खोला	७४००
२	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची**			
१	बाँगी खोला नियन्त्रण कार्य	सन्धिखर्क नगरपालिका	बाँगी खोला	४००००.००
२	सितखोला नियन्त्रण कार्य	शितगगां नगरपालिका	सितखोला	२८५००.००
३	जरेखोला नियन्त्रण कार्य	सन्धिखर्क नगरपालिका र छत्रदेव गाँउपालिका	जरेखोला	२००००.००
४	दुर्गा खोला नियन्त्रण कार्य	पाँणिनी गाँउपालिका	दुर्गा खोला	२६५००.००
५	लम्ची खोला नियन्त्रण कार्य	भूमिकास्थान नगरपालिका	लम्ची खोला	८५००.००
६	सुपा खोला नियन्त्रण कार्य	शितगगां नगरपालिका	सुपा खोला	८०००.००
७	सौर्य खोला नियन्त्रण कार्य	छत्रदेव गाँउपालिका	सौर्यखोला	१००००.००
८	बाणगंगा नदी नियन्त्रण कार्य	शितगगां नगरपालिका	बाणगंगा	२००००.००
९	घोचेखोला नियन्त्रण कार्य	सन्धिखर्क नगरपालिका	घोचेखोला	१२०००.००
१०	भद्रीखोला नियन्त्रण कार्य	सन्धिखर्क नगरपालिका	भद्री खोला	९०००.००
११	खाकाबेसी खोला नियन्त्रण कार्य	भूमिकास्थान नगरपालिका	खाकाबेसी खोला	१२०००.००
१२	रडसिङ खोला नियन्त्रण कार्य	शितगगां नगरपालिका	रडसिङ खोला	५०००.००
३	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मी**			
१	बडीगार्ड नदि नियन्त्रण कार्य	सत्यवती-०२	बडीगार्ड नदि	७०००.००
२	बडीगार्ड नदि नियन्त्रण कार्य	सत्यवती-०५	बडीगार्ड नदि	१००००.००
३	भलादिफाँट संरक्षण कार्य	सत्यवती-०६	बडीगार्ड नदि	१००००.००
४	भुजुंनगे बगर मजुवा संरक्षण कार्य	चन्द्रकोट-०८	बडीगार्ड नदि	१०५००.००

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्बाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
३९५००	२०७७-७८	५००	१५०	७५०		९ हे	
७७०००	२०७७-७८	१२००	२७०	१५००		१५ हे	
२०२८	२०७९-८०	७२	२०	११०		०.५ हे	
२२१२	२०७९-८०	७५	१५	८०		०.५ हे	
४२९५	२०८१-८२	१०४	२५	१२५		१ हे	
१९०००.००	२०८१।८२	२२५०.००	२८५.००	१२८१.००	२.००	११०.००	
२००००.००	२०८१।८२	२०५०.००	२५०.००	१०४०.००	५.००	१३०.००	
५५००.००	२०८१।८२	५७०.००	६०.००	२८५.००	२.००	१५.००	
१०५००.००	२०८१।८२	६१५.००	८०.००	३४०.००	२.००	२०.००	
२०००.००	२०८१।८२	१५६.००	१०.००	५५.००	१.००	३.००	
५५००.००	२०८१।८२	५४५.००	२२.००	११०.००	४.००	२०.००	
४५००.००	२०८१।८२	४००.००	४२.००	१९५.००	१.००	२०.००	
२०००.००	२०८१।८२	२५०.००	५०.००	२४०.००	२.००	३०.००	
५०००.००	२०८१।८२	४३०.००	५४.००	२५०.००	१.००	२.००	
३५०००.००	२०८१।८२	४५४.००	३५.००	१६०.००	१.००	४.००	
२५००.००	२०८१।८२	२००.००	२०.००	१०५.००	१.००	८.००	
२५००.००	२०८१।८२	१५०.००	४०.००	२१५.००	१.००	१२.००	
८०००.००	२०८०/८१	२४०.००	३०.००	१४०.००		४००.००	
११५००.००	२०८०/८१	२५०.००	६०.००	२८६.००		४५०.००	
१००००.००	२०८०/८१	३००.००			२५०.००		
१०५००.००	२०७८/७९	५००.००	१०५.००	६००.००	३००.००		

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
५	भुवाचिदी बजार" संरक्षण कार्य	मुसिकोट-०६	बडीगार्ड नदि	६०००.००
६	बडीगार्ड नदि नियन्त्रण कार्य	मुसिकोट-०२,०३,०४,०७	बडीगार्ड नदि	२००००.००
७	रिडीखोला तटबन्ध कार्य	छत्रकोट-०४	रिडी खोला	६००.००
८	छाल्दिखोला तटबन्ध कार्य,	गुल्मी	छाल्दिखोला	१००००.००
४	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सव डिभिजन कार्यालय, रुकुमपूर्व**			
१	कुनपानी खोला तटबन्ध योजना	भुमे-८	कुनपानी खोला	३४१४२.००
२	ओखमा पहिरो तथा नदि नियन्त्रण यो.	पुथाउतरगंगा-१३	ओखमा खोला	१४५००.००
३	ठुलाखेत फाँट तथा नदि नियन्त्रण	सिस्ने-७	ठुलो खोला	८६००.००
४	सिस्नेरी पहिरो तथा नदि नियन्त्रण यो.	सिस्ने-७	सानो भेरी	१००९१.००
५	सिमा पहिरो नियन्त्रण योजना	भुमे-३		१२५५०.००
६	धर्मशाला नदि नियन्त्रण योजना	भुमे-७	थावांग खोला	१९५००.००
७	जुगेपानी पहिरो नियन्त्रण योजना	भुमे-७	खावांगखोला	९९९५.००
८	नाथेगाड खोला नियन्त्रण योजना	सिस्ने-७	नाथेगाड	२१९००.००
९	धाउनेबगर नदि तथा पहिरो नियन्त्रण	सिस्ने-५,६	घट्टेखोला र सानोभेरी	१९५००.००
९	मयांगखोला पहिरो नि.यो.	पुथाउतरगंगा-६	मयांगखोला	१६५००.००
१०	घुमलीबाङ्ग नदि नियन्त्रण योजना	पुथाउतरगंगा-१०	घुमलीबांग	१४५००.००
११	सानोभेरी नदि नियन्त्रण तथा बालुवा बस्ती संरक्षण	भुमे-५	लुकुमखोला,सानोभेरी	८८००.००
१२	तितेरखोला खाराचौर धनिबारे पहिरो नियन्त्रण	सिस्ने-३	सनोभेरी	५५००.००
१३	नाखागाड रुघापानी तटबन्ध	पुथाउतरगंगा-१४	नाखागाड	४५००.००
५	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा**			
१	सोमखोला कुरेलीखोला भैसीखुटी तटवन्धन योजना रोल्पा	थवाङ ३, रोल्पा	सेमसार खोला	
२	स्वताघारी, पुत्लाचौर तटवन्धन	परिर्वतन ०५ रोल्पा		
३	आरङखोला नदी नियन्त्रण	रुन्टीगढी ३	आरङखोला	

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्वाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
६०००.००	२०७८/७९	९०.००	५०.००	२०८.००		४५०.००	
२२०००.००	२०८१/८२	१५००.००	६०.००	३३८.००		७००.००	
६००.००	२०८०/८१	५०.००			३०.००	२५.००	
१००००.००	२०८१/८२	३००.००	८०.००	३००.००		४००.००	
८०००.००	०७९/०८०	७००	५.००	३५.००	४.४०	६.५०	
८०२७.००	०७८/०७९	६००	११.००	५६.००	०.८५	३.५०	
७०२२.००	०७८/०७९	८००	१३.००	६७.००	१.९०	७.६०	
८०००	०८१/०८२	१००	७.००	४२.००		४.३०	
१०५३२.०	०७८/०७९	५००	२३.००	१२४.०	०.५०	७.६०	
१६२००.०	०७९/०८०	६००	४८.००	२८६.०	२.५०	८.९०	मर्मत गर्नुपर्ने
९०८४.००	०७९/०८०	४५०	४६.००	२३४.०	१.५०	७.३०	
१७४००.०	०७९/०८०	४५०	११.००	५६.००	१.३०	४.९०	
१६१००.०	०८०/०८१	५५०	१८.००	९१.००	०.९०	३.५०	
१४९७०.०	०७९/०८०	२५०	३४.००	२३०.०		२.५०	बगाएको
१०५००.०	०७९/०८०	४००	१४.००	७६.००	०.६०	५.४०	
७५००.००	०८०/०८१	३७०	२४.००	११६.०	०.५०	२.५०	
३५००	०८०/०८१	२२१	७५.००	३५३.०	१.३५	३.५६	
३५००.००	०८०/०८१	११४	३४.००	१६८.०			
		२३७ मि.					
		८०० मि.					
		२२५ मि.					

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
४	थवाङ खोला नदी नियन्त्रण	थवाङ २	थवाङ खोला	
५	सिवाङ खोला तटबन्धन कार्य	त्रिवेणी २, ७	सिवाङ खोला	
६	म्वाले खोला तटबन्धन कार्य	गंगादेव गा.पा.	म्वाले खोला	
६	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, प्युठान**			
१	झिमरुक नदि नियन्त्रण	गौमुखी र झिमरुक गा.पा.	झिमरुक नदि	८,५००.००
२	गर्तंग खोला नदि नियंत्रण	झिमरुक गा.पा.-०४	गर्तंग खोला	१,३७९.००
३	आहाल खोला (हुंगाद) नदि व्यवस्थापन	झिमरुक गा.पा.-०३	झिमरुक नदि	१,५८१.००
४	लुङ्ग खोला नदि नियन्त्रण	नौबहिनी गा.पा.-०६	लुङ्ग खोला	१,५०३.००
५	खारा खोला नदि नियन्त्रण	गौमुखी गा.पा.-०३	खारा खोला	१,५८०.००
६	मिठी आँप खोला व्यवस्थापन	सरुमरानी गा.पा.-०२	मिठी आँप खोला	१,०५०.००
७	गनाहा खोला नदि नियन्त्रण	सरुमरानी गा.पा.-०२	गनाहा खोला	३,१५७.००
८	लुङ्ग खोला व्यवस्थापन	प्यू.न.पा.-०८	लुङ्ग खोला	२,००८.००
९	जुम्रिखोला बोझेनी सिम	प्यू.न.पा.-०४	जुम्रिखोला	४८३.००
१०	जुम्रिखोला ढुंगेठाटी नियन्त्रण कार्य	प्यू.न.पा.-०५	जुम्रिखोला	५२५.००
११	सिसौ पाखा जुम्री खोला	प्यू.न.पा.-०३	जुम्रिखोला	४८३.००
१२	जुम्री खोला सिसौ पाखा	प्यू.न.पा.-०३	जुम्रिखोला	५००.००
१३	सिर्से खोला नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०२	चिती खोला	४८३.००
१४	सिसौ पाखा जुम्री खोला	प्यू.न.पा.-०३	जुम्रिखोला	४८३.००
१५	जुम्री खोला नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०४	जुम्रिखोला	५००.००
१६	जुम्री खोला बोझेनी सिम	प्यू.न.पा.-०४	जुम्रिखोला	४८३.००
१७	लामासेरा साठीमुरे झिमरुक नदि व्यवस्थापन	झिमरुक-०३	झिमरुक नदि	७,१९९.००
१८	झिमरुक नदि नियन्त्रण	झिमरुक-०६, बरबांग मरूवा छातीपाटा कुटीचौर	झिमरुक नदि	५,१९०.००
१९	झिम्रुक खोला नियन्त्रण कार्य	प्युठान नगरपालिका ०७,०८,०९ र १० (टिकुरी बसपार्क बाट उत्तर), प्युठान	झिमरुक नदि	२५,५००.००

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्बाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
		२७० मि.					
		४३५ मि.					
		१३५ मि.					
६,९००.००	२०७५/७६	२१५	७	३२	०.८	३	
१,१६१.००	२०७५/७६	२२९	१	४	०.२	०.८	
१,३२३.००	२०७५/७६	१४५	१	५	०.३	०.७	
१,३४६.००	२०७५/७६	१५	२	७	०.४	०.८	
१,४२०.००	२०७५/७६	७५	२	८	०.३	१.२	
९४५.००	२०७५/७६	७८	३	१३	०.१	०.५	
२,८४०.००	२०७५/७६	१८३	४	१८	०.४	३	
२,१३०.००	२०७५/७६	१५०	२	१३	०.३	२.५	
४४९.००	२०७६/७७	१८	२	१५	०.२	०.६	
४८८.००	२०७६/७७	६०	७	३२	०.३	१.०	
४५२.००	२०७६/७७	२२	४	२०	०.२	०.८	
४६५.००	२०७६/७७	२५	३	१८	०.३	०.९	
४५३.००	२०७६/७७	२४	७	३५	०.२	०.७	
४४७.००	२०७६/७७	२६	६	२३	०.३	०.७	
४७०.००	२०७६/७७	४७	३	१३	०.३	०.९	
४५१.००	२०७६/७७	२८	६	२५	०.२	०.७	
६,९०६.००	२०७६/७७	१२०	९	४०	०.७	४.०	
४,९८९.००	२०७६/७७	११५	१३	५२	०.८	५.०	
२४,०१२.००	२०७६/७७	४९५	४५	२२५	१.४	१४.०	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
२०	झिम्रुक खोला नियन्त्रण कार्य	प्युठान नगरपालिका ०७,१० र ०४ (सत्तरीफांट र जुम्रि झिम्रुक दोभानको बिच भाग), प्युठान	झिमरुक नदि	२८,७००.००
२१	झिम्रुक खोला नियन्त्रण कार्य,	गौमुखि गांउपालिका ०३ र ०७, मैनाबगर, रामफेदि र कैराफेदि	झिमरुक नदि	५,०००.००
२२	झिम्रुक खोला नियन्त्रण कार्य,	झिम्रुक गांउपालिका ०३, साठिमुरे र लामासेराफांट	झिमरुक नदि	७,२००.००
२३	झिम्रुक खोला नियन्त्रण कार्य,	झिम्रुक गांउपालिका ०८, रामफेदी र बालुवाफांट	झिमरुक नदि	५,४००.००
२४	झिम्रुक खोला नियन्त्रण कार्य,	झिम्रुक गांउपालिका ०७ र ०५, पिडाल्नेफांट र मछिथान	झिमरुक नदि	५,२००.००
२५	झिम्रुक खोला नियन्त्रण कार्य,	प्युठान नगरपालिका ०१,०२ र ऐरावति गांउपालिका (जुम्रि झिम्रुक दोभानको दक्षिण भाग), प्युठान	झिमरुक नदि	२८,८००.००
२६	झिमरुक न.नि.	ऐरावती गा.पा.-०१	झिमरुक नदि	२,०७८.००
२७	झिमरुक न.नि.	प्यू.न.पा.-०२	झिमरुक नदि	६,८३२.००
२८	झिमरुक नदी नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ६ प्यूठान	झिमरुक नदि	३,०८७.००
२९	जुम्री खोला नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०२ र ०४	जुम्री खोला	५,३४०.००
३०	लुङ्ग खोला नियन्त्रण कार्य	प्यू.न.पा.-०८ र नौबहिनी गा.पा.-०६ र ०८	लुंग खोला	५,२५८.००
३१	झिमरुक नदी नियन्त्रण कार्य	प्यू.न.पा.-०८	झिमरुक नदी	६,३०१.००
३२	झिमरुक नदी नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ६ प्यूठान	झिमरुक नदी	४,२०६.००
३३	लुङ्गखोला नदि नियन्त्रण	नौबहिनी गा.पा.-६ र ०४	लुंग खोला	७,३५०.००
३४	आहलखोला नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ३ प्यूठान	आहलखोला	५,७७३.००
३५	चित्ती खोला नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०२	चित्ती खोला	४,१९८.००
३६	ठाडो खोला नदि नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा-०५	ठाडो खोला	१,५७५.००
३७	झिमरुक नदी नियन्त्रण	प्यू.न.पा-०८, खाप्रिंग खोला	झिमरुक नदि	२,२०९.००
३८	गर्तंग खोला नदि नियंत्रण	झिमरुक गा.पा-०४ र ०५	झिमरुक नदि	३,६८६.००
३९	लुङ्ग खोला नियन्त्रण		लुंग खोला	१२,०००.००
४०	झिमरुक नदी नियन्त्रण	एरावती गा पा ५ प्यूठान	झिमरुक नदि	५,०००.००

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्वाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
२६,८७२.००	२०७६/०७७	३४२	४६	२३०	१.२	१६.०	
४,७९६.००	२०७६/०७७	१५४	५	१५	०.६	७.०	
६,९००.००	२०७६/०७७	२०२	७	२५	०.४	५.०	
२,५५१.००	२०७६/०७७	१३५	२	१०	०.५	७.०	
४,९६१.००	२०७६/०७७	१५९	६	३५	०.३	८.०	
२३,८००.००	२०७७/०७८	५६१	२२	११६	१.२	३०.०	
१,९१८.००	२०७७/०७८	३१२	२	११	०.३	१.५	
५,७७४.००	२०७७/०७८	१३२	५	२२	०.७	३.५	
२,८१२.००	२०७८/७९	७५	२	८	०.९	७.०	
४,९१५.००	२०७८/७९	२७३	६	२०	१.२	७.०	
४,८००.००	२०७८/७९	१५३	४	१८	०.८	६.५	
५,७६०.००	२०७८/७९	१५६	८	३०	०.९	९.०	
३,८४०.००	२०७८/७९	१४४	१	३	०.५	३.५	
६,७२०.००	२०७८/७९	२२५	५	२२	१.१	१०.०	
५,२८०.००	२०७८/७९	६४२	२	७	०.३	६.०	
३,८४०.००	२०७८/७९	६७०	८	३०	०.७	५.०	
१,४४०.००	२०७८/७९	५७	१	५	०.२	३.०	
१,९५९.००	२०७८/७९	४२	१	४	०.३	४.०	
३,२६२.००	२०७८/७९	२१५	८	३०	०.८	१२.०	
९,४००.००	२०७८/०७९	४६८	३	१३	०.४	८.०	
४,८००.००	२०७८/०७९	१४१	४	१५	०.३	६.०	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
४१	झिमरुक नदी नियन्त्रण खप्रगखोला र झिमरुक नदी सगम	प्यूठान न पा ८ प्यूठान	झिमरुक नदि	९,०००.००
४२	दंगाल खोला नदि नियन्त्रण	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६	दंगाल खोला	२,५७८.००
४३	दंगाल खोला नदि नियन्त्रण	स्वर्गद्वारी न.पा.-०७ र ०८	दंगाल खोला	२,५८०.००
४४	चिती खोला नदि नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन	प्यू.न.पा.-०२	चिती खोला	४,२३२.००
४५	चिती खोला नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०२	चिती खोला	२,५७७.००
४६	झिमरुक नदि नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा.-०७, स्याउलीघारी	झिमरुक नदि	७,८६९.००
४७	झिमरुक नदि नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा-०७ र ०८, खाले ओडार	झिमरुक नदि	७,८७०.००
४८	झिमरुक नदि नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा.-०५, धारालम्ची	झिमरुक नदि	७,८७०.००
४९	झिमरुक नदि नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा.-०७, पिडालनेफाँट र मच्छीफाँट	झिमरुक नदि	७,८७५.००
५०	गब्दी खोला नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा.-०८	गब्दी खोला	२,०७८.००
५१	झिमरुक नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०७, टिकुरी बसपार्क	झिमरुक नदि	२,५७९.००
५२	आहलखोला नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ३ प्यूठान	झिमरुक नदि	५,६४०.००
५३	आहलखोला नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ३ प्यूठान	झिमरुक नदि	२,५७८.००
५४	सुरुले फाँट नदि नियन्त्रण	ऐरावती गा.पा.-०५	झिमरुक नदि	२,०६२.००
५५	झिमरुक नदि नियन्त्रण	गौमुखी गा.पा.-०७, कोइराफेदी फाँट	झिमरुक नदि	२,०६४.००
५६	झिमरुक नदि नियन्त्रण	ऐरावती गा.पा.-०१	झिमरुक नदि	२,५७७.००
५७	जुम्री खोला नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०२ र ०४	झिमरुक नदि	२,५७७.००
५८	झिमरुक नदि नियन्त्रण लामासेराफाँट	झिमरुक गा.पा.-०३	झिमरुक नदि	५,२५०.००
५९	लामासेराफाँट झिमरुक नदि व्यवस्थापन	झिमरुक गा.पा.-०३	झिमरुक नदि	२,०६२.००
६०	अरङ्ग खोला नदि नियन्त्रण	माण्डवी गा.पा.-०१ र ०५	अरङ्ग खोला	२,४७४.००
६१	झिमरुक नदि नियन्त्रण वालुवाफाँट	झिमरुक गा.पा.-०७ र ०८	झिमरुक नदि	१,५४७.००
६२	कोरले खोला बल्ले खोला नदि नियन्त्रण	नौबहिनी गा.पा.	बल्दे खोला	१,५४६.००

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्बाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
८,३००.००	२०७८/०७९	२३६	३	१४	०.३	६.०	
२,४१०.००	२०७९/८०	४५०			०.७	५.०	
२,४०५.००	२०७९/८०	४२०	१	५	०.४	४.५	
३,८४०.००	२०७९/८०	१९५	६	२२	०.५	६.०	
२,४०९.००	२०७९/८०	१२०	३	१६	०.४	५.०	
७,०३२.००	२०७९/८०	१८९	७	४०	३.०	१२.०	
७,२००.००	२०७९/८०	२१०	१	३	०.४	७.०	
६,१००.००	२०७९/८०	२१२	८	४०	२.८	७.०	
५,६००.००	२०७९/८०	१८०	८	४५	०.८	९.०	
१,९२०.००	२०७९/८०	१४५	२	८	०.३	४.०	
२,४०२.००	२०७९/८०	५७	५	२५	०.६	७.०	
५,२८०.००	२०७९/८०	३२०	५	२२	०.३	७.०	
२,४०१.००	२०७९/८०	३५०	४	१८	०.२	५.०	
१,९१०.००	२०७९/८०	५४	२	८	०.३	६.०	
१,९१४.००	२०७९/८०	६०	१	४	०.२	५.०	
२,४०१.००	२०७९/८०	११७	२	१०	०.२	६.०	
२,४०२.००	२०७९/८०	५७	५	२५	०.४	६.०	
४,७९५.००	२०७९/८०	१४०	२	७	०.६	९.०	
१,९२२.००	२०७९/८०	८५	२	१०	०.२	३.०	
२,३४०.००	२०७९/८०	१२७	५	२४	०.८	६.०	
१,४४०.००	२०७९/८०	४२			०.३	१२.०	
१,४३९.००	२०७९/८०	९५	४	१४	०.४	६.०	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
६३	झिमरुक नदि नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा.-०६, बरबांग मरूवा छातीपाटा	झिमरुक नदि	५,१५६.००
६४	देउराली बात्से ओधार्ने तटबन्ध	प्यू.न.पा.-०९ र १०	झिमरुक नदि	२,०८१.००
६५	झिमरुक नदि नियन्त्रण भौका	झिमरुक गा.पा.-०८	झिमरुक नदि	५,१५५.००
६६	झिमरुक नदि नियन्त्रण बिग्रीघाट सांगुटा	प्यू.न.पा.-०९	झिमरुक नदि	५,१५५.००
६७	झिमरुक नदि नियन्त्रण कोलछापा फुलबारी	प्यू.न.पा.-०९	झिमरुक नदि	५,१५५.००
६८	लुङ्ग खोला नदि नियन्त्रण	नौबहिनी गा.पा.-०४ र ०६	लुङ्ग खोला	७,२१२.००
६९	आहलखोला नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ३ प्यूठान	आहलखोला	८,०००.००
७०	झिमरुक नदी नियन्त्रण	प्यूठान न पा ९ साङ्गुट्टा बिक्रिघाट	झिमरुक नदि	५,०००.००
७१	झिमरुक नदी नियन्त्रण	प्यूठान न पा ९ कोलछाप फुलबारी	झिमरुक नदि	५,०००.००
७२	झिमरुक नदी नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ६ प्यूठान	झिमरुक नदि	१२,०००.००
७३	झिमरुक नदी नियन्त्रण	झिमरुक गा पा ८ प्यूठान	झिमरुक नदि	५,०००.००
७४	झिमरुक नदी नियन्त्रण कार्य, पाँचमुरे	प्यू.न.पा., मल्लरानी गा.पा.-०४	झिमरुक नदि	८,५००.००
७५	झिमरुक नदी नियन्त्रण बारदुला देखि बिजुवार पक्कि पुल सम्म	प्यू.न.पा.	झिमरुक नदि	१९,०००.००
७६	घुईवाङ्गफाँट नदि नियन्त्रण	ऐरावती गा.पा.-०५	झिमरुक नदि	१,५५१.००
७७	हर्नाघाट, झिवांग जाडी, खवाङ र बरौला नदि नियन्त्रण	ऐरावती गा.पा.-०२, ०४ र ०५	झिमरुक नदि	३,११८.००
७८	ऐरावती चुनाहा क्षेत्र नदि नियन्त्रण	ऐरावती गा.पा.-०५	झिमरुक नदि	३,०९३.००
७९	बालुवा खोला नदि नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा.-०१	बालुवा खोला	२,६०२.००
८०	दंगाल खोला नदि नियन्त्रण	स्वर्गद्वारी न.पा.-०६	दंगाल खोला	१,७४३.००
८१	कुमलटार देखि आपचौर मुकचौर सम्म अरङ्ग खोला तटबन्ध	माण्डवी गा.पा.-०१ र ०५	अरङ्ग खोला	२,८६०.००
८२	सिम्ले खोला नदि नियन्त्रण	सरुमरानी गा.पा.-०१	सिम्ले खोला	३,०९४.००
८३	झिमरुक नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०७	झिमरुक नदि	१,५६२.००
८४	दर्भान बस्ति संरक्षण	सरुमरानी गा.पा.-०२	सुका खोला	२,०६३.००

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्बाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
४,९९५.००	२०७९/८०	१४५	७	३५	०.९	१५.०	
१,६७३.००	२०७९/८०	४८			०.२	५.०	
४,४८१.००	२०७९/८०	१४५	१	६	०.६	७.०	
४,८११.००	२०७९/८०	१४५	२	१२	०.२	६.०	
४,८१६.००	२०७९/८०	१५६	२	१२	०.५	७.०	
६,७२०.००	२०७९/८०	२७०	१२	६०	१.२	१४.०	
७,४१०.००	२०७९/०८०	६२१	२	११	०.३	७.०	
४,६५५.००	२०७९/०८०	१८३	१	४	०.३	५.०	
४,६६३.००	२०७९/०८०	१५३	१	४	०.२	३.०	
४,७१०.००	२०७९/०८०	३५२	१	५	०.८	१२.०	
४,७१०.००	२०७९/०८०	१३२	२	१२	०.४	९.०	
४,१५२.००	२०८०/८१	११६	५	२५	२.०	९.०	
९,५९७.००	२०८०/८१	४४६	४	२०	१.५	१५.०	
१,४३५.००	२०८०/८१	४५			०.४	३.०	
२,८८४.००	२०८०/८१	१२५	६	३०	०.८	७.०	
२,९५५.००	२०८०/८१	७०	२	१२	०.६	३.०	
२,३९५.००	२०८०/८१	१२०	३	१२	०.५	२.५	
१,५५०.००	२०८०/८१	८५	२	१२	०.३	२.०	
२,७१८.००	२०८०/८१	१३०	४	१८	०.४	२.५	
२,८४५.००	२०८०/८१	१३५	२	१०	०.२	२.०	
१,४४०.००	२०८०/८१	४५	१	५	०.३	१.५	
१,९२०.००	२०८०/८१	७२	८	४०	०.२	१.५	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
८५	भुसवाङ्ग खोला नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.०९ र १०	भुसवाङ्ग खोला	१,७५३.००
८६	झिमरुक नदि नियन्त्रण खैरा	प्यू.न.पा.-०१, खैरा	झिमरुक नदि	१,५४४.००
८७	लुङ्ग खोला नदि नियन्त्रण	नौबहिनी गा.पा.-०६	लुङ्ग खोला	३,०९९.००
८८	झिमरुक नदि नियन्त्रण	प्यू.न.पा.-०९	झिमरुक नदि	३,०९८.००
८९	झिमरुक नदि नियन्त्रण खैरा	प्यू.न.पा.-०१, खैरा	झिमरुक नदि	२,०००.००
९०	कुरिल्लाचौर खेलकुद मैदान संरक्षण	गौमुखी न.पा.-०२	झिमरुक नदि	२,०००.००
९१	अरङ्ग खोला पक्कि पुल मुनि बस्ति तथा फाँट संरक्षण	माण्डवी गा.पा.-०१ र ०३	अरङ्ग खोला	१,५००.००
९२	बल्दे खोला नदि नियन्त्रण	नौबहिनी गा.पा.-०७ र ०८	बल्दे खोला	१,५००.००
९३	सरङ्ग बेसी कालोढिक नदि नियन्त्रण	ऐरावती गा.पा.-०५	झिमरुक नदि	१,५००.००
९४	भुसवाङ्ग खोला तटबन्धन	प्यू.न.पा.-१०	भुसवाङ्ग खोला	१,५००.००
९५	अरङ्गखोला नियन्त्रण	माण्डवी गा.पा.-०१-०५, प्यूठान	अरङ्गखोला	७,५००.००
९६	झिमरुक नदि ढुंगे पुलमा तटबन्ध	प्यूठान न.पा.-०७, प्यूठान	झिमरुक नदि	३,०००.००
९७	गर्तङ खोला बालुवाखोला नियन्त्रण	झिमरुक गा.पा.-१,४,५, प्यूठान	गर्तङ खोला, बालुवाखोला	५,०००.००
९८	झिमरुक नदि तटबन्ध	प्यूठान न.पा.-०२, प्यूठान	झिमरुक नदि	४,०००.००
९९	छमखुट्टा गरुले अरङ्गखोला तटबन्ध	माण्डवी गा.पा.-०४, प्यूठान	अरङ्गखोला	३,५००.००
१००	झिमरुक नदि नियन्त्रण	प्यूठान	झिमरुक नदि	२,५००.००
१०१	फलीङपाखा मसुरेखोला तटबन्ध	माण्डवी गा.पा.-०४, प्यूठान	मसुरेखोला	३,५००.००
७	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ**			
१	पातुखोला नदी नियन्त्रण	तुलसीपुर-०५,०९	पातुखोला	५१३४३.००
२	ग्वारखोला नदी नियन्त्रण	तुलसीपुर-१२,१५	ग्वारखोला	६६५९५.००
३	बबई नदी नियन्त्रण	तुलसीपुर-१२,१३	बबइ नदी	४०३२३.००
८	**जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके**			
१	मानखोला नदी नियन्त्रण कार्य	खजुरा २ गौघाट	मान	
२	मानखोला नदी नियन्त्रण कार्य	खजुरा ६ शान्तिनगर	मान	

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्बाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
१,६९६.००	२०८०/८१	११२	१२	५०	०.४	१.८	
१,४२०.००	२०८०/८१	३५			०.३	१.२	
२,३००.००	२०८०/८१	५६	१	४	०.२	१.०	
२,८५५.००	२०८०/८१	८५			०.२	४.०	
१,१२४.००	२०८१/८२	३९			०.३	२.०	
१,२५२.००	२०८१/८२	७२			०.६	१.५	
९२७.००	२०८१/८२	७७	४	२०	०.२	१.०	
८३२.००	२०८१/८२	५७	४	२४	०.५	२.५	
८०५.००	२०८१/८२	३६	२	८	०.२	२.५	
७६९.००	२०८१/८२	७०	५	२०	०.२	२.०	
३७२५	२०८१/८२	२०८	६	३०	१	८	
१,५०५.००	२०८१/८२	५७	२	१०	०.३	३.०	
२,५७५.००	२०८१/८२	१६३	३	११	०.५	६.०	
२,६८२.००	२०८१/८२	८०			०.२	४.०	
१,९९२.००	२०८१/८२	११९	५	३०	१.१	५.०	
१,३७५.००	२०८१/८२	४८			०.२	३.०	
१,९९२.००	२०८१/८२	११६	१	२	०.३	४.०	
४०१३८.००	२०८१/०८२	५१४.००	५००	१५३०	०.००	१०.००	कार्य गरिरहेको
४३९६०.००	२०८१/०८२	१८५६.००	७५.००	४००.००	२०	४०	कार्य गरिरहेको
२७९४६.००	२०८१/०८२	७५४.००	६०.००	३२५.००	०.००	५०.००	कार्य गरिरहेको
		३६.००			२.००	६.००	
		४०.००			२.००	६.००	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	नदी/खोलाको नाम र जलग्रहण क्षेत्र	सुरु लागत अनुमान (हजारमा)
३	बबइ खोला तटबन्ध	रामसिसोनारी -१	बबई	५००.००
४	गौरी खोला तटबन्ध	रामसिसोनारी -२	गौरी	५००.००
५	मोरङ्गा खोला तटबन्ध	रामसिसोनारी -३	मोरंगा	२०००.००
६	परुवा खोला तटबन्ध	रामसिसोनारी -८	परुवा	१०००.००
७	डुडुवा खोला तटबन्ध	डुडुवा -२ , वेतहनी	डुडुवा	१५००.००
८	डुडुवा खोला तटबन्ध	नेपालगन्ज -१३	डुडुवा	५००.००
९	मानखोला खोला तटबन्ध	नेउलेडाँडा खजुरा -१	मान	१०००.००
१०	मानखोला खोला तटबन्ध	पुरैना खजुरा -६	मान	५००.००
११	मानखोला खोला तटबन्ध	सिमलघारी खजुरा -७	मान	१०००.००
१२	करेली नदि नियन्त्रण	बैजनाथ १ बाँके	करेली	६५,००
१३	मोरंगा नदि नियन्त्रण	रामसिसोनारी ३,४ बाँके	मोरंगा	७५,००
१४	मानखोला खोला तटबन्ध	रामपुर, बैजनाथ-२,बाँके	मान	२९००.००
१५	मानखोला खोला तटबन्ध	नेउलेडाँडा खजुरा -१	मान	२०००.००
१६	मानखोला खोला तटबन्ध	बर्मेलीटोल, खजुरा-२, बाँके	मान	२०००.००
१७	मानखोला खोला तटबन्ध	गौघाट, खजुरा-२,बाँके	मान	२०००.००
१८	डुडुवा खोला तटबन्ध	कोहलपुर-१०, बाँके	डुडुवा	७५००.००
१९	परुवा खोला तटबन्ध	रामसिसोनारी-२, बाँके	परुवा	५०००.००

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको आ.व.	लम्बाइ (मिटरमा)	लाभान्भित				हालको अवस्था
			घरधुरी	जनसङ्ख्या	उकास भएको जमिन	सुरक्षित भएको जमिन	
४७९.००	२०७७/०७८	२७.००					
४७७.००	२०७७/०७८	३०.००					
१९१८.००	२०७७/०७८	९१.५०					
९०९.००	२०७७/०७८	५१.००					
१४३९.००	२०७७/०७८	५८.००					
४७४.००	२०७७/०७८	१८.००					
९५६.००	२०७७/०७८	२७.००					
४७३.००	२०७७/०७८	१०.००					
९५८.००	२०७७/०७८	३९.००					
४७६९.९८	२०७७/०७८	८०.००					
४५९२.०५	२०७८/०७९	१२०.००					
१९०३.००	२०८१/०८२	५४.००	२५.००	१३०.००	३.००	१०.००	
१६१२.००	२०८१/०८२	३६.००	१५.००	७५.००	१.५०	४.००	
१४६६.००	२०८१/०८२	४५.००			५.००	६.००	
१५२०.००	२०८१/०८२	४५.००			३.००	५.००	
६०६९.००	२०८१/०८२	१८०.००	१०.००	५२.००	८.००	१०.००	
३६७४.००	२०८१/०८२	२००.००	१२.००	६०.००	५.००	७.००	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

प्रदेश स्थापना पश्चात कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भएका मुख्य सिंचाइ योजनाहरुको विवरण

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
१	**भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ**			
१	अस्परी सगरैया डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा.-९, दाङ	३०.००	१३.००
२	सिंगे डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	रासी गा.पा., दाङ	३०.००	१८.००
३	मायादेवी-६ डुमरा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	मायादेवी गा.पा.-६, कपिलवस्तु	४०.००	१४.००
४	भैसाप्रथा लामाटोलमा डिप ट्यूवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा.-५, दाङ	२५.००	१८.००
५	भैसाकुर्मा डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली	घोराही उ.म.न.पा.-३, दाङ	२५.००	१५.००
६	तदर्थ डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली, घोराही, दाङ	घोराही उ.म.न.पा.-४, दाङ	२५.००	१५.००
७	कटुकी डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा.-८, दाङ		
८	श्री गणेश डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	दंगीशरण गा.पा.-६, दाङ	३०.००	१५.००
९	सरुवाडाडा गोल्टाकुरी डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	दंगीशरण गा.पा.-२, दाङ	१५.००	६.००
१०	कुइरेपानी डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	घोराही उ.म.न.पा.-३, दाङ	२५.००	१२.००
११	जुँगाटोल डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	बाणगंगा न.पा.-४, कपिलवस्तु	३०.००	२२.००
१२	बेलरी डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	घोराही उ.म.न.पा.-७, दाङ	३०.००	२६.००
१३	रावत गाउँ डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१६, दाङ	३०.००	१४.००
१४	अम्बापुर डिप बोरिङ सिँचाई आयोजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१३, दाङ	२५.००	८.५०
१५	जनकपुर डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	बुद्धभूमि न.पा.-१० कपिलवस्तु	३०.००	८.५०
१६	धम्कापुर डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	तुल्सीपुर उ.म.न.पा.-१४, दाङ	३०.००	१६.००
१७	जदारागाउँ डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	घोराही उ.म.न.पा.-६, दाङ	३०.००	१८.००
१८	शिवपुर शिवनगर डिप ट्युवेल सिँचाइ आयोजना	घोराही उ.म.न.पा.-११, दाङ	२०.००	१२.००
१९	बेला डिप ट्युवेल सिँचाइ आयोजना	राजपुर गा.पा.२, बेला दाङ	३०.००	२०.००
२०	कचिला डबरा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा., दाङ	२६.००	१८.००
२१	शिमतार तथा चखौरा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	दंगीशरण गा.पा., दाङ	३०.००	१०.००
२२	पर्सा डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा.-७, दाङ	२६.००	१६.००
२३	पदमपुर डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	दंगीशरण गा.पा., दाङ	३०.००	१८.००
२४	हेकुली—८ डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	दंगीशरण गा.पा., दाङ	३०.००	२२.००
२५	डाडा तिल्वारी डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	शान्तिनगर गा.पा., दाङ	२६.००	२०.००
२६	गोलटाकुरी रहरपुर डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	दंगीशरण गा.पा.-१, दाङ	२५.००	१५.००

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
१२२५९.०१	६५५४.३१	थप प्रणाली बाँकि	१२२	१२	१७११	१०.००	
९५००.००	७५००.००	०८१/८२	९१	१८	१५००	१५	
१३३२३.७३	६७४३.५४	०८१/८२	१५५	१५	१४२०	१०	
१३५८०.१४	४६२४.९४	थप प्रणाली बाँकि	१११	१५	१०१०	१०	
९५००.००	५५००.००	थप प्रणाली बाँकि	१००	२१	६३५	१०	
९५००.००	५५००.००	०८१/८२			५३०	१०	
					१०८०	१५	
२१३१२.१५	६९०८.७१	थप प्रणाली बाँकि	१२७	१८	१५००	१०	
१०६९१.३४		थप प्रणाली बाँकि	१२९	१८	३५०	५	
१३५६८.९६	८०००.००	थप प्रणाली बाँकि	१११	१५	३४४	१५	
२०००.००	८५००.००	थप प्रणाली बाँकि	११२	१५	१६००	१०	
		थप प्रणाली बाँकि	१२८	२१	१०००	१५	
१२४८४.६२	७१००.००	०८१/८२	१३३	१८	१६०४	१०	
		थप प्रणाली बाँकि	८८	९	२३१	७.५	
		थप प्रणाली बाँकि	१७६	११		५.	
१४०६६.७३		०८०/८१	१२१	१८	१५००	१५	
		०८०/८१	८९	१५	१६३०	१५	
		०७९/८०	१०४	१५		१०	
		०७९/८०	१११	१८	१३००	१५	
		०७९/८०	१२८	१८	१२००	१५	
९७००	७६००	०७९/८०	१२३	२१	१०००	१०	
		०७९/८०	९०	१५	१३००	१०	
		०७९/८०	९६	१८	१२००	१२.५	
		०८०/८१	९७	२१	१४००	१२.५	
		०७८/७९	११८	२४	७००	१५	
		०७६/७७	१२३	२१	१०००	१२.५	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
२७	भोजपुर डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१४, दाङ	३०.००	२०.००
२८	शुभलक्ष्मी टोल डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा-६, दाङ	३०.००	१४.००
२९	रनियारपूर मजघटूवा डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१३, दाङ	२५.००	१०.००
३०	शिवराज सडवा गाउँ डिप ट्युववेल सिँ.यो.	शिवराज न.पा., कपिलवस्तु	३०	१४
३१	पश्चिम जिनुवा तल्लो भटवा डिप ट्युबवेल सिँ.यो.	बाणगंगा न.पा.-९, कपिलवस्तु	३०.००	१८.००
३२	रामनगर कृषक डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना,	कृष्णनगर न. पा-११, कपिलवस्तु	३०.००	१८.००
३३	मधुवन कृषक डिप ट्युबवेल सिँ.यो.	बिजयनगर न.पा.-७, कपिलवस्तु	३०.००	१७.५०
३४	गौतमबुद्ध डिप ट्युबवेल सिं यो	बिजयनगर न.पा., कपिलवस्तु		
३५	कजहवा डिप ट्युबवेल सिं यो	महाराजगञ्ज न.पा., कपिलवस्तु	३०.००	१४.००
३६	पन्दनपुर डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१४, दाङ	३०.००	२०.००
३७	सगरमाथा खिलतपुर डिप ट्यूववेल सिँ.यो.	बबई गा.पा., दाङ	२५.००	१०.००
३८	हरियाली पुरुसोत्तमपुर डवरा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	कृष्णनगर न.पा., कपिलवस्तु	३०.००	१५.००
३९	बिसनपुर डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	शिवराज न.पा., कपिलवस्तु	२५.००	१८.००
४०	देउपुर डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	बुद्धभूमि कपिलवस्तु	३०.००	१५.००
४१	माझटोल डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजना	गढवा गा.पा.-६, दाङ	२६.००	
४२	पहलुवा डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा., दाङ	२५.००	१५.००
४३	खुरहुरिया डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१५, दाङ	३०.००	१३.००
४४	पहेलपार डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा., दाङ	३०.००	१६.५०
४५	देवीपुर धनौरी डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	शान्तिनगर गा.पा.-६, दाङ	३०.००	१८.००
४६	सिद्ध डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना श्रीगाउ दाङ	शान्तिनगर गा.पा., दाङ		
४७	कुमलगढ़ी डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-२, दाङ	२५.००	१०.००
४८	हरिहरपुर डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना	बाणगंगा न.पा.-४, कपिलवस्तु	३०.००	१७.५०
४९	गिदनिया डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा., दाङ	२५.००	१२.००
५०	खिलतपुर डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना दाङ	बबई गा.पा.-२, दाङ	२५.००	११.००
५१	जनकपुर र देबपुरा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	बुद्धभूमि ना.पा.-१०, कपिलवस्तु	३०.००	१५.००
५२	डुम्रिगाउँ डुरुवा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१५, दाङ	३०.००	१०.००
५३	कटकुइया डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	बबई गा.पा.-७, पंचकुले दाङ	१५.००	१५.००

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
		०७९/८०	१२३	२१	१३००	१५	
		०७९/८०	१०९	१८	१४००	१५	
९७००	७६००	०८०/८१	८०	१८	११६४	१०	
		०७९/८०	१२७	१५	८००	१०	
		०८०/८१	११७	१४	१४	१६	
		०८०/८१	१४०	१२	१५००	१०	
		०८०/८१	१३६	१२	१५००	१५	
		०७८/७९	१२२	२१	८००	१०	
		०८०/८१	८१	१५	१२००	१५	
		०८०/८१	९२	१८	१०००	१०	
		०७८/७९	९३	१८	८००	१०	
		०८०/८१	९६	९	१२००	१२.५	
		०८०/८१			१३००	१०	
		०८०/८१			१२००	७.५	
		०७९/८०	११६	२१		१५	
		०७९/८०	८७	२१	१७००	१०	
		०८०/८१	१०४	१५	१२००	१५	
		०८०/८१	१२१	२१	१८००	१२.५	
					८००	१२.५	
		०८०/८१	१०५	२४	१२००	१५	
		०७९/८०	१२६	१६	१५३०	१०	
१०५१७.०		०७९/८०	५२	९	१३००	१०	
		०८०/८१	८५	१८	१२००	१०	
		०८०/८१	१६३	९	१२००	१०	
		०८०/८१	८३	१५	१८००	१०	
		०७९/८०	९५	१५	९००	१२.५	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
५४	मठेउरे डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	बबई गा.पा.-७, पंचकुले दाङ	२५.००	१६.००
५५	शिवपुर डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	शिवपुर न.पा., कपिलवस्तु	२०.००	१२.००
५६	बुधौरा (माथिल्लो) डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	घोराही उ.म.न.पा., दाङ	३०.००	१०.००
५७	राइखाल्यान डिप ट्युबवेल सिंचाई	तुलसीपुर उ.म.न.पा., दाङ	२६.००	१८.००
५८	खैरेनी गब्दहवा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१५, दाङ	३०.००	१४.००
५९	बुधौरा (तल्लो) डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	घोराही उ.म.न.पा., दाङ	३०.००	१८.००
६०	हस्नापुर डिप ट्युबवेल सिंचाई उपायोजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-११, दाङ	२५.००	१६.००
६१	डुरुवा १ पीपरी डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१५, दाङ	३०.००	१०.००
६२	प्रसौड़ा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	दंगीशरण गा.पा.-६, दाङ	२०.००	१६.००
६३	गैरातिल्वारी डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	शान्तिनगर गा.पा.-६, दाङ	३०.००	२१.००
६४	खैरेनी धनौरी डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	शान्तिनगर गा.पा.-७, दाङ	३०.००	२०.००
६५	देउपुर डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	लमही न.पा.-६, दाङ	३०.००	२२.००
६६	झिग्नी डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	घोराही उ.म.न.पा.-३, दाङ	२८.००	१९.००
६७	मठेउरा डिप ट्युबवेल सिंचाई उपायोजना	बबई गा.पा.७, पंचकुले दाङ	२८.००	१५.००
६८	रुद्रपुर (बिलरहवा) डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	शिवराज न.पा., कपिलवस्तु	२६.००	१८.००
६९	राउतारा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	बबई गा.पा.७, पंचकुले दाङ	१५.००	२०.००
७०	जखेरा ताल डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	लमही न.पा., दाङ	३०.००	१४.००
७१	विकासनगर डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	दंगीशरण गा.पा.-५, मिरौली, दाङ	२६.००	१४.००
७२	शुद्धोधन डिप ट्युबवेल सिंचाई योजन	शुद्धोधन गा.पा., कपिलवस्तु	२५.००	१४.००
७३	स्वोर्गद्वारी डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	बबई गा.पा., पंचकुले दाङ		
७४	त्रिपुर कर्मट्वा डिप ट्युबवेल सिंचाई,	घोराही उ.म.न.पा.-९, दाङ	३०.००	२२.००
७५	श्रीघाट डिप ट्युबवेल सिंचाई,	बाणगंगा १ कपिलवस्तु	२६.००	२५.००
७६	मुडुवाबाबा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	बुद्धभूमि न.पा.-३, कपिलबस्तु	३०.००	१५.००
७७	आन्द्राभरैया डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा.-९, दाङ	३०.००	२५.००
७८	रजपल डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना	शान्तिनगर गा.पा., दाङ	२०.००	८.००
७९	कचिला डबरा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१२, दाङ	३०.००	१८.००
८०	पडाहा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१०, दाङ	३०.००	१२.००

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
		०८०/८१	९४	१५	१०५०	१२.५	
		०७९/८०	१०४	१८	१२००	१०	
		०८०/८१	६५.५	१२	१५००	१५	
		०७७/७८	९३	१५	१०००		
		०८०/८१	८५	१५	१६००	१५	
		०८०/८१			१५००	१५	
		०७९/८०	९१	१५	९००	१२.५	
		०८०/८१	१११	२७	१९००	१२.५	
		०७९/८०	१२४		९००	७.५	
		०८०/८१	१०५	२१	१३००	१५	
		०८०/८१	११३	२१	१५००	१५	
		०७८/७९	९८	१८	१२००	१२.५	
		०७८/७९	१०१	२१	९००		
		०८०/८१	९४	१५	१२००	१२.५	
		०७८/७९	१२४	१८	८००	१२.५	
		०७९/८०	९१	१५	५००	१५	
		०८०/८१	९३	१५	१३००	१५	
		०८०/८१	१४७	२१	८००	१०	
		०७९/८०	१२६	१२	७८०	१०	
					९००	७.५	
		०८०/८१	९२	१८	१८००	१५	
		०७९/८०	१०७	१८	९५०	१५	
		०८०/८१	१००	१८	१२००	१५	
		०८०/८१	१०३	24.15 Slotted, 9 LCG	१२००	१५	
		०७८/७९	१०५	२७	१०३४	१०	
		०७९/८०	१२८	१८	१०००	१५	
		०७९/८०	११९	२१	१२००	१०	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
८१	बाघमारे उ.मा.वि. अगाडि डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना,	शान्तिनगर गा.पा.-२, दाङ	१०.००	७.००
८२	हृदयनगर डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	कृष्णनगर न.पा.-१२ बहादुरगंज	३०.००	१४.००
८३	एकली थारुगाउँ डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१, दाङ	२०.००	७.००
८४	फल्कापूर डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	लमही न.पा., दाङ	२६.००	१७.००
८५	रातोमाटे डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा.-१३, दाङ	२५.००	१४.००
८६	गूरुवा गाउं डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा.-६, दाङ	३०.००	२२.००
८७	सतवरीया डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	लमही न.पा.-८, उच्चानिम्बु, दाङ	२६.००	१०.००
८८	सहारा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना,	गढवा गा.पा.-२, घुस्रा दाङ	२८.००	२५.००
८९	खरदरिया डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	राजपुर गा.पा.-३, दाङ	२०.००	१८.००
९०	रामपुर टोल डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना	घोराही उ.म.न.पा.-४,दाङ	२८.००	१२.००
९१	कामना डिप ट्यूववेल सिँचाई योजना	गढवा गा.पा., दाङ	२०.००	८.००
९२	बेसाही डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा-७, दाङ	२५.००	१५.००
९३	तल्लो घुस्रा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा-७, दाङ	३०.००	१५.००
९४	सिसहनीया डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	घोराही उ.म.न.पा-७, दाङ	३०.००	२२.००
९५	जहदागाउँ डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	तुलसीपुर उ.म.न.पा.-१५, दाङ	२५.००	१०.००
९६	गरिब नवाज डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	कृष्णनगर न.पा., कपिलवस्तु	३०.००	१८.५०
९७	किसान डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	बुद्धभूमि न.पा.-३, कपिलवस्तु	२५.००	१५.००
९८	बाणगंगा बठनपुर डिप ट्युवेल सिँचाइ योजना	बंगंगा न.पा.-१, कपिलवस्तु		२०
९९	गंगाजल डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना	कृष्णनगर न.पा., कपिलवस्तु	३०	१५
२	**भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही**			
१	Kumargaddi DTW ISP	Sainamaina-9, Rupandehi	३०	२२
२	Tllauli DTW ISP	Sarawal-2, Nawalparasi	३०	१७
३	Sunuwol DTW ISP	Sunuwol-7, Targauli Nawalparasi	३०	१६.५
४	Madi Thatiya DTW ISP	Bagnaskali-2, Thatiya Palpa	३०	८.५
५	Baramthan DTW ISP (Manari DTW ISP)	Sarawal-2, Manari Nawalparasi	३०	१८

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
		०८०/८१	७९	१५	२५०	५	
		०७७/७८	९४	१८	८५०	१०	
		०७९/८०	९५	१५	७००	७.५	
		०७६/७७	९९	१८	१०००	१२.५	
		०७६/७७	९४	२१	७००	१५	
		०७७/७८	८२	१५	१२००	१५	
		०७७/७८	७८	१२	१४००	१०	
		०७९/८०	१०५	१५			
		०८०/८१	८८	१८	१२००		
		०७७/७८	१२३	१८	१०००	१०	
		०७६/७७	९७	१८	१०००	१२.५	
		०७७/७८	९१	१५			
		०७६/७७	९४	१५		१२.५	
		०७६/७७	१०१	२१		१५	
		०७६/७७	१०७	१८		७.५	
		०७६/७७	१०२	१८			
		०७५/७६	१२७	१३	९००	१०	
		०७७/७८	१०८			१५	
		०७५/७६	१३८	२१	१५००	१५	
१०९९२		Running	१२३.५	१८			DTW सम्पन्न
१३४७७		Running	१७४.५	१८			DTW सम्पन्न
		Running	१४४.५	१४			DTW सम्पन्न
१०६७६		Running	८७.५	१५			DTW सम्पन्न
१३७८४		Running	१५१.५	१२			DTW सम्पन्न

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
६	Basa DTW ISP	Sarawal-1, Basa Nawalparasi	३०	१३.५
७	ShivalayaPokhari DTW ISP (Paldada DTW)	Bardhaghat-5, Paldada Nawalparasi	३०	१२
८	Rupauliya DTW ISP	Susta-1, Rupauliya Nawalparasi	३०	२८
९	Laghunaha DTW ISP	Bardhaghat-3, Laghunaha Nawalparasi	३०	१८
१०	Ramgram DTW ISP	Ramgram-14, Nawalparasi	३०	१३
११	Mukhiyatol DTW ISP	Devdaha-8, Mukhiyatol Rupandehi	३०	१२
१२	Pargatinagar DTW ISP	Butwal-19, Ranibari Rupandehi	३०	२४.५
१३	New Srijansil Yubaclub DTW ISP	Bardhaghat-6, Bethani Nawalparasi	३०	१४
१४	Majha DTW ISP	Tansen-9, Damkada Palpa	३०	१२.४८
१५	Madanpokhara DTW ISP	Tansen-8, Madanpokhara Palpa	३०	६
१६	Siddhartha DTW ISP	Rohini-5 Rupandehi	३०	१५.१
१७	Kotahimai DTW ISP	Ramgram-13 Padatikar Nawalparasi	३०	५.२
१८	Jay Maa Durga DTW ISP	Ramgram-17 Patkhauli Nawalparasi	३०	१५
१९	Bhadchi Bagaha DTW ISP	Sainamaina-9 Rupandehi	३०	७.७
२०	Ganga Prithivi DTW ISP	Bardhaghat-14 Nawalparasi	३०	१६
२१	Ranigunj DTW ISP	Butwal-17 Rupandehi	३०	१२
२२	Barampura DTW ISP	Ramgram-9 Nawalparasi	३०	१६
२३	Bandevi DTW ISP	Ramgram-11 Nawalparasi	३०	६
२४	Sano Gaidahawa DTW	Gaidahawa-3 Rupandehi	३०	१२
२५	Shanti DTW ISP	Gaidahawa-7 Rupandehi	३०	२४
२६	Kotasthan DTW ISP	Sarawal-4 Nawalparasi	३०	२२.५

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
१३१६३		Running	२२८.५	१२			DTW सम्पन्न
		२०८१/८२	१८५.५	१७		१०	DTW सम्पन्न
११४५९		Running	८५.५	१५			DTW सम्पन्न
१२११५		Running	१६४.५	२१			DTW सम्पन्न
१३५३४		Running	२३५.५	१२			DTW सम्पन्न
११२६९		Running	१०६.५	११			DTW सम्पन्न
१०८१४		Running	१०८.५	१८			DTW सम्पन्न
१२१३८		Running	१६०.५	१४			DTW सम्पन्न
१०५६४		Running	८३.५	१८			DTW सम्पन्न
८११६		Running	८४	१५			DTW सम्पन्न
		२०८०/८१	१७४	१२		१२.५	DTW सम्पन्न
१२७५२		Running	२३०	१२			DTW सम्पन्न
१०८१६		Running	१८९	१२		१२.५	HS सम्पन्न
१११३६		Running	११५	१२			DTW सम्पन्न
१०८१०		Running	१५५	१५		१२.५	HS सम्पन्न
१०६८८		Running	१०३.५	१५			DTW सम्पन्न
१२६५१		Running	२२८	१२		१२.५	HS सम्पन्न
११९०३		Running	१९५	१२			DTW सम्पन्न
११३६८		Running	१३५	१२		१०	HS सम्पन्न
१२४३०		Running	१४९	१२		१५	HS सम्पन्न
११११२		Running	१७२	१२		१५	HS सम्पन्न

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
२७	Motibasti DTW ISP	Bardhaghat-1 Nawalparasi	३०	
२८	Tansen DTW ISP(DTH Drilling)	Tansen-9 Palpa	१०	
२९	Lumbini Hariyali Kirshak DTW ISP	Lu Sa Na Pa 11 Rupandehi	३०	१८
३०	Pakari DTW ISP	Devdaha-8, Rupandehi	३०	१३.७
३१	Bhedikhor DTW ISP	Kanchan-1 Kuchura Rupandehi	३०	१८
३२	Balapur DTW ISP	Sainamaina-5 Rupandehi	३०	१३
३३	Hanuman DTW ISP	Kanchan-3 Rupandehi	३०	
३४	Pabitrabasti DTW ISP	Bardhaghat 14 Nawalparasi	३०	१५
३५	Dharmabasti DTW ISP	Bardhaghat 14 Nawalparasi	३०	१६
३६	Kirshi Kalika DTW ISP	Sunuwol 12 Harkatta Nawalparasi	३०	६
३७	Surya Nagar DTW ISP	Bardhaghat 16 Nawalparasi	३०	१५
३८	Shantitol DTW ISP	Kanchan-5 Rupandehi	३०	
३९	Rampur Unnati DTW ISP (DTH)	Rampur 7 Palpa	१०	२
४०	Rampur Milantol DTW ISP (DTH)	Rampur 7 Palpa	१०	४
४१	Ranikohal DTW ISP	Tansen 9 Palpa	१०	
४२	Kokaladevi DTW ISP	Tansen 7 Palpa	१०	
४३	Shankarpur DTW ISP	Sainamaina-9 Rupandehi	३०	
४४	Jay Samayamai DTW ISP	Gaidahawa 3 Rupandehi	३०	
४५	Jaleshowor DTW ISP	Kanchan 1 Rupandehi	३०	
४६	Chanmai DTW ISP	Gaidahawa-5 Rupandehi	३०	
४७	Sainamaina DTW ISP	Sainamaina 6 Bharatkuti Rupandehi	३०	
४८	Makar DTW ISP	Bardhaghat 1 Nawalparasi	३०	
४९	Ramgram DTW ISP	Ramgram 9 Pipariya Nawalparasi	३०	
५०	Sanda DTW ISP	Ramgram 1 Nawalparasi	३०	
५१	Mehalwari DTW ISP	Lu Sa Na Pa Rupandehi	३०	

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
१२३८४		Running	१७१	१२		१२.५	HS सम्पन्न
			१२०				सम्पन्न
१०६४९		Running	१५०	१५		७.५	HS सम्पन्न
११०८५		Running	१४२	१५			थप कार्य नगरिएको
		२०८०/८१	१४२	१२		७.५	सम्पन्न
१०८६९		२०८०/८१	१२०	१५		७.५	सम्पन्न
१०४४०		२०८१/८२	१३६	१८		२०	सम्पन्न
११७४०		२०८१/८२	१६८	१२		१०	सम्पन्न
१०८००		२०८१/८२	१३९	१५		१२.५	सम्पन्न
१३५८०			२३२	९			थप काम नगरिएको
११४९२		२०७९/८०	१५९	१८			सम्पन्न
१०३६६		२०८१/८२	११७	१८		१५	सम्पन्न
१३२२१			१२०				सम्पन्न
			६५				सम्पन्न
१५४१०		२०८०/८१	१२०				सम्पन्न
		२०८०/८१	१२०				सम्पन्न
							सम्पन्न
१०३२८						१५	HS सम्पन्न
१०५५३		२०७९/८०					सम्पन्न
११५०७		२०७९/८०					सम्पन्न
१०५७१		२०८०/८१					सम्पन्न
१०८२८		२०७९/८०					सम्पन्न
		Running				१५	Half System सम्पन्न
		२०८०/८१				१०	सम्पन्न
		२०८१/८२					सम्पन्न

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
५२	Hatifarsatikar DTW ISP	Omsatiya 3 Rupandehi	३०	
५३	Mini Bankatti DTW ISP	Sunuwol 5 Nawalparasi	३०	
५४	Bogadi DTW ISP	Bogadi 4 Hardigau Rupandehi	३०	
५५	Simraha DTW ISP	Sainamaina 5 Rupandehi	३०	
५६	Kirshi Sinchai DTW ISP	Bardhaghaat 11	३०	
३	**भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके**			
१	बागेश्वरी डि.सि.प्र.	खजुरा, बाँके	३०	२१
२	गनेश्पुरी डि.सि.प्र.	मधुवन, बर्दिया	३०	२०
३	जनचेतना डि.सि.प्र.	बैजनाथ, बाँके	३०	२२
४	कालिका मन्दिर डि.सि.प्र.	बढैयाताल. बर्दिया	३०	२३
५	मोहम्दपुर डि.सि.प्र.	गुलरिया, बर्दिया	३०	२१
६	श्री किसान डि.सि.प्र.	खजुरा, बाँके	३०	१६
७	मैनापोखर डि.सि.प्र.	बढैयाताल. बर्दिया	३०	११
८	बनकट्टी डिप ट्युववेल	डुडुवा, बाँके	३०	१८
९	सृजना डिप ट्युववेल	नेपालगंज २२ बाँके	३०	१५
१०	मनकामना शिव डिप ट्युववेल	खजुरा, बाँके	३०	१२
११	समशेरगंज डिप ट्युववेल	रासिसोनारी, बाँके	३०	१५
१२	कालिकामाता डिप ट्युववेल	बढैयाताल. बर्दिया	३०	१४
१३	गुलरिया १३ डिप ट्युववेल A	गुलरिया, बर्दिया	३०	१६
१४	सुदामा डिप ट्युववेल	मधुवन, बर्दिया	३०	२२
१५	गाजी डिप ट्युववेल	डुडुवा-०३, बाँके	३०	१८
१६	गंगा डिप ट्युववेल	डुडुवा-०४, बाँके	३०	१३
१७	सितापुर डिप ट्युववेल	खजुरा, बाँके	३०	
१८	लक्ष्मनपुर डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी, बर्दिया	३०	-
१९	गुलरिया १३ डिप ट्युववेल B	गुलरिया, बर्दिया	३०	-
२०	देउराली डिप ट्युववेल	मधुवन-०९, बर्दिया	३०	१४
२१	श्रीराम डिप ट्युववेल	डुडुवा ३, बाँके	३०	१८

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
							DTW सम्पन्न
							HS सम्पन्न
							HS सम्पन्न
		२०७९/८०					सम्पन्न
१२६६०		Running					सम्पन्न नभएको
-	-	२०७५/७६	११०	१५	१८००	७.५	
-	-	२०७५/७६	९०	१८	१७००	१५	
-	-	२०७५/७६	११७	१८	१५००	१५	
-	-	२०७५/७६	९०	१८	१९००	१५	
-	-	२०७५/७६	१०१	१८	१७००	१५	
-	-	२०७५/७६	१३१	१६	१७००	१५	
-	-	२०७७/७८	१२१	१८	१६००	१५	
-	-	२०७६/७८	१०४	१८	१८००	१५	
-	-		९५	१५	२०००	१५	
-	-	२०७७/७८	११९	१८	१७००	१५	
-	-	२०७७/७८		१८	१८००	१५	
-	-		१०२	१८	२१००	१५	
-	-		९२	१८	-	-	
-	-		८४	१८	-	-	
-	-		१३०	१८	१५००	१५	
-	-		१२८	१८	१६००	१५	
-	-		-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-
-	-		८५	१८	-	-	
-	-			१८	१९४४	१५	
-	-			१८	१६००	१५	

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
२२	जमुनि डिप ट्युववेल०९	बढैयाताल१ . बर्दिया	३०	१६
२३	रनियापुर २ डिप ट्युववेल	खजुरा-०२ बाँके	३०	
२४	बागेश्वरी डिप ट्युववेल	नेपालगंज-१७, बाँके	३०	१४
२५	सितापुर डिप ट्युववेल नं१३	खजुरा-०२ बाँके	३०	१६
२६	सितापुर डिप ट्युववेल नं१६	खजुरा-०२ बाँके	३०	१५
२७	हराभरा डिप ट्युववेल	मधुवन-७, बर्दिया	३०	१६
२८	ठुमनि डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी ०९ बर्दिया	३०	१६
२९	हिमाल डिप ट्युववेल	खजुरा, बाँके	३०	१२
३०	लगनिया खोला डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी ०३ बर्दिया	३०	-
३१	जमुनी डिप ट्युववेल नं९	बढैयाताल, बर्दिया	३०	२०
३२	कालिका डिप ट्युववेल उपआयोजना	खजुरा, बाँके	३०	१२
३३	नमुना सिंचाई डिप ट्युववेल ज.उ.स	खासखुस्मा, बाँके	३०	१८
३४	अठाइसघर डिप ट्युवेल	बैजनाथ, बाँके	३०	५
३५	दुर्गा डिप ट्युववेल	खजुरा ०३ बाँके	३०	१४
३६	हरियाली डिप ट्युववेल	रनियापुर-१२, बाँके	३०	१७
३७	एग्रीकल्चर डिप ट्युववेल	डुडुवा-०३ बाँके	३०	१५
३८	फुलवारी डिप ट्युववेल	कम्दी-६, बाँके	३०	१४
३९	जयराम डिप ट्युववेल	डुडुवा बाँके	३०	१६
४०	श्री महाकाली डिप ट्युववेल	कम्दी-३, बाँके	३०	१८
४१	ठुमानीपुर्व डिप ट्युववेल	बाँसगढी बर्दिया	३०	१४
४२	समाजसुधार डिप ट्युववेल	मोतिपुर -६ बर्दिया	३०	१५
४३	ढकैला डिप ट्युववेल	बारबर्दिया ०१ बर्दिया	३०	१७
४४	मधुवन डिप ट्युववेल	मधुवन ०४ बर्दिया	३०	१६
४५	ककौरा डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी ०८, बर्दिया	३०	१५
४६	उत्तरभाकारी डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी ०३, बर्दिया	३०	१६
४७	बेलौली डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी ०८, बर्दिया	३०	१४
४८	जय हनुमान डिप ट्युववेल	डुडुवा बाँके	३०	१७
४९	नेउलापु डिप ट्युववेल	थाकुरबबा-६ बर्दिया	३०	१६

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
-	-			१८		१५	
-	-			१८	-	-	
-	-		१२०	१८	१६००	१५	
-	-		१२९	१८	१९००	१५	
-	-		१२७	१८	२१००	१५	
-	-		१२७	१८	२०००		
-	-		१२७	१८	१८००		
-	-		१२७	१८	१५००		
-	-		१२८	१८	-	-	
-	-		११३	१८	२२००	१५	
-	-		१३५	१५	१८००	१०	
-	-		९०	१८	१९१०	१५	
-	-		१५४	१५	-	५	
-	-		१२६	१५	१८६५	१५	
-	-		१५३	१२	-	-	
-	-		११६	१८	१६००	१५	
-	-		११०	१८	-	-	
-	-		१२१	१८	१८००	१५	
-	-		१२०	१८	१६००	१२.५	
-	-		१२३	१५	१५००	१५	
-	-		१५३	१५	-	-	
-	-		१३६	१८	१५००	१५	
-	-		१०५	१८	१८००	१५	
-	-		१५२	१५	१९००	१५	
-	-		१०४	१८	२१००	१५	
-	-				-	-	
-	-		१२९	१२	२२००	१५	
-	-		७५	१८	१८००	१५	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
५०	सफल डिप ट्युववेल	खजुरा ०८ बाँके	३०	१३
५१	हरियाली डिप ट्युववेल	खजुरा२, बाँके	३०	१८
५२	बुद्धबीर डिप ट्युववेल	खजुरा ०३ बाँके	३०	१३
५३	बुधान डिप ट्युववेल	बारबर्दिया ०५ बर्दिया	३०	-
५४	डुडुवा डिप ट्युववेल	डुडुवा ०३ बाँके	३०	-
५५	गणेशपुरी डिप ट्युववेल	मधुवन-०८ बर्दिया	३०	१४
५६	गांजी डिप ट्युववेल	डुडुवा ०३ बाँके	३०	१२
५७	कालिगौडी डिप ट्युववेल	थाकुरबाबा ०६ बर्दिया	३०	२०
५८	माछागढ़ डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी ०९ बर्दिया	३०	१८
५९	मोहमदपुर डिप ट्युववेल	गुलरिया १२ बर्दिया	३०	१६
६०	चुरे डिप ट्युववेल	नरैनापुर ०१ बाँके	३०	-
६१	पेडारिटोल डिप ट्युववेल	रामिसोनारी ०८ बाँके	३०	१८
६२	लालिगुरास डिप ट्युववेल	राजापुर ०५ बर्दिया	३०	१६
६३	बेलौली डिप ट्युववेल	बांसगढ़ी ०८ बर्दिया	३०	१६
६४	मसाहा डिप ट्युववेल	डुडुवा ०४ बाँके	३०	१६
६५	हरियाली डिप ट्युववेल	खजुरा ०८ बाँके	३०	१३
६६	कालिका डिप ट्युववेल	खजुरा ०८ बाँके	३०	१५
६७	कमल डिप ट्युववेल	खजुरा ०८ बाँके	३०	१४
६८	उज्यालो डिप ट्युववेल	नरैनापुर ०१ बाँके	३०	१६
६९	बुधान डिप ट्युववेल	बारबर्दिया-०५ बर्दिया	३०	
७०	मोतिपुर लाथावा डिप ट्युववेल	ठाकुरबाबा ०६ बर्दिया	३०	२२
७१	अमवा डिप ट्युववेल	रामिसोनारी ०१ बाँके	३०	२१
७२	खेतानटोल डिप ट्युववेल	रामिसोनारी ०१ बाँके	३०	२०
७३	टिटिनघारी डिप ट्युववेल	रामिसोनारी ०१ बाँके	३०	१७
७४	मदुवा डिप ट्युववेल	रामिसोनारी ०२ बाँके	३०	२२
७५	बेउचाहवा/महादेवा डिप ट्युववेल	रामिसोनारी ०९ बाँके	३०	१८.५
७६	उज्वल डिप ट्युववेल	बारबर्दिया बर्दिया	३०	५
७७	धधवारमिलनटोल डिप ट्युववेल	बारबर्दिया बर्दिया	३०	१०

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
-	-		१२६	१२	१८००	१५	
-	-		१३०	१५	१५००	१५	
-	-		१३९	१५		१५	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		११६	१८	-	-	
-	-		१००	१८	१५००	१५	
-	-		१०३	१५	१९००	२०	
-	-		८८	१८	१५००	१५	
-	-		१७३	१६	१५००	१५	
-	-		१०७	१८	१५००	१५	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-		११८	१८	१५००	१५	
-	-		९७	४२	१५००	१५	
-	-		१८०	१६	१५००	१५	
-	-		१२२	१५	-	-	
-	-		१८४	१७	-	-	
-	-		१२७	१५	१५००	१५	
-	-		१३८	५	७००	५	
-	-		१३२	१८	९००	१५	
-	-		१६३	२४	-	-	-
-	-		९९	३०	-	-	-
-	-		९६	१५	-	-	-
-	-		१०८	१८	-	-	-
-	-		११२	१८	-	-	-
-	-		१३५	१८	-	-	-
-	-		१४६	१५	-	-	-
-	-		१४६	९	-	-	-
-	-		१४५	१५	-	-	-

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेगाना	सिँचित क्षेत्रफल (हेक्टरमा)	वेल डिस्चार्ज क्षमता (लि/से)
७८	डाँफे डिप ट्युववेल	बारबर्दिया बर्दिया	३०	१४
७९	किसान कल्याण डिप ट्युववेल	खजुरा ०२ बाँके	३०	१२
८०	कोहाला डिप ट्युववेल	नरैनापुर ०६ बाँके	३०	१८
८१	तिन्घरुवा डिप ट्युववेल	ठाकुरबाबा ०२ बर्दिया	३०	१३
८२	खैरेनी डिप ट्युववेल	बारबर्दिया ०९ बर्दिया	३०	-
८३	कर्मला डिप ट्युववेल	ठाकुरबाबा ०६ बर्दिया	३०	१४
८४	मयुर डिप ट्युववेल	मधुवन ०९ बर्दिया	३०	२२
८५	शुक्रबस्ति डिप ट्युववेल	मधुवन ०७ बर्दिया	३०	-
८६	भोल्दुबाबा डिप ट्युववेल	बढैयाताल बर्दिया	३०	-

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

सुरु लागत अनुमान (हजारमा)	खर्च रकम (हजारमा)	योजना सम्पन्न भएको	मुख्य मुख्य संरचना				कैफियत
			Well Depth	Screen Length	Distribution System Length	Pump Size	
-	-		१४५	१८	-	-	-
-	-		१३९	१५	१८००		
-	-		१४९	१८	-	-	-
-	-		९७	२१	-	-	-
-	-		१४२	१२	-	-	-
-	-		१०१	२१	-	-	-
-	-	२०८१/८२	९९	२१	-		-
-	-	२०८१/८२	९३	१८	-	-	-
-	-	२०८१/८२	१२५	१८	-	-	-

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

अनुसूची ८

मन्त्रालयबाट योजना कार्यान्वयन स्वीकृती (Project Appraisal) भएका केही योजनाहरुको विवरण

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
आ.व. २०८१/०८२					
१	बस्तीखोला सिँचाइ योजना, शान्तीनगर गा.पा. ३ र ४, दाङ	दाङ	३५०	५८०६३.००	
२	घारीचौर सिँचाइ योजना, बंगलाचुली गा.पा. ०७, दाङ	दाङ	४०	२८३८३.००	
३	झिंगनी बबइ कुलो सिँचाइ योजना, घोराही उप-महानगरपालीका ०३, झिंगनी, दाङ	दाङ	५०	५३७४९.००	
४	टिकालहरा जजरा सिँचाइ योजना, तुलसीपुर उप-महानगरपालीका १५ र १६, दाङ	दाङ	२४०	८९१४१.००	कार्यान्वयनमा नगएको
५	चिउरे खोला सिँचाइ योजना, रासीसोनारी ०१, कुसुम, बाँके	बाँके	३९	२८६०८.००	
६	रोहीणी लिफ्ट सिँचाइ योजना, कोहलपुर १३, बाँके	बाँके	५०	४६१४८.००	
७	जरेखोला बगाले पाँचसयफाट सिँचाइ योजना, सन्दिखर्क न.पा. ०४ र छत्रदेव गा.पा. ०६, अर्घाखाँची	अर्घाखाँची	३२	१७१७३.००	
८	खयरभट्टी सिँचाइ योजना, शितगंगा न.पा. ११, अर्घाखाँची	अर्घाखाँची	३०	२६००१.००	
९	रातटारी सिँचाइ योजना, सन्दिखर्क न.पा. ०६, अर्घाखाँची	अर्घाखाँची	१९	१७६३९.००	
१०	रामपुर फाँट सिँचाइ योजना, रामपुर नगरपालिका, पाल्पा	पाल्पा	८००	१३९९६५.००	
११	जबई बनकट्टी लिफ्ट सिँचाइ योजना, शिवराज न.पा., कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	३०	३३०१०.००	
१२	जबइ सखुनिया ताल सिँचाइ योजना, बुद्धभूमी र महाराजगंज न.पा., कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	१४५०	९३१४२.००	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
१३	तिनाउ खोला तथा यसका शाखा खोलाहरु नियन्त्रण कार्य, पाल्पा	पाल्पा	N/A	२४९७५.००	
१४	गोइतिवाङ सिँचाइ योजना, त्रिवेणी ५ रोल्पा	रोल्पा	४१	४९९४५.००	
१५	झेनामखोला कोइरेपानी सिँचाइ योजना, रुन्टीगढी ८, रोल्पा	रोल्पा	१६	२४६६६.००	
१६	महेन्द्री सिँचाइ योजना, सुनिलस्मृति २, रोल्पा	रोल्पा	४०	४९९६४.००	
१७	अम्लिहवा डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वाँसगढी ८ बर्दिया	वर्दिया	३०	११९५८.००	
१८	पहाडीपुर डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वाँसगढी ९ बर्दिया	वर्दिया	३०	१२५७३.००	
१९	भैंसासुर डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वाँसगढी ८ बर्दिया	वर्दिया	३०	१२९८४.००	
२०	कर्मला डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना ठाकुरवावा २ बर्दिया	वर्दिया	३०	१२९९४.००	
२१	तिनघरुवा डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना ठाकुरवावा २ बर्दिया	वर्दिया	३०	१२३७४.००	
२२	खैरेनी डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वारवर्दिया ९ बर्दिया	वर्दिया	३०	११९०४.००	
२३	धधवार मिलनटोल डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वारवर्दिया ११ बर्दिया	वर्दिया	३०	११७९१.००	
२४	डाँफे डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वारवर्दिया १० बर्दिया	वर्दिया	३०	११७९६.००	
२५	उज्जवल डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वारवर्दिया १० बर्दिया	वर्दिया	३०	११७९६.००	
२६	चुरे डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना नरैनापुर १ बाँके	वाँके	३०	१२३३६.००	
२७	वेउचहवा/लक्ष्मणपुर डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना नरैनापुर २ बाँके	वाँके	३०	१२४६१.००	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
२८	मोतिपुर मटैया डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना नरैनापुर ५ बाँके	वाँके	३०	१३७९६.००	
२९	कोहला डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना नरैनापुर ६ बाँके	वाँके	३०	१३५६९.००	
३०	मदुवा डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना रासि सोनारी २ बाँके	वाँके	३०	१४५८४.००	
३१	खेतान डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना रासि सोनारी १ बाँके	वाँके	३०	११०५१.००	
३२	अमवा डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना रासि सोनारी १ बाँके	वाँके	३०	११२७२.००	
३३	टिटिनघारी डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना रासि सोनारी ९ बाँके	वाँके	३०	१२३४०.००	
३४	वचुनापुर/महादेवा डिप वोरिङ्ग सिँचाइ योजना रासि सोनारी १ बाँके	वाँके	३०	१२०२७.००	
३५	कृष्णपुर लालमटिया डिप बोरिङ्ग निर्माण, घोराही १२ दाङ्ग	दाङ	३०	१३४८२.९९	
३६	कपिलबस्तु क्षेत्र नं १ ख भरिमा डिप बोरिंग जडान कपिलबस्तु	कपिलवस्तु	३०	१२८०५.०८	
३७	उपल्ला बस्ति डिप ट्यूववेल सि.यो., बुद्धभूमि ९ कपिलबस्तु	कपिलवस्तु	३०	११६८९.१५	
३८	श्री दक्षिण पिपरा डिप ट्यूववेल सि.यो., वाणगङ्गा-२ कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	३०	१२१३८.९०	
३९	श्री रतनपुर डिप ट्यूववेल सि.यो., वाणगङ्गा-१० कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	३०	१४८१४.०३	
४०	रानिवारी प्रगतिटोल डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वुटवल १९	रुपन्देही	३०	१०८१४.००	
४१	शिर्जलसिल युवा कल्व डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना वर्दघाट ६ नवलपरासी	नवलपरासी	३०	१२१३८.००	
४२	रामग्राम डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना रामग्राम १४ नवलपरासी	नवलपरासी	३०	१३५३४.००	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
४३	कुमार गड्डी डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना सैनामैना ९ रुपन्देही	रुपन्देही	३०	१०९९२.००	
४४	मदन पोखरा डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना तानसेन ८ पाल्पा		३०	८११६.००	
४५	मुखिया टोल डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना देवदह ८ रुपन्देही		३०	११२६९.००	
४६	श्री मार्फासेवाली डांडा डिप ट्यूववेल सि.यो., घोराही-८, दाङ	दाङ	२५	१३४४५.६२	
४७	श्री हेकुली-७ पोटली डिप ट्यूववेल सि.यो., दंगीशरण गा.पा.-५, दाङ	दाङ	२५	१३४००.३३	
४८	श्री बुटनीया डिप ट्यूववेल सि.यो., दंगीशरण गा.पा.-७, दाङ	दाङ	२६	१३५९९.८४	
४९	श्री बनगाउँ डिप ट्यूववेल सि.यो., तुलसीपुर-१०, दाङ	दाङ	२६	१३००९.१९	
५०	श्री मिझुनीय डिप ट्यूववेल सि.यो., विजयनगर गा.पा.-४, कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	३३	१३४७६.२४	
	आ.व. २०८०/०८१				
१	मानखोला नदी नियन्त्रण कार्य, बैजनाथ ६,८ र खजुरा २ बाँके			१०९५७४.००	कार्यान्वयनमा जान नसकेको
२	कर्मनाहा सुइटी सिँचाइ योजना वाणगंगा न.पा. ३ कपिलवस्तु		४२५	४६९८८.००	
३	बबई नदी नियन्त्रण योजना, तुलसीपुर, दाङ	दाङ	N/A	४०३२३.००	
४	ग्वारखोला नदी नियन्त्रण योजना, तुलसीपुर, दाङ	दाङ	N/A	६६५९५.००	
५	पातुखोला नदी नियन्त्रण योजना, तुलसीपुर, दाङ	दाङ	N/A	५१३४३.००	
६	कन्चनिया सोत्वा नाला सिँचाइ योजना, महाराजगञ्ज १०, कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	३५०	५८५१९.००	
७	अरुणखोला वृहत सिँचाइ योजना, निस्दी-४, पाल्पा	पाल्पा	१३६	८१४९४.००	

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
८	पूर्वखोला वृहत् सिँचाइ योजना, पूर्वखोला ३, पाल्पा	पाल्पा	२८	२६४७६.००	
९	खजुरा खोला नियन्त्रण कार्य, बर्दघाट ७ नवलपरासी		N/A	५१२३७.००	
१०	चिसाखोला भिङ्ग्रीपाटी सिँचाइ योजना, लुङ्ग्री गा पा ३ रोल्पा		१४	१५९०८.००	
११	धनवाङ खोला ठूलो कुलो सिँचाइ योजना, स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्यूठान		१०६	४५०२१.००	
१२	धर्मवति नहर सिँचाइ योजना, प्यूठान नगरपालिका ८ प्यूठान		१५०	४९६१७.००	
१३	झेनामखोला सालिवाङ्ग सिँचाइ योजना, रुन्टीगढी गा पा ७ रोल्पा		११	१३७२२.००	
१४	कराङ फाँट सिँचाइ योजना, माथागढी ७, पाल्पा	पाल्पा	३२	२९३०५.००	
१५	दिवाङ सिँचाइ योजना, स्वर्गद्वारी न पा ९ प्यूठान		५०	३३५८४.००	
१६	घोरखोला किमिचौर सिँचाइ योजना स्वर्गद्वारी न पा ३ प्यूठान		५६	३४२४०.००	
१७	जैवारी चखेली एक्लेखेत सिँचाइ योजना, शितगंगा २ अर्घाखाँची		१६	२४२७५.००	
१८	भाविन काफली सिँचाइ योजना, शितगंगा ४ र ५ अर्घाखाँची		१६	२३७१६.००	
१९	हर्सिङखोर सिँचाइ योजना, सन्दीखर्क १० अर्घाखाँची		२१	३२८२८.००	
२०	चहलाफाँट सिँचाइ योजना, रैनादेवी छहरा गा पा ६ पाल्पा		७५	४६०६५.००	
२१	अस्परी सगरैया डिप बोरिङ्ग निर्माण कार्यघोराही-उप म नपा -९ दाङ		३०	१२२५९.०१	
२२	डिप बोरिङ बुद्धभूमी नगरपालिका ९ गभदवा कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	३२	११८३९.६१	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
२३	वोरिङ निर्माण कार्य घोराही १० धैरेनि दाङ	दाङ	३०	१७९८१.४३	
२४	डिपबोरिङ्ग निर्माण विजयनगर ६ कपिलबस्तु	कपिलवस्तु	३०	१३४२७.६६	
२५	इन्द्र सरोबर डिप ट्युबवेल, गढवा ६, बलाखुटी, दांग	दाङ	३०	१३२००.३२	
२६	बागडोई भूमिगत जल सिंचाई योजना, शान्तिनगर ५ दाङ		३०	१४२९९.४५	
२७	धम्कापुर गनारी डिप ट्युबवेल सिंचाई प्रणाली, तुलसीपुर दांग	दाङ	३५	१२८१२.२०	
२८	बासखोरमा सिँचाईको लागि डीप ट्युवेल जडान शुद्धोधन ६ कपिलवस्तु		३०	१३७२८.२८	
	आ.व. २०७९/८०				
१	खैरेनीमुल सुनारडेरा धौलीगाँउ सिँचाइ योजना, सुनिलस्मृति गाँउपालिका ६, रोल्पा	रोल्पा	२१	१६६६९.००	
२	तीन खोला सिँचाइ योजना, परिवर्तन गाँउपालिका १, रोल्पा	रोल्पा	३०	२३८९८.००	
३	बाँसखोला बनदेवी सिँचाइ योजना, सुनवल नगरपालिका १३, नवलपरासी	नवलपरासी	७०	४९८४९.००	
४	मनरखनी सिँचाइ योजना, सरावल गाँउपालिका, नवलपरासी	नवलपरासी	१८०	७२२२३.००	
५	कुम्भ बाँध सिँचाइ योजना बुद्धभुमी न पा. ८, कपिलवस्तु			४६६४६.००	
६	गड्डाघाट सिँचाइ योजना, शिवराज न पा. र विजयनगर गा.पा. क.व.	कपिलवस्तु		७४९०२.००	
७	भलैहिया डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना शिवराज १ कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	३०	१३६०१.४२	
८	डिप ट्युववेल सिंचाई योजना, घोराही-५, डाँगीगाउ दाङ		३०	१३७१५.००	

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
९	बैबांग डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना, दंगिसरण ४, दांग	दाङ	३०	१६६७७.६०	
१०	बोरिङ्ग जडान मायादेवी-६ डुमरामा कपिलवस्तु		३५	१३३२३.७३	
११	घोराहि भैसाप्रथा लामाटोलमा डिप ट्यूवेल जडान घोराहि, दाङ्ग	दाङ	३०	१३५८०.१४	
१२	बर्कुलपुर डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना, बुद्धभूमि-९, कपिलबस्तु	कपिलवस्तु	३०	१२११९.५४	
१३	अम्बापुर डिप बोरिङ सिँचाई आयोजना तुलसीपुर १३ दाङ		३०	१४३०४.३४	
१४	नौगजवा फर्ममा डिप ट्रयूववेल जडान, शिवराज ७ नौगजवा कपिलवस्तु		३०	११४७५.२५	
	आ.व. २०७८/७९				
१	बेलाकुलो सिँचाइ योजना, राजापुर गा.पा. ०२ दाङ		२२०	७०७५६.००	
२	धम्पाखोला हरिगाउँ महेन्द्री सिँचाइ योजना, सुनिलस्मृती गा.पा. ०२ रोल्पा		९०	४८५०६.००	
३	गुनामखोला कालीजंग धनचौर सिँचाइ योजना, रुन्टीगढी गा.पा. ०१ रोल्पा		२५	१९७५५.००	
४	हुग्दीखोला तुराङ सिँचाइ योजना, चन्द्रकोट गा.पा. ०८ गुल्मी		८५	४८२२१.००	
५	झागरखोला सिँचाइ योजना, त्रिवेणी गा.पा. ०५ रोल्पा		२५	१९९५१.००	
६	कंचन सिँचाइ योजना, सैनामैना न.पा. १० रुपन्देही		२००	६९१०३.००	
७	कुमालटारी सिँचाइ योजना, गुल्मीदरबार गा.पा. ०६ गुल्मी		१००	४९९८०.००	
८	लाखर खोला सिँचाइ योजना, भुमे गा.पा. ०९ रुकुम		३५	१२५३३.००	
९	महेन्द्रकोट सिँचाइ योजना, बुद्धभुमी न.पा. ०१ कपिलवस्तु		५००	४७३४१.००	

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
१०	मानघाट सिँचाइ योजना, सुनिलस्मृती गा.पा. ०५ रोल्पा		४०	२४५१२.००	
११	मुलकुलो सिँचाइ योजना, बबइ गा.पा. ०५, दाङ	दाङ	८००	८०२८२.००	
१२	पुर्वे बाइसे सिँचाइ योजना, दंगीशरण गा.पा. ०६ र ०७, दाङ	दाङ	१०५०	९५०९४.००	
१३	धवाङ चुना कुलो सिँचाइ योजना, ऐरावति गा.पा. ५, प्यूठान	प्यूठान	३०	३१६१७.००	
१४	पाडेमाला जाबुने सिँचाइ योजना, झिम्रुक गा पा ०८, प्यूठान	प्यूठान	४८	३३३५४.००	
१५	हरियालि सिँचाइ योजना, प्यूठान न.पा. ०९	प्यूठान	६३	३४२३७.००	
१६	सेरावाङ सिँचाइ योजना, भुमे गा पा ५ रुकुमपूर्व		४०	२२६३९.००	
१७	टार ढिक लिफ्ट सिँचाइ योजना, स्वर्गद्वारी न.पा. ०५ प्यूठान		१२	२३१३७.००	
१८	सखुवानी सिं.यो., बर्दघाट-५ नवलपरासी			१३००७.००	
१९	भलुही सिं.यो., सुनवल-११ नवलपरासी			१४४५१.००	
२०	रावत गाउँ डिप ट्युवबेल सिंचाई आयोजना, तुल्सीपुर १६, दाङ	दाङ	३०	१२४८४.६२	
२१	श्रीगणेश डिप ट्युबवेल (२ गोटा) सिंचाई आयोजना दंगिसरण ६ थपगाउ दाङ	दाङ	६०	२१३१२.१५	
२२	सरुवाडाडा गोल्टाकुरी डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना दाङ	दाङ	३०	१०६९१.३४	
२३	कुइरेपानी डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना घोराही दाङ	दाङ	३०	१३५६८.९६	
२४	जुँगाटोल डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना बाणगंगा ४ जुँगा कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	६०	२००००	
२५	बेलरी डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना घोराही -७ दाङ	दाङ	३२	१२३९७.५८	

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
२६	जनकपुर र देबपुरा डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजना बुद्धभूमि १० कपिलवस्तु	कपिलवस्तु	६०	२१०००.००	
		आ.व. २०७७/७८			
१	चिउरीधारा सिँचाइ योजना, रोल्पा न.पा. १० रोल्पा		८०	३७४९०.००	
२	सेरावाङ सिँचाइ योजना, भुमे गा पा ५, रुकुमपूर्व	रुकुमपूर्व	४०	२५५२३.००	
३	राङ्सी सिँचाइ योजना, पुथा उत्तरगंगा गा पा १४ रुकुमपूर्व		२५	१७३९३.००	
४	लाखर खोला सिँचाइ योजना, भुमे गा.पा. ०९ रुकुमपूर्व		३५	१५२१४.००	
५	दबसे लिफ्ट सिँचाइ योजना, लुङ्ग्री गा पा २ रोल्पा		१८	१०८३५.००	
६	रानीगञ्ज डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना बुटवल उ.म.न.पा. १ रुपन्देही		३०	१०६८८.००	
७	सूर्यनगर क डिप बोरिङ सिँचाइ योजना, बर्दघाट न पा १६ नवलपरासी		३०	११४९२.००	
८	माकर डिप ट्युववेल सिँचाइ योजना, बर्दघाट न पा १ नवलपरासी		३०	१०८२८.००	
९	भेँडीखोर डिप ट्युववेल सिँचाइ योजना, कन्चन गा पा १ रुपन्देही		३०	१०३३६.००	
१०	बिजौरा लिफ्ट सिँचाइ योजना, बाँसगढी न पा. -२, बर्दिया	बर्दिया	२०	१३४७०.००	
११	कलमखोला सिंचाई योजना, सुनिल स्मृति गा. पा. -१ रोल्पा	रोल्पा	४५	१७६८५.००	
१२	घान्टुखोला सिंचाई योजना,रोल्पा न. पा. -२, रोल्पा	रोल्पा	४०	१९७८६.००	
१३	झरही उतरटोला लिफ्ट सिंचाई योजना	नवलपरासी	८०	३६११८.००	
१४	डौडारे देउराली डाँडाचौर सिंचाई योजना, चन्द्रकोट गा पा. -३ गुल्मी		३०	१७९१७.००	

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
१५	झेंदिखोला वामीटक्सार सिंचाई योजना, मुसीकोट न पा. -७, गुल्मी	गुल्मी	५०	२९७८६.००	
१६	रहबास मटेरी सिंचाई योजना, माथागढी गा पा. - ७, पाल्पा	पाल्पा	३८	२९८६३.००	
१७	कञ्चन भमरा दुमई खोला सिंचाई योजना, रैनादेवी छहरा ७, पाल्पा	पाल्पा	२६	२९४२८.००	
१८	चिडियादमार सिँचाइ योजना, माथागढी गा पा. - ३, पाल्पा	पाल्पा	३०	२७७४८.००	
१९	दंगिया पेटबनिया सिं.यो., सरावल नवलपरासी		४४०	२०२३३७.००	
२०	पाँचमोहनीया सिँचाइ योजना रुपन्देही		४३०	७७९४८.००	
२१	बल्छैया सिँचाइ योजना रासीसोनारी ५ बाँके		१३५	५८०३९.००	
२२	लालपुर लिफ्ट सिँचाइ योजना बाँके		९८	६८३१५.००	
२३	बाजाखर्क सिँचाइ योजना मालारानी ८ अर्घाखाँची		४३	१५२००.००	
२४	द्वारेखोला सिँचाइ योजना मालारानी ७ अर्घाखाँची		३३	२३१६१.००	
२५	काउले रातमाटा कैनपानी सिँचाइ योजना, झिम्रुक ८ प्यूठान	प्यूठान		३६२६२.००	
२६	लुपलुंग लिफ्ट सिँचाइ योजना नौविहानी ८ प्यूठान	प्यूठान		२२९४८.००	
२७	दागंवागं डाबर कुलो सिँचाइ योजना, ऐरावती १ प्यूठान	प्यूठान		२९६८८.००	
२८	उपाद्रे कुलो सिँचाइ योजना प्यूठान न पा ४ र २ प्यूठान	प्यूठान		४९३७०.००	
२९	कडेनी थापाचौर नौबिस्ता सिँचाइ योजना झिम्रुक ७ प्यूठान	प्यूठान		४३५४९.००	
३०	लहरीखोला सिँचाइ योजना माडी ३	रोल्पा	२५	१६३१८.००	


क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
३१	सुक्मी पचासे कुरुले सिँचाइ योजना सन्धिखर्क १ र २ प्यूठान	अर्घाखाँची	२२	२११३०.००	
३२	चिउरीबास सिँचाइ योजना पाणीनी ५	अर्घाखाँची		७७४६.००	
३३	रामनगर कृषक डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना, कृष्णनगर ११	कपिलवस्तु	४०	१०९७४.००	
३४	रासी २ भण्डारीटोल डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना	दाङ	२७	१०१६४.००	
३५	मधुवन कृषक डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना विजयनगर ७	कपिलवस्तु	४०	११३०४.००	
३६	सैनामैना डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना सैनामैना ६	रुपन्देही	३०	१०५७१.००	
३७	ललित डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना सैनामैना ९	रुपन्देही	३०	१२२४५.००	
३८	पाकरी डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना देवदह ८	रुपन्देही		११०८५.००	
३९	जय समइमाइ डिप ट्यूववेल गैडहवा ३	रुपन्देही		१०३२८.००	
४०	बालापुर डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना सैनामैना ५	रुपन्देही		१०८६९.००	
४१	लुम्बिनी हरीयाली कृषक डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना लुम्बिनी ११	रुपन्देही		१०६४९.००	
४२	पवित्रवस्ती डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना बर्दघाट १४	नवलपरासी		११७३९.००	
४३	धर्मबस्ती डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना, बर्दघाट १४	नवलपरासी		१०८००.००	
४४	कोटाइमाइ डिप ट्यूववेल रामग्राम १३	नवलपरासी		१२७५२.००	
४५	जयमाँ दुर्गा डिप ट्यूववेल रामग्राम १७	नवलपरासी		१०८१६.००	
४६	कोटस्थान डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना सरावल ४	नवलपरासी		१११११२.००	
४७	चनमाइ डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना गैडहवा ५	रुपन्देही		११५०७.००	


ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	योजनाको नाम र ठेगाना	जिल्ला	सिँचित क्षेत्रफल (हे)	कुल लागत अनुमान रु. हजारमा	कैफियत
४८	गुल्मी जिल्लामा स्टिल ट्यूबुलर पोल सप्लाइ कार्य	गुल्मी		६२७६०.००	
४९	भैंसेरुम्टा सिँचाइ योजना, मालिका ६	गुल्मी	६०	३६७८०.००	
५०	उनवच लिफ्ट सिँचाइ योजना रामग्राम न पा ८	नवलपरासी		३७५३५.००	
५१	नारायणपुर सिँचाइ प्रणाली, दाङ (प्रगन्ना सिँचाइ प्रणाली)	दाङ	४८०	२०४७२०.००	
	आ.व. २०७६/७७				
१	चौरासी फाँट सिँचाइ योजना, इस्मा ६	गुल्मी	११४	७०३५०.००	
२	गान्टारी सिँचाइ योजना, धुर्कोट ५	गुल्मी	६०	३११४२.००	
३	लौकेश्वर सिँचाइ योजना सुनवल	नवलपरासी	७२०	२६१२५२.००	
४	बेलारी सिं.यो., सुनवल	नवलपरासी		१६०९३.००	
५	चिउरागाड सिँचाइ योजना त्रिवेणी १ टुक्ला	रोल्पा	२५	१२८६६.००	
६	ठूलोखुङ्ग सिँचाइ योजना सुनिलस्मृति २	रोल्पा	६०	३६७१३.००	
७	घोडेखोला सिँचाइ योजना सुनिलस्मृति १	रोल्पा	७५	४९९३३.००	
८	किलाचौर बगाले सिँचाइ योजना, लुङ्ग्री ५	रोल्पा	३७	२४८८१.००	
९	बनियाभार सिँचाइ योजना वैजनाथ ४	बाँके		४३८५०.००	
१०	धुमैया सिँचाइ योजना रासी सोनारी ५	बाँके		४९२९८.००	
११	मैनार नदी लिफ्ट सिँचाइ योजना शिवराज ३	कपिलवस्तू	६६	३१६०५.००	
१२	बर्गदा पडरिया लिफ्ट सिँचाइ योजना महाराजगंज	कपिलवस्तू	५८	३२०८४.००	
१३	रिखोला बुर्तिवांग झिम पोवांग सिँचाइ योजना जेलवांग ५	रोल्पा		८२५६.००	
१४	राक सिँचाइ योजना राक २,४,७,९	रोल्पा		१४०२०.००	
१५	औल सिँचाइ योजना, गुमचाल ७,८,९	रोल्पा		२९०८२.००	
१६	धनुवा सिँचाइ योजना सुनिलस्मृति ६	रोल्पा		२५६८६.००	


अनुसूची ९ लुम्बिनी प्रदेशसँग सम्बन्धित नक्साहरु

Districts	Arghakhanchi	Banke	Bardiya	Dang	Gulmi	Kapilbastu	Palpa	Parasi	Pyuthan	Rolpa	Rukum East	Rupandehi	Province
Min Elevation	127	97	74	152	460	22	192	58	300	628	920	5	5
Max Elevation	2255	1222	1574	2044	2661	1257	2302	1476	3615	3630	7246	1143	7246

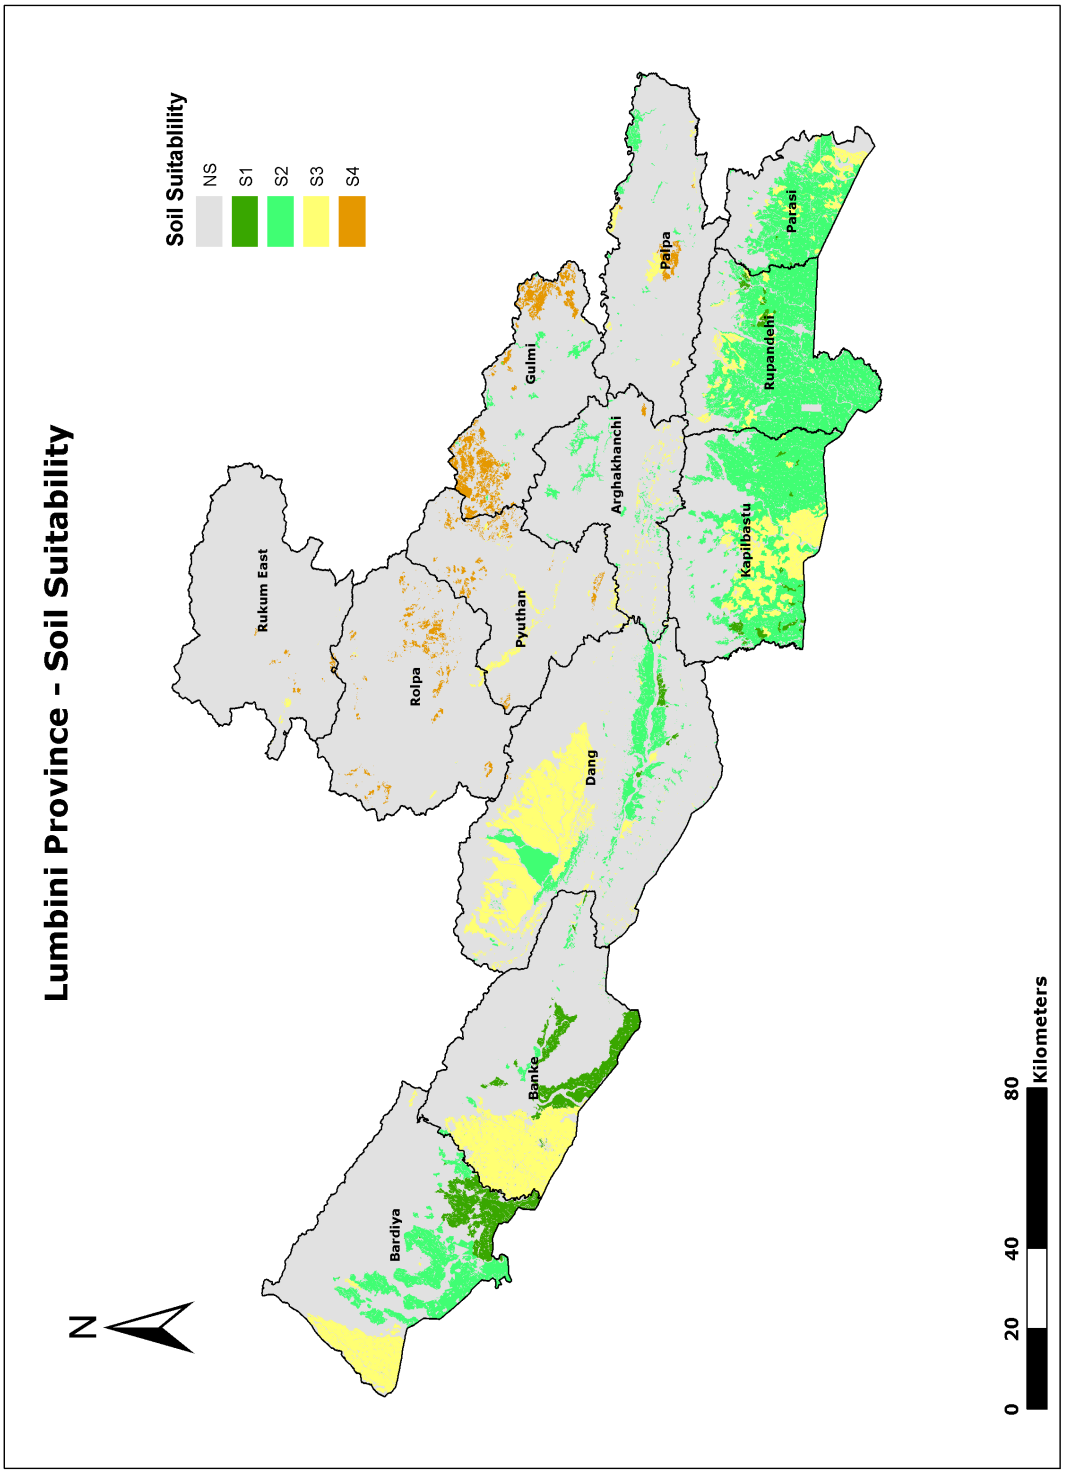
Lumbini Province - Soil Suitability
Soil Suitability
NS
S1
S2
S3
S4
Rukum East
Rolpa
Pyuthan
Gulmi
Arghakhanchi
Palpa
Dang
Parasi
Rupandehi
Kapilbastu
Banke
Bardiya
N
0
20
40
80
Kilometers

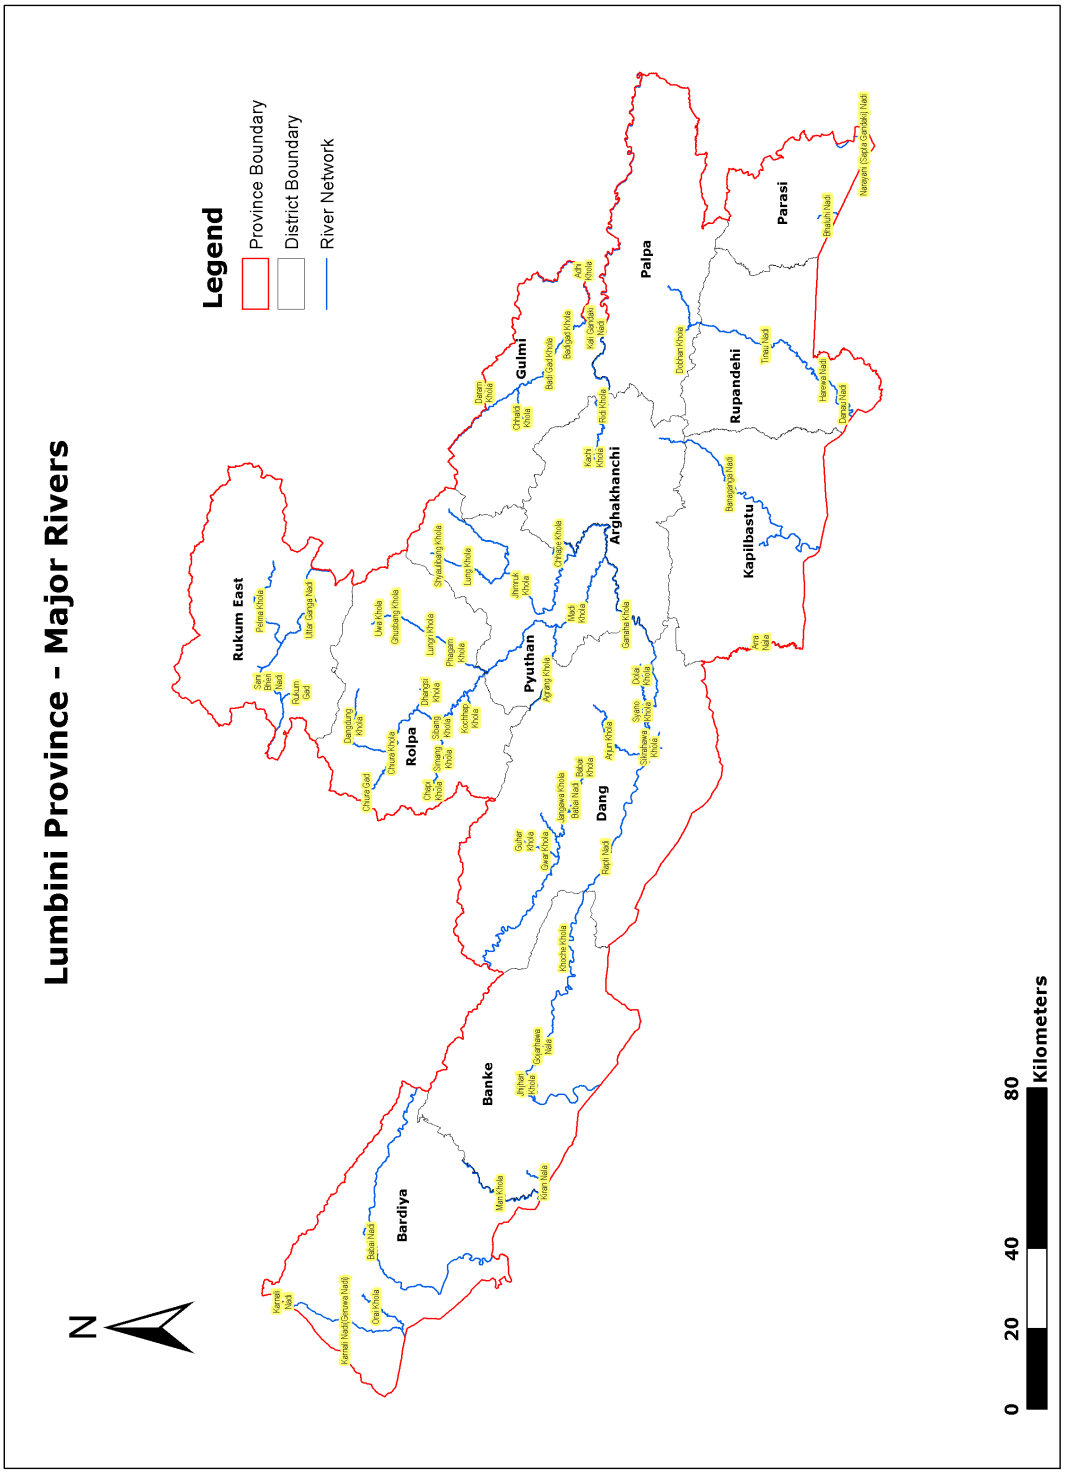
Lumbini Province - Major Rivers
Legend
Province Boundary
District Boundary
River Network
N
Rukum East
Rolpa
Pyuthan
Gulmi
Arghakhanchi
Palpa
Rupandehi
Kapilbastu
Parasi
Dang
Banke
Bardiya
Kilometers
0
20
40
80


Lumbini Province - Water Resources Potential

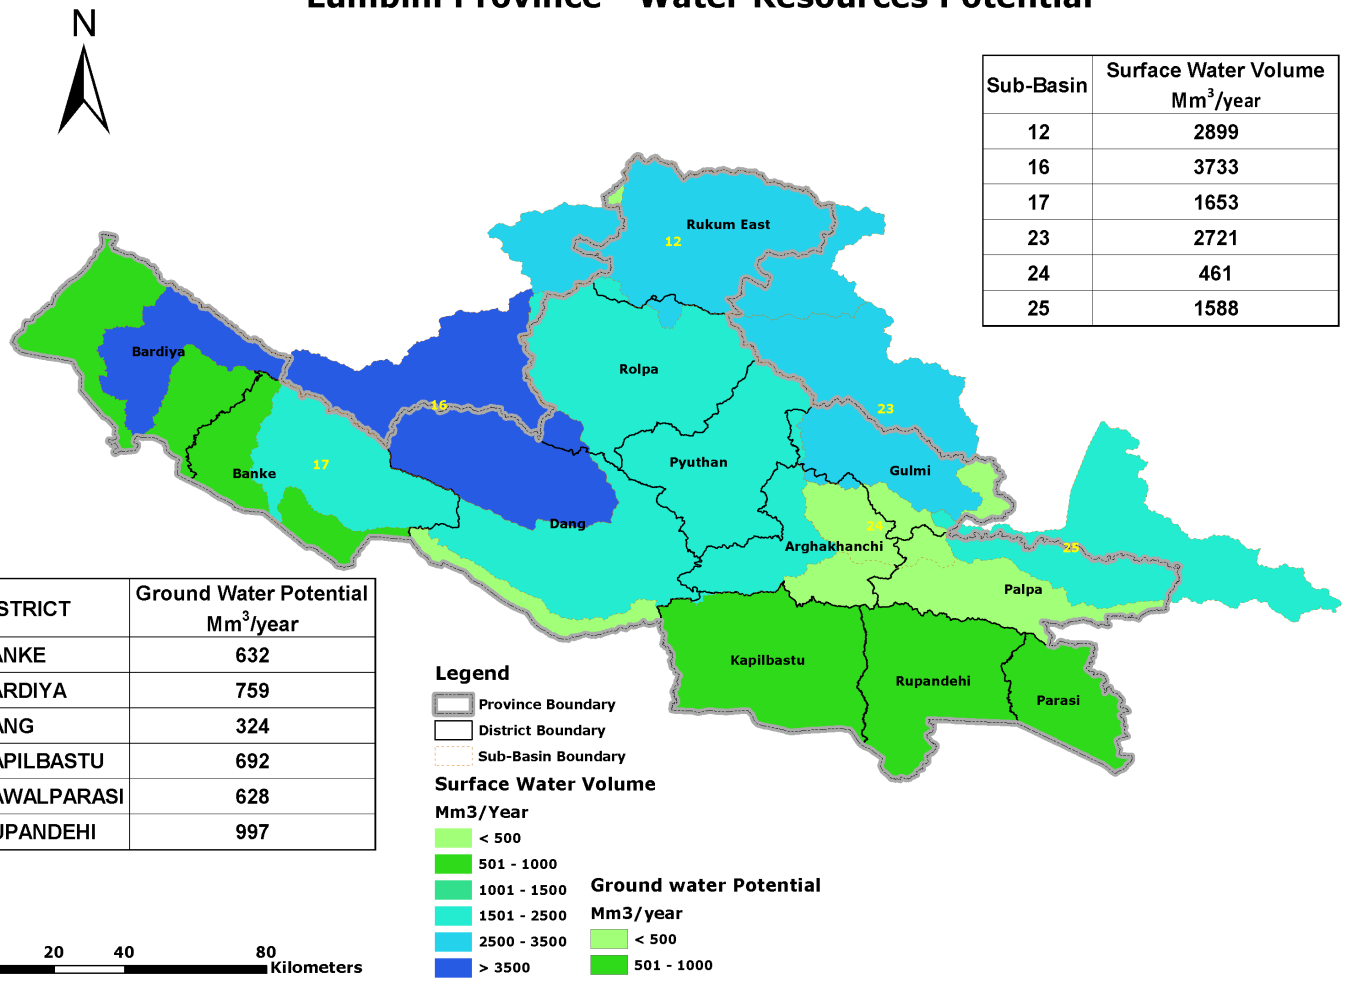


Sub-Basin	Surface Water Volume Mm^3/year
12	2899
16	3733
17	1653
23	2721
24	461
25	1588

DISTRICT	Ground Water Potential Mm^3/year
BANKE	632
BARDIYA	759
DANG	324
KAPILBASTU	692
NAWALPARASI	628
RUPANDEHI	997

Lumbini Province - 80th Percentile Reliable Specific Discharge for April
N
Sub-basin | l/s/km2
11 | 6.2
12 | 10.3
16 | 7.4
17 | 6.4
18 | 8.6
23 | 7.5
24 | 8.5
25 | 8.7
Rukum East
Rolpa
Pyuthan
Arghakhanchi
Gulmi
Palpa
Kapilbastu
Rupandehi
Parasi
Dang
Banke
Bardiya
Legend
Province Boundary
District Boundary
Reliable Specific Discharge
l/s/sqkm
6.0 - 7.0
7.0 - 8.0
8.0 - 9.0
9.0 - 10.0
10.0 - 11.0
0 20 40 80 Kilometers

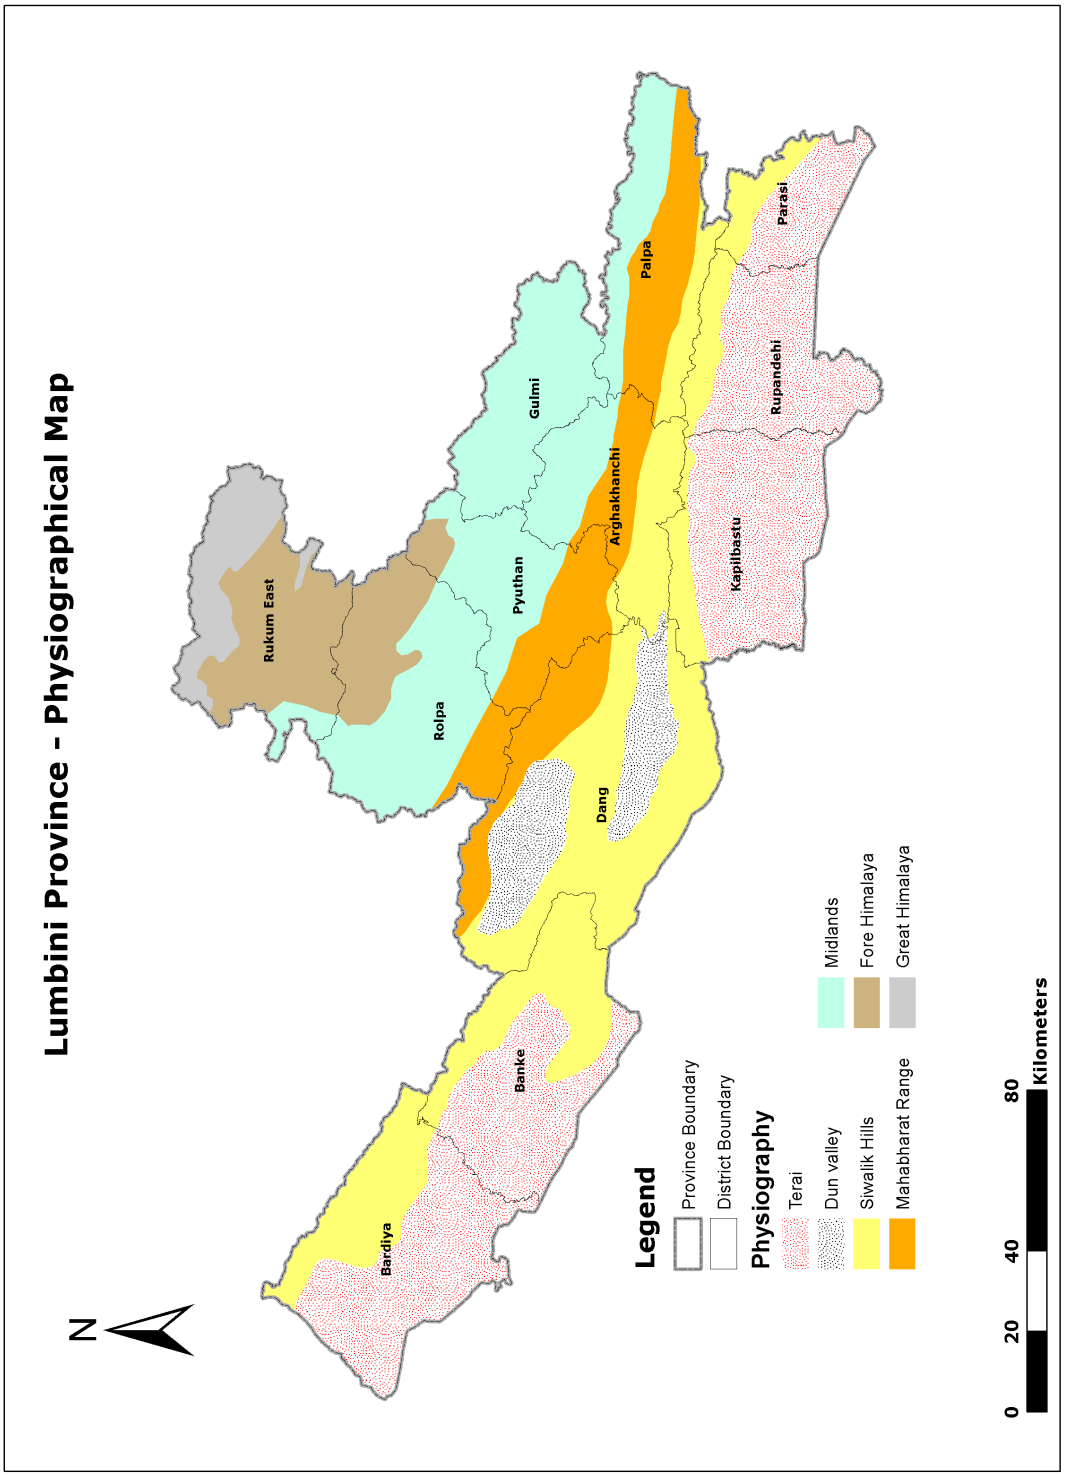
Lumbini Province - Physiographical Map
N
Rukum East
Rolpa
Pyuthan
Gulmi
Palpa
Arghakhanchi
Parasi
Rupandehi
Kapilbastu
Dang
Banke
Bardiya
Legend
Province Boundary
District Boundary
Physiography
Terai
Dun valley
Siwalik Hills
Mahabharat Range
Midlands
Fore Himalaya
Great Himalaya
0
20
40
80
Kilometers

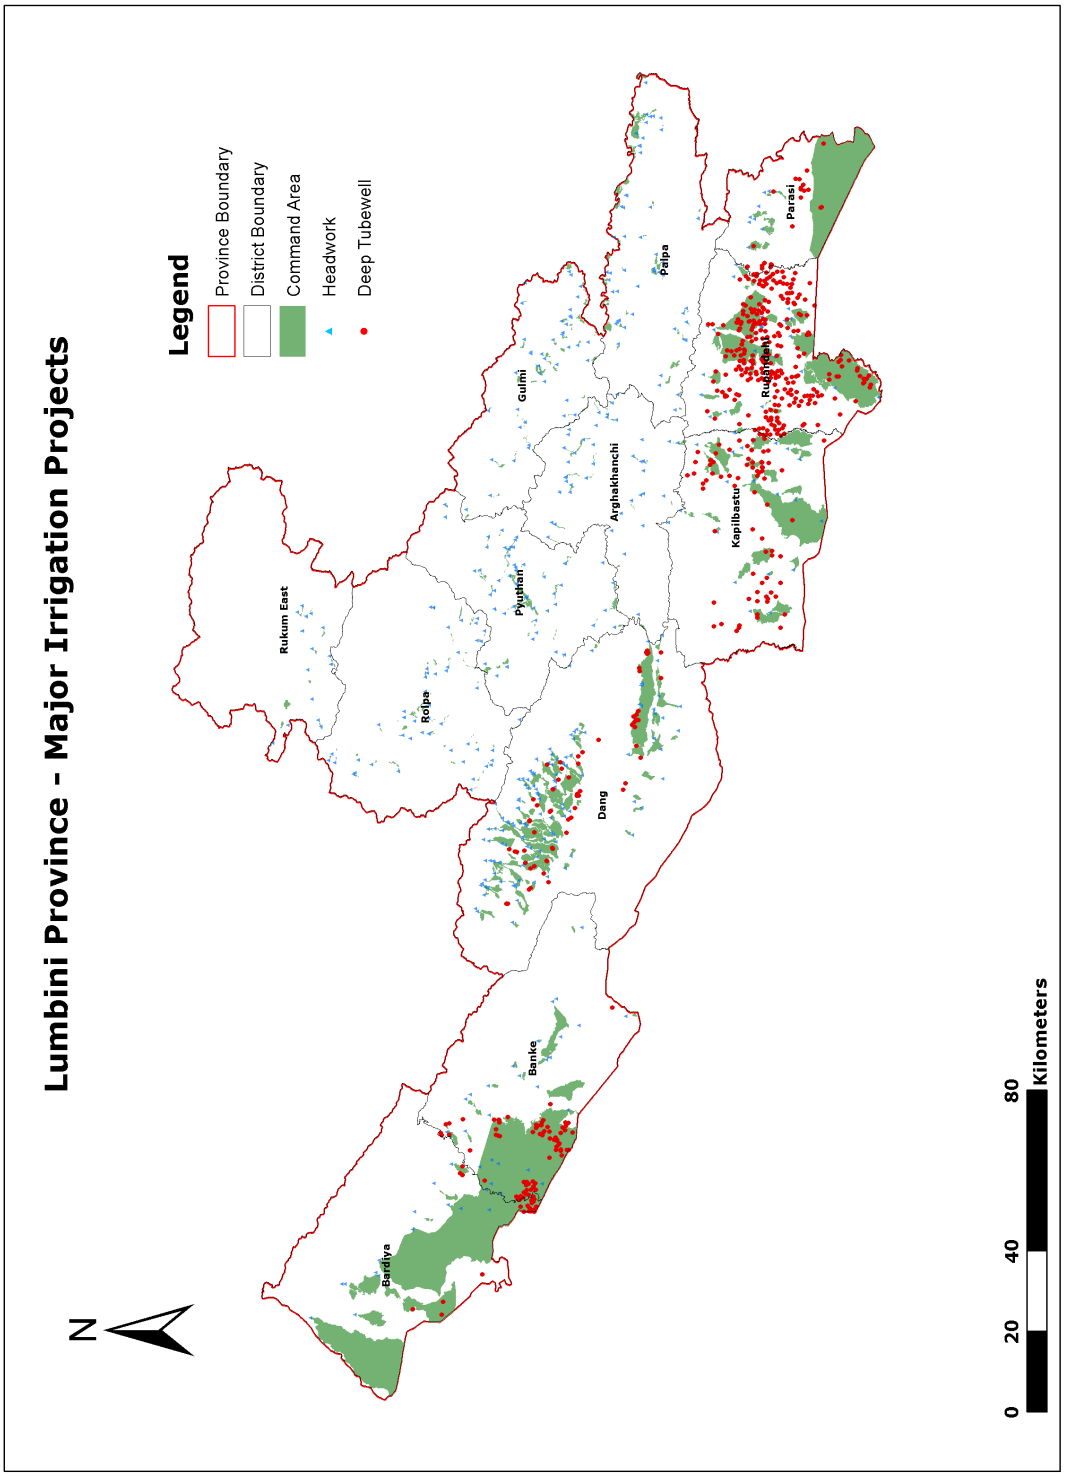
Lumbini Province - Major Irrigation Projects
Legend
Province Boundary
District Boundary
Command Area
Headwork
Deep Tubewell
N
Rukum East
Rolpa
Pyuthan
Gulmi
Arghakhanchi
Palpa
Dang
Banke
Bardiya
Kapilbastu
Rupandehi
Parasi
0
20
40
80
Kilometers

अनुसूची १०

Irrigation Inventry Data of Lumbini Province (IMP 2019)

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
Bardiya District					
1	Babai Ip	35421	30108	1999	Barbardiya MP,Banshgadhi MP, & Badhaiyatal RMP
2	Baragade Jamti Neulapur Ip	1614	1292	X	Thakurbaba MP, 2,3,4&5
3	Bhada Nala Ip	85	68	X	Barbardiya MP-9
4	Bhajana Ip	95	80.75	X	Banshgadhi MP-8
5	Chapla Nala (Chhegrare Bandh) Ip	222	178	X	Badhaiyatal RMP-6
6	Dhodhari Tara Tal Ip	5313	4516.1	2006	Madhuwan MP-4,5,6,7&8
7	Kaligaundi Ip	254	204	1992	Thakurbaba MP-7
8	Kuthara Laganiya Ip	410	328	2001	Banshgadhi MP-2 & 3
9	Manpur Mainapur Ip	553	470.05	X	Badhaiyatal RMP-5,6 & 7
10	Pahare Khola Ip	40	34	X	Barbardiya MP-9
11	Pratap Pur Ip	268	215	X	
12	Raja Pur Ip	17140	14569	X	Geruwa RMP & Rajapur MP
13	Rehu Khola Ip	307	246	2000	Bansgadhi MP-4 & 8
14	Suryapatuwa Ip	1280	1024	1997	Thakurbaba MP-8,9 & Madhuwan MP-1 & 2
15	Kaaligaudi		230		
16	Pratappur		235		
Banke District					
1	Aap Kholi Lift Ip	84	71.4	X	Kohalpur MP-13
2	Baniyabhar Ip	104	88.4	2002	Baijanath RMP-4
3	Betahani Lift Ip	159	135.15	2001	Duduwa RMP-5
4	Banaure Ip	126	101	X	Raptisonari RMP-5
5	Chharahawa Ip	205	174.25	X	Raptisonari RMP-5
6	Chisapani Naubasta Ip	264	212	1996	Baijanath RMP-1
7	Dunduwa Ip	1596	1250	1968	
8	Dhaulagiri Lift Ip	211	179.35	X	Khajura RMP-3

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
NISP	Babai Nadi	81° 22' 23.754"	28° 25' 14.586"	223
NISP	Jhamati Khola	81° 20' 40.722"	28° 25' 37.688"	15.09
MIP	Bhada Khola	81° 28' 51.571"	28° 20' 38.406"	7.53
MIP	Sateriya Nala	81° 29' 47.754"	28° 16' 16.079"	1.4
Central	Chapa Nala	81° 29' 6.023"	28° 10' 53.106"	7.91
MIP	Babai Nadi	81° 20' 15.365"	28° 25' 16.367"	70.45
NISP	Orai Khola	81° 19' 8.693"	28° 30' 3.486"	8.3
NISP	Kuthara Khola	81° 35' 17.875"	28° 15' 48.664"	4.8
ILC	Sateriya Nala	81° 29' 20.473"	28° 14' 36.517"	13.86
MIP	Jurpani Khola	81° 26' 28.258"	28° 20' 51.284"	1.14
ILC	Orai Khola	81° 19' 10.172"	28° 29' 38.818"	7.7
ILC	Geruwa Nadi	81° 14' 37.013"	28° 34' 8.389"	28
ILC	Sephahi Khola	81° 32' 41.766"	28° 18' 4.351"	10.9
ILC	Patachuli Khola	81° 15' 4.094"	28° 28' 21.885"	9.4
IWRMP				
IWRMP				
NISP	Aap Khola	81° 43' 59.570"	28° 13' 59.378"	1.318
NISP	Jethi Khola	81° 39' 43.421"	28° 14' 3.072"	3.31
ILC	Dundawa Khola	81° 42' 32.337"	28° 0' 41.753"	5
ILC	Binaure Khola	81° 49' 15.805"	28° 3' 28.840"	0.83
MIP	Chharahawa Khola	81° 49' 36.675"	28° 3' 0.261"	1.5
NISP	Man khola	81° 39' 18.097"	28° 16' 10.938"	4
DOI	Danduwa Khola	81° 41' 51.261"	28° 10' 55.340"	15.85
MIP	Kiran Nala	81° 34' 27.560"	28° 5' 53.151"	0.95

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
9	Dholiya Ip	80	68	X	Raptisonari RMP-2
10	Dhumaiya Ip	227	192.95	1996	Raptisonari RMP-5
11	Dundra Khola Ip	25	21.25	X	Raptisonari RMP-1
12	Fattepur Ip	1910	1528	X	Raptisonari RMP-6 & 7
13	Ghaiya Tal Ip	179	152.15	2002	Khajura RMP
14	Jhijhari Bangesal Ip	250	212.5	1999	Raptisonari RMP-9
15	Jhingaura Nala Ip	135	114.75	X	Baijanath RMP-8
16	Kiran Nala Ip	205	165	1997	Khajura RMP-1
17	Makai Bari Ip	62	50	X	Baijanath RMP-2
18	Man Khola Ip	33	28.05	X	Baijanath RMP-1
19	Man Khola Lift Ip	33	28.05	X	Khajura RMP
20	Nibuwa Farm Ip	166	141.1	1997	Kohalpur MP-12
21	Paruwa Ip	104	88.4	1996	Raptisonari RMP-2
22	Pathariya Ip	47	38	X	Raptisonari RMP-4
23	Raj Kulo Ip	1723	1464.6	X	Raptisonari RMP-3 & 4
24	Sikta Ip	31003	26353	X	
25	Simalghari Surface Lift Ip	35	30	X	Khajura RMP-6
26	Suiya Khola Ip	50	42.5	X	Narainapur RMP
27	Thapuwa Tititariya Ip	104	88.4	X	Baijanath RMP-8
28	Thulo Khola Ip	42	35	X	Baijanath RMP
29	Thure Ip	95	76	X	Raptisonari RMP-8
30	Puraina Tal	300		X	Nepalgunj SMP-22
31	Ti Tariya	25		X	Baijanath RMP-8
32	Maan Khola	41		X	Baijanath RMP
33	Shuruw(Guruwa Gaun)	200		X	Janaki RMP
Dang District					
1	Aamkholi Chira Ip	117	94.00	X	Babai-07
2	Aghara Ip	74	60.00	X	Ghorahi-06
3	Amare Bandh Ip	178	143.00	X	Ghorahi-10
4	Ambapur Kulo Ip	135	114.75	X	Ghorahi-17,18

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय राप्ति उपत्यका, देउखुरी, दाङ

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
MIP	Dholiya Khola	82° 7' 3.616"	27° 58' 53.146"	2.45
NISP	Dhumaiya Khola	81° 52' 23.165"	28° 1' 36.934"	5.44
NISP	Dundra khola	81° 51' 47.638"	28° 4' 34.218"	1.63
ILC	Rapati River	81° 45' 41.059"	28° 4' 38.783"	12.99
ILC	Pedari Nala,Ghaiya Tal	81° 35' 48.631" & 81° 35' 20.429"	28° 10' 34.825" & 28° 9' 44.657"	1.8, 1.25
MIP	Bangesal Khola	81° 45' 45.823"	28° 11' 3.218"	2.51
ILC	Jethi Nala	81° 32' 36.310"	28° 10' 37.948"	2.45
ILC	Kiran Nala	81° 32' 38.331"	28° 4' 1.224"	1.3
ILC	Man Khola	81° 39' 9.996"	28° 16' 1.485"	0.38
NISP	Man Khola	81° 39' 34.508"	28° 16' 25.132"	0.55
ILC	Man Khola Pumping	81° 31' 50.042"	28° 11' 17.691"	1.1
NISP	Rohini Khola	81° 44' 37.025"	28° 13' 22.564"	6.51
ILC	Paruwa Sota River	81° 47' 6.278"	28° 6' 58.949"	2.5
NISP	Pathariya Khola	81° 53' 52.095"	27° 59' 14.058"	2.5
Central	Rapti River	81° 57' 28.599"	28° 2' 12.617"	16.1
	Rapti River	81° 57' 6.959"	28° 2' 41.079"	47
ILC	Maan Khola	81° 31' 21.599"	28° 9' 27.344"	0.8
NISP	Suiya Khola	81° 55' 5.469"	27° 53' 7.807"	1.62
ILC	Jethi Nala	81° 34' 55.554"	28° 12' 8.787"	2.69, 4.81
NISP	Thulo Khola	81° 40' 29.353"	28° 16' 36.256"	1.13
	Paruwa Sota River	81° 48' 25.270"	28° 7' 48.944"	2.09
	Dunduwa Khola			
	Titiriya Khola			
	Maan Khola			
	Taal			
	Aamkholi	82° 14' 55.961"	28° 1' 0.224"	1.56
	Katuwa Khola	82° 27' 28.570"	27° 58' 49.457"	1.68
	Hapur Khola	82° 26' 2.469"	28° 5' 6.395"	6.20
	Katuwakhola	82° 30' 59.018"	28° 3' 3.216"	2.46

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
5	Arghara Ip	238	202.30	2002	Ghorahi-06
6	Arjun Khola Ip	500	400.00	1992	Lamahi-06
7	Ashwara Kulo Ip	160	128.00	X	Tulsipur-08
8	Awsara Dabara Ip	144	116.00	X	Tulsipur-08
9	Badhare Kulo Ip	167	134.00	X	Ghorahi-12
10	Bahundanda Ip	401	340.85	X	Ghorahi-13
11	Bahundanda Ip	152	122.00	X	Ghorahi-14
12	Balim Khola Ip	189	152.00	X	Ghorahi-02
13	Bangaunle Kulo Ip	268	210.00	X	Ghorahi-10
14	Barau Khola Ip	129	103.00	2002	Shantinagar-07
15	Baruwagaunle Kulo Ip	235	199.75	X	Tulsipur-06,12
16	Basgajedi Ip	36	30.00	X	Ghorahi-12
17	Bastikhola Ip	330	280.50	X	Shantinagar-03,04
18	Bayale Simtaram Ip	243	206.55	X	Shantinagar-04,03
19	Bela Chhap Ip	136	115.60	X	Rajpur-03
20	Bela Ip	285	242.25	X	Rajpur-02
21	Belanne Kulo Ip	215	172.00	X	Ghorahi-08
22	Belghare Ip	165	140.25	1989	Dangisharan-06
23	Bhaisakurma Ip	219	186.15	2002	Ghorahi-03,04
24	Bhamaisota Ip	243	200.00	X	Ghorahi-10
25	Bhamaki Ip	48	39.00	X	Tulsipur-15
26	Bhamaki Kumalgadi Ip	231	196.35	X	Tulsipur-01
27	Bhote Daha Ip	16	13.00	X	Ghorahi-02
28	Budhaure Bandh Ip	202	162.00	X	Ghorahi-10
29	Bulbule Ip	61	49.00	1989	Ghorahi-11
30	Chamai Satgaiya Ip	407	345.95	2002	Ghorahi-06
31	Charange Gad Ip	71	60.00	X	Ghorahi-02,01
32	Chauwa Khola Ip	530	450.00	1996	Tulsipur-18,15

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
NISP	Katuwa Khola	82°28' 48.095"	28°0' 53.636"	4.85
GON	Arjun Khola	82°30' 15.034"	27°52' 49.338"	1.50
	Bhamake Khola	82° 15' 45.820"	28° 9' 30.263"	3.18
IWRMP	Bhamaki Khola	82°15' 54.015"	28°10' 17.766"	4.00
	Ranigadh	82° 18' 5.527"	28° 8' 47.655"	1.51
CARE Nepal	Siwar Khola	82°29' 39.404"	28°4' 46.888"	6.45
	Sewarkhola	82° 26' 51.546"	28° 5' 55.296"	4.11
	Balim Khola	82° 26' 44.488"	28° 2' 25.113"	3.18
	Sapgaiyan Sota	82° 32' 55.181"	28° 0' 15.371"	3.30
NISP	Barau Khola	82°10' 39.287"	28°7' 17.737"	1.50
IWRMP	Patukhola	82° 25' 5.336"	28° 4' 43.166"	3.82
IWRMP	Tharubas Mulgeriya,Gaera Khola	82°24' 2.097" & 82°24' 8.192" &82°24' 18.193"	28°7' 3.926" & 28°7' 6.169" & 28°7' 1.341"	1.80
	Basti Khola	82° 12' 55.301"	28° 11' 49.403"	4.54
	Bhimalegaira/Keraghari-Bhitri Khola	82° 13' 25.195"	28° 11' 25.790"	5.00
	Karanga Khola	82° 23' 54.408"	27° 52' 2.618"	3.37
MIN	Lomari Khola	82°26' 59.577"	27°48' 21.888"	5.00
	Simpani	82° 22' 59.091"	28° 1' 18.621"	2.84
GON	Hatti Khola	82°12' 38.874"	28°7' 46.766"	5.00
NISP	Sisne Khola	82°30' 10.938" & 82°30' 52.883"	28°0' 15.346" & 28°1' 32.979"	8.20
	Jyamire/Hapur Khola	82° 24' 18.547"	28° 4' 24.692"	5.60
	Babai	82° 19' 46.602"	28° 2' 48.453"	1.64
MIP	Bhamaki Khola	82°15' 56.845"	28°10' 25.162"	4.00
NISP	Bhote Daha	82°33' 21.962"	27°59' 50.572"	1.70
	Larena Sota	82° 23' 35.290"	28° 1' 22.576"	2.70
ADB/N	Uneria Khola	82°25' 41.726"	28°5' 57.582"	3.60
NISP	Katuwa Khola	82°29' 8.181"	28°1' 23.775"	6.60
MIN	Charange Daha	82°33' 40.827"	27°59' 33.751"	2.40
ILC	Chauwa Khola + Hurhure Khola	82°20' 54.738"	28°6' 17.412"	2.00

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
33	Chhote Kulo Ip	180	153.00	X	Tulsipur-1
34	Chiliya Manikapur Ip	101	85.85	1996	Gadhawa-04
35	Chiregad Ip	67	54.00	2000	Shantinagar-04
36	Chiregadh Ip	306	245.00	X	Dangisharan-06,07
37	Chunpole Ip	70	59.50	X	Shantinagar-02
38	Chyanti Khola Ip	152	130.00	2002	Babai-06
39	Dabara Isp		215.00	X	Tulsipur-08
40	Dangi Chira Ip	110	88.00	X	Tulsipur-13
41	Dohote Kulo Ip	51	43.35	X	Babai-02
42	Dudharas Kulo Ip	150	128.00	X	Tulsipur-18
43	Gairagaun Ip	92	74.00	1999	Ghorahi-02
44	Gangdi Ip	83	67.00	1995	Rajpur-06
45	Ghorahamanpur Ip	517	439.45	1989	Gadhawa-6,7
46	Ghorteni Ip	29	24.00	1994	Tulsipur-04
47	Gobardiha Badkapath Ip	453	385.05	1997	Ghadawa-01,02
48	Gobardiha Badkapath Ip	453	385.05	1997	Ghadawa-01,02
49	Guhar Khola Ip	160	128.00	X	Tulsipur-19
50	Gurje Khola Ip	110	93.50	X	Ghorahi-12
51	Halwar Ip	507	430.95	1989	Tulsipur-19
52	Hapur Gurje Ip	71	57.00	2000	Ghorahi-12
53	Hasanapur Ip	121	97.00	X	Tulsipur-11
54	Hekuli Kulo Ip	221	187.85	X	Dangisharan-05
55	Jamera Kulo Ip	355	301.75	X	Tulsipur-16
56	Jurah Kulo Ip	66	53.00	X	Ghorahi-12
57	Jyamire Gurje Khola Ip	154	130.90	X	Ghorahi-10
58	Kachela Kachili Ip	198	159.00	1996	Tulsipur-11
59	Kachhare Kulo Ip		500.00	X	Ghorahi-07
60	Kalamghari Ip	49	40.00	X	Ghorahi-10
61	Kanda Khuti Ip	124	100.00	X	Ghorahi-01,02
62	Kanjuwar Ip	51	41.00	1989	Tulsipur-15
63	Karjahi Satgaya Kulo Ip	435	369.75	2006	Ghorahi-06

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
IWRMP	Bhamki Khola	82°16' 1.960"	28°11' 23.974"	4.25
ILC	Kakrawa Khola	82°33' 26.922"	27°46' 18.600"	2.50
NISP	Chiregad Khola	82°13' 12.119"	28°9' 25.839"	4.30
	Chiregadh	82° 12' 33.156"	28° 7' 26.882"	7.32
MIP	Chunpole Khola	82°12' 40.487"	28°12' 2.270"	3.50
GON	Chantte Khola	82°9' 12.235"	28°12' 24.899"	3.35
MIP				
	Dangi Chira	82° 16' 36.137"	28° 0' 17.261"	1.84
IWRMP	Bansghari khola	82°44' 12.514"	27°57' 35.454"	1.54
MIP	Sangram Khola	82°22' 59.759"	28°7' 7.279"	4.00
NISP	Katuwa Khola	82°29' 34.589"	28°2' 7.036"	4.60
ADB/N	Gangdi Khola	82°19' 27.624"	27°52' 17.191"	1.40
GON	Rapti River	82°35' 43.657"	27°49' 21.146"	7.00
ADB/N	Sirse Khola	82°20' 13.852"	28°11' 0.702"	0.78
ILC	Rapti River	82°42' 52.237"	27°49' 1.284"	9.38
ILC	Rapti River	82° 38' 7.076"	27° 48' 51.292"	6.75
	Guhar Khola	82° 21' 44.873"	28° 9' 9.866"	17.84
	Gurje Khola	82° 28' 4.410"	28° 5' 32.026"	2.97
GON	Guhar Khola	82°23' 38.631"	28°10' 6.034"	13.00
NISP	Gurje Khola	82°27' 48.689"	28°5' 17.701"	2.30
	Paddako Mul	82° 13' 50.462"	28° 3' 20.209"	4.15
	Chiregadh	82° 12' 49.948"	28° 7' 29.162"	6.01
	Sakram Khola	82° 19' 11.097"	28° 6' 32.546"	8.01
	Jurah	82° 27' 42.165"	28° 5' 4.593"	1.85
	Gurje/Jyamire Khola	82° 25' 33.939"	28° 4' 50.538"	3.10
ILC	Guhar Khola	82°17' 17.400"	28°4' 19.986"	3.69
MIP				
	Gurje Khola	82° 27' 41.862"	28° 5' 9.153"	3.58
	Kandakhuti	82° 33' 12.027"	27° 58' 28.302"	4.71
ADB/N	Pathkuli Khola	82°18' 57.341"	28°3' 46.117"	3.30
MIP	Katuwa Khola	82°29' 0.352"	28°1' 15.990"	6.89

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
64	Karmatuwa Ip	59	48.00	1995	Ghorahi-9
65	Katuki Ip	175	140.00	X	Ghorahi-08
66	Katuwa Khola Ip	307	246.00	1996	Ghorahi-18,15
67	Khacharey Kulo Ip	547	464.95	2006	Ghorahi-07
68	Kimuwa Gajari Mul Ip	169	136.00	X	Tulsipur-15
69	Kirikulo Ip		90.00	X	Ghorahi-17
70	Korbang Ip	210	178.50	X	Shantinagar-06
71	Kunhara Bandh Ip	135	114.75	X	Ghorahi-10
72	Kwang Khola Ip	220	187.00	X	Tulsipur-11
73	Larene Sota Ip	294	245.00	X	Ghorahi-08
74	Lohadabre Ip	867	736.95	X	Tulsipur-14,15,16,17
75	Lohasur Ratanpur Ip	98	79.00	X	Ghorahi-15
76	Lovely Kulo Ip	429	350.00	X	Tulsipur-15,17
77	Mag Khola Ip	29	24.00	2001	Shantinagar-02
78	Mah Kulo Ip	103	83.00	2001	Shantinagar-03
79	Majh Kulo Ip	101	81.00	X	Shantinagar-04
80	Malware Beldhakuwa Ip	487	413.95	X	Tulsipur-17,15
81	Malware Kulo Ip	937	800.00	X	Tulsipur-17,15
82	Manakapur Kulo Ip	204	173.40	X	Tulsipur-18
83	Mani Kulo Ip	121	102.85	X	Tulspur-17,18
84	Manikapur Ip	87	75.00	1999	Tulsipur-01,02
85	Manpur Kulo Ip	116	93.00	X	Tulsipur-19
86	Manpure Kulo Ip	407	345.95	1994	Tulsipur-18
87	Maya Khola Ip	74	62.90	X	Dangisharan-04
88	Mugraidha Khola Ip	133	107.00	X	Rajpur-04
89	Nawalpure Kulo Ip	797	638.00	X	Tulsipur-11
90	Oinera Ip	60	51.00	X	Ghorahi-12
91	Ordawa Ip	105	84.00	X	Ghorahi-5
92	Padhdha Kulo Ip	134	108.00	X	Tulsipur-06
93	Parsaduwa Ip	177	142.00	1995	Dangisharan-06

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
SI	Gargi Sota Khola	82°21' 46.652"	28°2' 53.533"	2.40
	Laraina Sota	82° 21' 56.685"	28° 1' 6.911"	3.16
ILC	Katuwa Khola	82°30' 15.015"	28°2' 45.953"	5.36
MIP	Gurje Khola	82°25' 55.362"	28°2' 23.502"	5.57
	Gajari Mul	82° 18' 32.757"	28° 2' 12.934"	3.36
MIP				
IWRMP	Baulaha Khola	82°7' 44.207"	28°7' 55.591"	1.50
	Sarema Sota	82° 24' 52.882"	28° 4' 35.841"	2.11
GON	Hapur Khola	82°16' 29.459"	28°4' 41.743"	4.30
MIP	Larena Sota Khola	82°22' 50.005"	28°2' 50.940"	2.35
IWRMP	Patre Khola	82°22' 18.607"	28°4' 17.140"	7.60
	Sewarkhola	82° 28' 54.850"	28° 2' 47.091"	2.81
MIP	Chauwa Khola	82°20' 40.983"	28°6' 7.348"	2.65
NISP	Dharapani Khola	82°11' 23.315"	28°11' 34.364"	1.40
NISP	Baulaha Khola	82°12' 23.770"	28°11' 5.134"	4.30
NISP	Baulaha Khola	82°12' 25.897"	28°11' 24.384"	1.80
IWRMP	Guhar Khola	82° 19' 1.223"	28° 6' 34.086"	7.93
MIP	Guhar Khola	82°21' 8.352"	28°8' 23.296"	8.25
	Guhar Khola	82° 23' 5.983"	28° 7' 13.974"	4.00
DDC	Lama Khola,Pakariyajhiki Sota	82°21' 6.744"	28°6' 51.109"	2.19
ILC	Bhumhe Khola	82°15' 45.643"	28°9' 37.336"	4.40
	Guhar Khola	82° 20' 57.369"	28° 7' 52.811"	3.41
IWRMP	Gwar Khola	82°21' 13.582"	28°8' 33.931"	6.00
NISP	Maya Khola	82°13' 20.461"	28°7' 1.764"	3.14
	Mugraidha Khola	82° 23' 9.931"	27° 51' 2.513"	3.27
	Sirsota	82° 15' 24.528"	28° 6' 34.022"	7.09
IWRMP	Oniera khola	82°26' 8.042"	28°6' 16.002"	4.00
	Babai Khola	82° 22' 38.173"	28° 0' 27.762"	5.20
	Padhdha Sota	82° 17' 54.351"	28° 5' 59.629"	3.44
ADB/N	Chiregar Khola	82°12' 32.982"	28°7' 26.900"	6.40

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
94	Pathkauli Bandh Ip	175	148.75	X	Tulsipur-15
95	Patu Khola Ip	335	284.75	X	Tulsipur-06
96	Phalakpur Ip	347	294.95	1989	Lamahi-05,06
97	Pragnna Ip	6092	5178.20	X	Rapti-01,02,03,04,08,05,06,07, Lamahi-05,06
98	Prasiya Kulo Ip	125	100.00	X	Ghadawa-05
99	Rajpure Kulo Ip	179	144.00	X	Ghorahi-07
100	Rakse Chour Ip	47	40.00	X	Tulsipur-03,04
101	Rampurrsimal Tar Ip	147	124.95	1995	Ghorahi-02
102	Ranigad Ip	217	174.00	1996	Tulsipur-07
103	Ranigar Khola Ip	30	25.50	X	Tulsipur-04,07
104	Ransing Khola Ip	146	124.10	X	Gadhawa-01
105	Ratanpur Ip	170	144.50	1997	Ghorahi-12
106	Ratgaiyan Kulo Ip	635	500.00	X	Tulsipur-18,17
107	Ratnapur Ip	116	93.00	1997	Ghorahi-1
108	Sakram Khola Dudharas Isp		550.00	X	Tulsipur-18
109	Salgari Ip	231	200.00	2001	Babai-06
110	Satgaule Sir Kulo Ip	415	332.00	2001	Tulsipur-4,5,7,8
111	Saudi Kulo Ip	564	452.00	1989	Ghorahi-10
112	Saudiyar Kulo Ip	254	200.00	X	Ghorahi-07
113	Semari Motipur Kulo Ip	129	104.00	X	Gadhawa-07
114	Shir Khola Ip	654	524.00	X	Tulsipur-04
115	Shir Kulo Ip	92	74.00	2002	Tulsipur-01
116	Shirkatt Ip	118	95.00	X	Tulsipur-03,04,07,05,06
117	Simpani Ip	137	110.00	X	Dangisharan-04
118	Sirkatti Ip	143	121.55	X	Tulsipur-01
6	Sonpurnarti Ip	26	22.10	1994	Lamahi-06
120	Supaila Ip	609	488.00	X	Gadhawa-03
121	Supaila Parashpur Ip	251	201.00	X	Gadhawa-04
122	Supaila Paraspur Parseni Ip	192	154.00	X	Gadhawa-04

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
	Guhar Khola	82° 19' 31.393"	28° 2' 34.531"	3.26
IWRMP	Patu Khola	82°16' 59.092"	28°7' 20.174"	4.10
DOI	Bhulke Khola	82°36' 47.760"	27°51' 7.645"	7.66
GON	Rapti River	82°45' 25.867" & 82°39' 48.737" & 82°39' 38.970" & 82°39' 33.679"	27°50' 13.947" & 27°51' 4.026" & 27°51' 0.735" & 27°51' 9.795"	218.00
	Khadkapur	82° 32' 23.473"	27° 49' 26.682"	2.58
	Sewar Khola	82° 27' 34.249"	28° 2' 14.859"	5.51
MIN	Sir Khola	82°18' 51.226"	28°11' 38.793"	5.30
MIP	Balim Khola	82°32' 19.763"	27°59' 56.433"	2.00
ILC	Ranigad Khola + Santi Khola	82°20' 20.344"	28°10' 9.865"	3.69
MIP	Rani Khola	82°20' 2.917"	28°9' 9.759"	1.90
	Ransing, Mathura Khola	82° 46' 14.682"	27° 48' 25.723"	4.09
NISP	Hapur Pendya Khola	82°26' 57.888"	28°7' 4.908"	3.90
IWRMP	Gwar Khola	82°20' 42.376"	28°7' 43.511"	6.00
ILC	Sewat Khola	82°29' 8.024"	28°3' 11.271"	4.50
MIP				
NISP	Bandre Khola	82°9' 35.074"	28°12' 41.744"	5.90
NISP	Patu Khola	82°18' 40.662"	28°10' 58.046"	5.90
GON	Hapur Khola	82°27' 0.846"	28°6' 32.373"	11.75
MIP	Sewar Khola	82° 26' 35.134"	28° 2' 17.218"	4.16
	Rapti River	82° 30' 56.148"	27° 48' 35.173"	2.12
ILC	Patu Khola	82°18'41.006"	28°10'58.512"	3.50
NISP	Bhamki Khola	82°18' 16.573"	28°9' 16.543"	1.50
GON	Patu Khola	82°16' 2.610"	28°10' 46.832"	3.55
	Simpani	82° 13' 8.602"	28° 5' 4.053"	2.69
	Raintakura/ Sisnekhola	82° 14' 16.710"	28° 10' 14.273"	3.54
ADB/N	Singai Khola	82°36' 58.504"	27°51' 22.967"	2.30
	Supaila Khola	82°36' 42.884"	27°46' 3.497"	7.20
ILC	Kapalihawa Khola	82°35' 12.890"	27°48' 21.484"	3.20
	Kapalihawa	82° 36' 20.409"	27° 49' 30.492"	3.41

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
123	Thati Kulo Ip	31	26.00	2001	Ghorahi-17
124	Urahari Jaspur Hemnagar Kulo Ip	324	260.00	X	Tulsipur-06,11
Kapilbastu District					
1	Banganga Ip	10734	9123.90	1980	Banganga NP, Kapilvastu NP, Yashodhara RMP
2	Baraipur (Kanchania) Pond [Lift] Ip	70	59.50		Maharajgunj -4,5
3	Bethi Ip	489	415.65		Suddodhan -6
4	Bhadehar Ip	419	356.15	2001	Yashodhara -2
5	Bhutaha Ip	2000	1600.00	1996	Suddodhan-2
6	Dohani Ip	513	436.05	1996	Kapilvastu -7
7	Dubiya Pond [Lift] Ip	61	51.85		Buddhabhumi-3
8	Galaha Banguwa Ip	800	680.00		Banganga-2
9	Gangaulia Gautiariwa Ip	166	141.10		Banganga-3
10	Ghaghawa Ip	477	375.00	1999	Banganga-10,11
11	Gudrung Khola		400.00		Buddhabhumi -3,4
12	Hudarwa Ip	373	317.05	1997	Banganga-11
13	Jabai Sakuni Ip	1758	1494.30	1996	Shivraj-3
14	Jahadi Ip	234	198.90	1996	Kapilvastu -11
15	Kanchaniya Ip	310	263.50		Maharajgunj-9
16	Karma Ip	126	101.00	1992	Suddodhan -6
17	Mahendrakot Ip	434	368.90	2003	Buddhabhumi -1
18	Mudila Ip		400.00		Yashodhara -5
19	Patherdaiya Ip	1375	1168.75	2002	Bijaynagar -3 & Krishnanagar -9
20	Phulika Ip	582	494.70	1996	Mayadevi -3
21	Rangapur Sagar Pond [Lift] Ip	50	42.50		Yashodhara -6
22	Sayar Bandh Ip	757	643.45		Krishnanagar-8
23	Singreyghat Ip	2594	2204.90	2006	Banganga -3,4,5,6,8

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
NISP	Sisne Khola	82°29' 55.577"	28°0' 58.250"	1.60
	Guhar Khola	82° 17' 43.223"	28° 5' 32.344"	5.51
DOI	Banganga River	83°21'38"	28°07'27"	20.45
NITP	Kanchania Khola	83°05'08"	28°10'47"	2.20
IWRMP	Bethi River	83°26'49"	28°01'26"	4.00
ILC	Jamuwar Khola	83°11'57"	28°05'45"	3.80
	Bhutaha Khola	83°03'14"	28°13'55"	8.50
ILC	Jamuwar Khola	83°25'04"	28°00'35"	5.50
NITP	Gudrung River,Spring & Runoff	83°24'14"	28°05'29"	1.20
IWRMP	Sukli Khola	83°16'31"	28°11'02"	4.00
IWRMP	Gangauliya Nala	83°23'34"	28°03'41"	2.00
NISP	Ghaghawa Nala [Jamuwa Khola]	83°25'46"	28°58'02"	5.86
IWRMP				
	Hudarwa Khola	83°34'48"	28°00'16"	2.40
ILC	Jabai Khola	83°23'20"	28°58'07"	7.00
ILC	Jamwar Khola	83°25'21"	28°59'23"	2.05
ILC	Gandak	83°29'03"	28°00'15"	2.20
DOI	Karma Nala	83°09'59"	28°10'34"	4.33
NISP	Gurmuwa Khola	83°31'51"	28°59'24"	8.30
MIP				
NISP	Surahi Khola	83°14'18"	28°06'53"	7.82
ILC	Marthi Khola	83°09'50"	28°07'42"	4.32
NITP	Mashayia River & sagar	83°11'35"	28°05'49"	2.50
IWRMP	Surahi Khola	83°15'53"	28°01'12"	4.20
MIP	Banganga River	83°20'30"	28°03'43"	6.05

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
24	Bhorlabase, Kotie	134			
25	Ghighuwa Nala	80			
26	Ghorahi Mauraming	118			
27	Ghorahidhankiuli	56			
28	Jamuar Diversion	750			
29	Kachuwa Khola	100			
30	Marthi Project	1000			
31	Maurma(150 Ha)	188			
32	Sakuniya Tal	188			
33	Shankarpur	56			
34	Surahi	500			
Rupandehi District					
1	16-36 Mauja Kulo Ip		3500.00		Butwal & Tillottama
2	Betahani Ip	163	131.00		Suddodhan 3
3	Char Tapaha Ip	4863	4133.55		Butwal, Suddhodhan & Siyari
4	Danda Ip	849	721.65	1996	Omsatiya 4
5	Dhunge Bandh Ip	312	265.20	2007	Devdaha 5
6	Dumdamuwa Ip	166	141.10	2002	Siddharthanagar 9
7	Gaidahawa Nala Ip	95	80.75	1998	Marchawari 1
8	Gaidhawa Tal Ip	321	272.85	2006	Gaidahwa 4
9	Gajedi Ip	495	419.00		Kanchan 1
10	Ghaghra Ip	2007	1705.95	1999	Mayadevi 8
11	Ghumaure Jaluke Ip		217.00		??
12	Gonaiya		800.00		??
13	Gothwa Bhuhka Ip	401	340.85	1996	Siyari Ga Pa 7
14	Inguriya Ip	299	250.00	1996	Sainamaina 6
15	Kanchan Khola Pan Bari Ip	209	170.00	1995	Sainamaina 10
16	Khadwa Motipur Ip	1500	1275.00	1999	Mayadevi 5
17	Kothi Ip	203	175.00	2002	Kanchan 5
18	Kunjlapur Ip	85	70.00	1992	Tilottama 6
19	Lapsi Khola Ip	206	175.10	1996	Omsatiya 2,3

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
MIP				
	Siyari Khola	83 ° 25'10.6"	27 ° 38'3.4"	2.00
MIP	Dano River	83 ° 27'25"	27 ° 41'1742"	12.47
MIP	Danda Khola	83 ° 30'10"	27 ° 31'54"	4.25
MIP	Khahare Khola	83 ° 36'09"	27 ° 38'47"	2.21
ILC	Lausi Khola	83 ° 28'549"	27 ° 31'42"	3.00
MIP	Gaindahawa Nala	83 ° 18'18"	27 ° 20'15"	1.16
NISP	Gaindahwa Tal	83 ° 17'05"	27 ° 35'25"	4.88
IWRMP	Pahela Khola	83 ° 16'25"	27 ° 40'14"	4.46
IWRMP	Ghaghara River	83 ° 26'34"	27 ° 31'45"	2.70
MIP				
IWRMP				
NISP	Siyari River (Tappa)	83 ° 24'08"	27 ° 35'10"	0.49
ILC	Inguriya Khola	83 ° 18'42"	27 ° 43'23"	0.50
ILC	Kanchan Khola	83 ° 15'44"	27 ° 11'10"	3.37
IWRMP	Siyari & Khadawa River	83 ° 421'48"	27 ° 30'20"	6.06
NISP	Kothi Khola	83 ° 13'36"	27 ° 39'04"	3.23
	Jharan Khola	83 ° 27'53"	27 ° 36'31.8"	1.80
NISP	Lausi Khola	83 ° 28'39"	27 ° 32'31"	2.32

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
20	Lausi Khola Ip	379	322.15	2001	Tilottama 7
21	Madaha Dam Ip	18	15.00		??
22	Marchawar Lift Ip	11477	9755.45	1995	Kotahimai, sammarimai and Marchawari Ga Pa
23	Parroha Ip	510	400.00	1990	Sainamaina 2
24	Purniya Bandh Ip	159	135.15	2002	Suddhodhan 5
25	Sakhuwani Dam Ip	22	18.70		Tilottama 13
26	Siyari Amuwa Ip	750	600.00	2001	Siyari 7
27	Siyarikahariya Ip	396	336.60	1991	Siyari 3
28	Solah Chattis Kulo Ip	5124	4355.40		Butwal & Tillottama
29	Tatera Ip	200	170.00		Devdaha 7,8
	Nawalparasi District				
1	Alahawal Ip	203	172.55	1996	Bardaghat MP, Ward No. 10
2	Banskhola Ip	356	294	2006	Sunwal MP, Ward No. 13
3	Bhaluhi Ip	81	65	1999	Sunwal MP, Ward No. 11
4	Bhumahi Ip	266	226.1		Sunwal MP, Ward No. 13
5	Bhutaha Ip	38	30	1990	Bardaghat MP, Ward No. 11
6	Panbhar Ip	209	177.65	2006	Sunwal MP, Ward No. 13
7	Pusaha Ip	629	534.65	1996	Sunwal MP, Ward No. 6
Palpa District					
1	Aathbise Ip	25	21.25		Tinau RMP-4
2	Agahakhola Ip	22	18.70	2001	Rambha RMP-1
3	Amerai Ip	65	53.00		Bagnaskali RMP-
4	Argeli Ip	238	202.30		Tansen MP-14
5	Badanayathulokulo Ip	30	24.00		Tansen MP-11
6	Banjha Thulo Kulo Ip		25.00		Tansen MP-12
7	Bardalephant Ip	113	96.05	2002	Rampur MP-10
8	Bejarkhet Ip	39	33.15	1996	Rampur MP-10
9	Besi Khet Ip	8	6.80		Rambha RMP-1

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
ILC	Lausi Khola	83 ° 29'07"	27 ° 35'26"	5.28
	Ghola Khola	83 ° 37'37"	27 ° 35'29.1"	0.80
NISP	Tinau Khola	83 ° 19'35"	27 ° 25'57"	7.83
IWRMP	Ghamahar Khola	83 ° 21'24"	27 ° 43'03"	5.99
DOI	Sukhali River	83 ° 22'13"	27 ° 37'10"	1.60
	Badka Khola	83 ° 27'54.8"	27 ° 35'51"	0.50
NISP	Siyari Khola	83 ° 24'34"	27 ° 36'23"	5.57
NISP	Siyari Khola	83 ° 23'49"	27 ° 33'49"	2.29
DOI	Tinau Khola	83 ° 27'54"	27 ° 42'31"	29.87
MIP	Ghodha Khola	83 ° 34'34"	27 ° 39'08"	4.69
ILC	Alhawal	83° 46' 2.450"	27° 34' 29.271"	4.70
MIP	Bansh Khola	83° 40' 57.585"	27° 35' 26.289"	11.99
NISP	Bhaluhi	83° 43' 59.093"	27° 35' 52.343"	5.07
	Bhumahi	83° 42' 16.167"	27° 36' 25.161"	8.05
DOI	Bhutaha	83° 45' 51.082"	27° 35' 7.566"	2.17
MIP	Panbhara	83° 42' 30.542"	27° 36' 58.304"	5.69
ILC	Pusaha Khola	83° 38' 29.447"	27° 37' 12.650"	5.54
IWRMP	Tinau River	83 ° 34'46"	27 ° 48'16"	1.58
IWRMP	Ghonsin khola	83 ° 39'48"	27 ° 51'15"	2.85
IWRMP	Lamdi Khola	83 ° 35'04"	27 ° 55'10"	3.58
IWRMP	Kurun Khola	83 ° 28'44", 83 ° 28'38", 83 ° 28'27" & 83 ° 28'12"	27 ° 53'59", 27 ° 54'06", 27 ° 54'15" & 27 ° 54'25"	4.02, 3.63, 3.10 & 2.12
	Kurung Khola	83 ° 29'29''	27 ° 52'18''	2.50
MIP				
NISP	Jhuma Khola	83 ° 45'28"	27 ° 53'07"	5.83
MIP	Bagar Khola	83 ° 53'12"	27 ° 50'55"	1.79
	Kali Gandaki Nadi	83 ° 39'45''	27 ° 34'42''	0.50

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
10	Bhalukhola Ip	10	8.00		Rampur MP-3
11	Binapate Ip	31	26.35		Rampur MP-2
12	Chahalaphant Ip	92	76.00	2004	Rainadebi Chahara RMP-6
13	Chaurichaurasi Ip	40	34.00	1996	Mathagadhi RMP-3
14	Chherlung Ip	103	87.55		Tansen MP-13
15	Dailathum Ip	46	40.00		Bagnaskali RMP-7
16	Damarabhotaha Ip	88	74.80		Nisdi RMP-1
17	Darpuk Phant Ip	86	73.10	1999	Bagnaskali RMP-6
18	Dundiphant Ip	192	160.00		Rampur MP-10
19	Gairi Sisne Ip		29.00	2015	Tansen MP-9
20	Galdhaphant Ip	17	14.45		NIsdi RMP-5
21	Gethichaur Ip	42	34.00		Tinau RMP-2
22	Ghodebaskulo Ip	19	15.00	1989	Tinau RMP-2
23	Ghurchisaphant Ip	36	30.00	1996	Rambha RMP-5
24	Heklang Ip	192	150.00	2006	Rampur MP-10
25	Heklangchangla Ip	41	35.00	1996	Rampur MP-10
26	Hundimul Ip	192	150.00	2002	Rampur MP-10
27	Jhyanglaphant Ip	39	33.15		Tinau RMP-2
28	Jogadamar Ip	35	29.75		Rainadebi Chahara RMP-7
29	Kachal phant Ip	184	156.40	1991	Tinau RMP-1
30	Kamigaunsprinkler Ip	9	7.65		Rampur MP-3
31	Khare Khola Ip	13	11.05		Bagnaskali RMP-3
32	Laguwaphant Ip	46	40.00		Ribdikot RMP-2
33	Laudhapaniphant Ip	28	23.80		Rainadebi Chahara RMP-7
34	Leguwajhamsi Ip	34	28.90		Tinau RMP-2
35	Maidaniphant Ip	57	45.00		Bagnaskali RMP-2
36	Majhakulo Ip	34	28.90	1996	Ribdikot RMP-1
37	Materikulo Ip	36	30.60		Rampur MP-3
38	Nikichaur Ip	40	34.00	1996	Rambha RMP-3

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
FIP	Bhandari Khola	83 ° 56'08"	27 ° 49'33"	2.34
IWRMP	Nisdi Khola	83 ° 56'23"	27 ° 50'26"	3.90
MIP	Amile khola	83 ° 20'00"	27 ° 48'47"	4.30
IWRMP	Turundi Khola	83 ° 35'15"	27 ° 49'22"	1.21
ILC	Barandi Khola	83 ° 32'55", & 83 ° 32'32"	27 ° 54'13" & 27 ° 54'50"	5.06 & 4.86
IWRMP	Gohadi Khola	83 ° 34'07"	27 ° 55'21"	2.40
MIP	Bungdi Khola	84 ° 00'35"	27 ° 50'32"	7.00
ISP	Lamdi Khola	83 ° 35'08"	27 ° 55'36"	4.74
IWRMP	Jhummsa Khola	83 ° 45'27"	27 ° 53'08"	-
MIP	Tinau Khola			2.80
NISP	Purba Khola	83 ° 54'15"	27 ° 48'31"	1.60
IWRMP	Utawa Khola	83 ° 27'31"	27 ° 46'48"	2.00
IWRMP	Sisne Khola	83 ° 28'26"	27 ° 45'17"	1.52
MIP	Purwa Khola	83 ° 43'52"	27 ° 49'55"	1.92
MIP	Jhummsa Khola	83 ° 45'27"	27 ° 53'08"	2.38
	Karaudi Khola	83 ° 43'49"	27 ° 53'26"	2.80
FIP	Jhummsa Khola	83 ° 45'27"	27 ° 53'08"	2.10
IWRMP	Pahare Khola	83 ° 26'00" & 83 ° 26'03"	27 ° 45'20" & 27 ° 45'27"	0.70 & 1.20
MIP	Kanchan Khola	83 ° 16'40"	27 ° 46'43"	2.39
IWRMP	Dhoban Khola	83 ° 21'25"	27 ° 48'28"	8.22
ILC	Katuwal Khola	83 ° 55'15"	27 ° 50'29"	1.33
	Gaduwa Khola	83 ° 35'17''	27 ° 53'20''	1.00
MIP	Rip Khola	83 ° 27'44"	27 ° 53'19"	1.16
MIP	Ulti Spring	83 ° 18'43"	27 ° 46'23"	2.95
IWRMP	Sisane Khola	83 ° 29'36" & 83 ° 30'17"	27 ° 54'42" & 27 ° 45'15"	1.02 & 1.51
IWRMP	Tinau River	83 ° 35'39"	27 ° 49'30"	1.98
MIP	Sardewa Khola	83 ° 25'29"	27 ° 54'06"	0.87 & 1.92
IWRMP	Bhuladi Khola	83 ° 53'48"	27 ° 51'48"	1.86
ISP	Sidi Khola	83 ° 39'57"	27 ° 53'17"	2.52

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
39	Rahawasmateri Ip	34	28.90		Mathagadhi RMP-7
40	Rampur Ip	893	755.00	2003	Rampur MP-3,4,5,6 &7
41	Randakhal Ip	37	31.00		Rampur MP-8
42	Sainjukulo Ip	68	57.80	1992	Rambha RMP-1
43	Sarojawabagalawa Ip	45	38.25		Mathagadhi RMP-3
44	Sera Khet Ip	86	73.10		Rambha RMP-1
45	Sijorkholal Ip	108	91.80		Mathagadhi RMP-3
46	Sijumul Ip	192	150.00		Rampur MP-10
47	Simlebandh Ip	192	150.00	2002	Rampur MP-10
48	Talmul Ip	85	72.25		Mathagadhi RMP-2
49	Tarikhet Ip	6	5.00		Tansen MP-9 & 11
50	Thulotandi Ip	18	15.30	2002	Rampur MP-3
51	Ultikulo Ip	19	16.15	1996	Mathagadhi RMP-3
52	Yakletarkhalibang Ip	51	43.35		Rampur MP-8
53	Bhalayatar IP		150		Rampur MP-2
54	Chandan Tari	13			Rampur MP-7
55	Chewa Phant	31			Purbhakhola RMP-4
56	Chis Tari	13			Rainadebi Chahara RMP-3
57	Paskunda	33	26.9		Tianu RMP-2
58	Majha Kulo Ip	15			
59	Bans Tari	13			
60	Chamrinandi	500			
61	Gijan Chour Panche	5			
62	Harijol Khola	34			
63	Jhumsa Khet	35			
64	Karandhi Khola	18			
65	Khursane	10			
66	Kukhuredhap	33			
67	Kunhar Khola	38			
68	Nimtung Kulo	19			
69	Salibanyakle Tar	63			

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
ILC	Baseni Khola	83 ° 42'21"	27 ° 43'44"	2.74
ISP	Nisdi Khola	83 ° 55'51"	27 ° 48'36"	17.90
MIP	Turundi Khola	83 ° 51'12"	27 ° 51'14"	4.92
ISP	Karaudi Khola	83 ° 43'55"	27 ° 53'42"	2.54
MIP	Lalpati & Buduwa Mul	83 ° 35'19"	27 ° 49'24"	1.24
NITP	Jhuma Khola	83 ° 25'29"	27 ° 54'06"	0.87 & 1.92
MIP	Sijor khola	83 ° 36'27"	27 ° 48'22"	5.43
DLP	Jhummsa Khola	83 ° 45'27"	27 ° 53'08"	2.38
NITP	Jhummsa Khola	83 ° 45'27"	27 ° 53'08"	2.38
IWRMP	Tinau River	83 ° 37'35"	27 ° 49'11"	2.42
NITP	Dhaude & chhangdi	83 ° 33'17"	27 ° 51'35"	0.35
	Bhalu Khola	83 ° 56'03"	27 ° 49'57"	2.07
NITP	Tinau River	83 ° 35'09"	27 ° 48'51"	0.72
MIP	Turundi Khola	83 ° 52'11"	27 ° 51'16"	3.63
MIP	Nisdi Khola			15.00
MIP	Pachase Khola			2.00
MIP	Chewa Khola			2.00
MIP	Utuwa khola			2.00

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
70	Sera Danda	19			
71	Simal Tari	18			
72	Simtadi Kulo	5			
73	Sinu Kulo	19			
74	Sisne Khola	7			
58	Sisne Khola Dovan	25	14		Tianu RMP-2
59	Tamlok	21	18		Rampur MP-5
Gulmi District					
1	Aanpchaur Ip	107	90.95		Musikot-5
2	Aaruchaur Ip	22	18.7		Madane -3
3	Amiltari Ip		26		Chhatrakot-3
4	Arjentichhap Ip	15	12	1981	
5	Arungapuchchhar Ip	27	22.95	2000	Satyawati -6
6	Bamghatahatim Ip	59	50.15		Rurukshetra -5
7	Bandeepaanpchaur Ip	48	40	2003	Chandrakot -7
8	Barsekulo Ip	68	57.8	1993	Satyawati -8
9	Bausedi Ip	29	24.65	2001	Chandakot -7
10	Beshikachaur Ip	26	22	1996	Rurukshetra -2
11	Bohaphant Ip	63	53.55		Chhatrakot-4
12	Buwaphant Ip	30	26	1996	Rurukshetra -2
13	Chaurasiphant Ip	86	73.1	1999	Isma-6
14	Chaurphant Ip	55	47	1999	Satyawati -1
15	Chehemi Ip	75	63.75	2001	Satyawati -2
16	Chhaldi Ip	19	15	1996	Isma-2
17	Chilidamai Ip	7	6	1996	Isma-2
18	Dallikhola Ip	36	29		Gulmidarbar-1
19	Damaighat Ip	23	20	1997	Resunga -6
20	Dumregoera Ip	21	17.85		Satyawati -4
21	Gantari Ip	24	20	1996	
22	Hanumantari Ip	19	15		
23	Jamunetari Ip	17	14.45	1996	Resunga-11

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
	Mul khola			5.00
	Nisdi Khola			3.00
NISP	Gyadi Khola	83°21'38"	28°07'27"	3.20
NISP	Panahgad Khola	83°05'08"	28°10'47"	2.20
MIP				
DOI	Adheri Khola	83°30'50.4"	28°06'40.7"	1.50
NISP	Jumdi Khola	83°26'49"	28°01'26"	1.00
MIP	Kaule Khola	83°25'04"	28°00'35"	2.42
NISP	Hugdi Khola	83°24'14"	28°05'29"	4.72
ADB/N	Bharse Khola	83°24'3"	28°4'6"	3.71
NISP	Bharse Khola	83°23'34"	28°03'41"	2.58
ILC	Tal Khola	83°25'46"	28°58'02"	3.44
MIP	Kordi Khola	83°23'20"	28°58'07"	3.51
ILC	Tal Khola	83°25'21"	28°59'23"	1.49
MIP	Arje Khola	83°09'59"	28°10'34"	4.59
NISP	Lumdi Khola	83°29'03"	28°00'15"	5.18
NISP	Labochhe Khola	83°31'51"	28°59'24"	5.23
ILC	Chhaldi Khola	83°14'18"	28°06'53"	2.91
ILC	Panahgad Khola	83°11'35"	28°05'49"	2.75
IWRMP	Dalli Khola	83°20'30"	28°03'43"	4.69
ILC	Panahgad Khola	83°11'57"	28°05'45"	3.40
	Tardi Khola	83°28'10"	28°0'53.8"	4.00
ILC	Chhaldi Khola	83°09'50"	28°07'42"	2.50
ILC	Badighat Khola	83°16'31"	28°11'02"	1.00
ILC	Pathan Khola	83°15'53"	28°01'12"	2.90

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
24	Jaukabari Puchhar Aaraudikhet Kallani Isp		25		
25	Jethikulo Ip	60	50		Kaligandaki-2
26	Jhatbangghaderi Ip	44	35		Madane -1
27	Jherdi Ip	57	48.45	1996	
28	Juwang Ip	35	29.75	1999	Satyawati -6
29	Kanchhikulo Ip	55	46.75		Kaligandaki-2
30	Kumaltari Ip	26	22.1		Gulmidarbar-6
31	Lampate Ip	27	22.95		
32	Lasahaphant Ip	8	6.8	1996	Musikot -3
33	Lumdikhola Ip	12	10		Satyawati -4
34	Machakot Ip	58	49.3	2000	Satyawati -1
35	Ninthara Ip	6	5	1996	Isma-2
36	Pahadi Phant		29		Satyawati-2
37	Pahadiphant Ip	39	33.15		Satyawati-2
38	Pangrakojhyal Salbot Amalabot Isp		26		Malika-7
39	Raghewa Ip	22	18.7	2002	
40	Rupakot Ip	69	60	1996	Chandrakot -7
41	Santiputthulophant Ip	58	49.3	1999	Chandrakot -4
42	Sotaphant Ip	40	34	1996	Chandrakot -7
43	Tahatim Isp		65		Rurukshetra -5
44	Tardikhola Ip	64	50	1996	Satyawati -4
45	Turang Ip	91	75	1997	Chandakot -8
46	Anthauna Kulo	11			
47	Arbenithumkijethika	38			
48	Bardi Khola	188			
49	Jimdi Khola	6			
50	Mulki	19			
51	Rabenikhulo	70			
52	Sayamuri	13			
Arghakhanchi District					

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
MIP				
IWRMP	Wagdi Khola	83°34'48"	28°00'16"	3.18
MIP	Ghaderi Khola	83°03'14"	28°13'55"	2.00
ILC	Jherdi Khola	83°22'44"	28°02'05"	2.58
NISP	Sodi Khola	83°26'03"	28°02'37"	1.28
ILC	Wagdi Khola	83°35'13"	28°00'32"	2.36
NISP	Bad Khola	83°16'01"	28°59'46"	6.60
IWRMP	Kharjyan Khola	83°17'57"	28°00'51"	9.13
ILC	Chhaldi Khola	83°16'42"	28°07'13"	2.20
	Kundure Khola	83°29'9.10"	28°0'23.8"	2.70
NISP	Lumdi Khola	83°30'07"	28°00'22"	5.00
ILC	Chhaldi Khola	83°15'01"	28°06'14"	1.37
IWRMP				
IWRMP	Badhare Khola	83°33'15"	28°59'01"	2.67
MIP				
NISP	Tardi Khola	83°27'02"	28°01'17"	1.68
ILC	Hugdi Khola	83°22'32"	28°04'29"	3.00
NISP	Harewa Khola	83°26'09"	28°06'19"	1.50
ILC	Hugdi Khola	83°21'39"	28°04'24"	2.52
MIP				
IWRMP	Tardi Khola	83°28'51"	28°02'03"	3.75
ILC	Hugdi Khola	83°24'25"	28°05'30"	5.18

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
1	Aapchaur Ip	10	8.50	1998	Sitganga-6
2	Archale Ip	64	51.00	1996	Sitganga-1
3	Baagikholabhirkulo Ip	35	29.75	1996	Sandhikarka 12
4	Barar Ip	23	18.00	X	Sitganga-1
5	Batule Kudule I.P.		30.00	X	Sitganga-10
6	Beltari Ip	34	28.90	1989	Sandhikharka 9& 10
7	Bikramsota Ip	63	50.00	2001	Sitganga-13
8	Chauwatar Ip	102	86.70	2003	Chhatradev-6
9	Chidika Ip	77	65.45	1996	Chhatradev-3
10	Damaidhunda Ip	30	25.00	X	Sitganga-4
11	Damarbesi Ip	25	21.25	2001	Sitganga-7
12	Damjingtar Ip	18	15.30	1996	Chhatradev-4
13	Dhunge Sera Ip	52	44.20	1995	Sitganga-11
14	Dhungegorkhe Ip	20	17.00	2000	Paneni-8
15	Dohote Ip	16	13.60	X	Sitganga -12
16	Durgakaurlahari Ip	56	45.00	1998	Paneni -5
17	Durgaphant Ip	38	32.30	1996	Paneni -3
18	Ganga Khola Ip	20	16.00	X	Sitganga -3
19	Ganyatari Ip	45	38.25	1996	Sandhikharka -9
20	Gorkhekulo Ip	38	32.30	1997	Paneni -3
21	Gothibang Ip	65	55.25	1996	Paneni-8
22	Harsingkhor Ip	25	20.00	1996	Sandhikharka- 10
23	Jalukeandheri Ip	75	63.75	1996	Sitganga -1
24	Jarekhola Ip	22	18.70	1997	Sandhikharka-4
25	Jumalikulo Ip	79	65.00	1999	Chhatradev-8
26	Kafaltari Ip	34	27.00	X	Sandhikharka-2,10
27	Kalleri Ip	71	60.35	1996	Sitganga-6
28	Khakabesi Ip	58	49.30	2000	Bhumikasthan-2
29	Khoramor Khola Ip		35.00	X	Sitganga -14
30	Kumaltari Ip	32	27.20	X	Sandhikharka-1
31	Kwangdi Ip	26	21.00	2001	Paneni-8

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
NISP	Bebade Khola	83° 00' 20.87"	27° 54' 57.95"	
ILC	Mandre Khola	83° 09' 39.22"	27° 50' 53.51"	
IWRMP	Bangi Khola	83° 07' 25.68"	28° 01' 01.92"	3.32
	Mandre Khola	83° 09' 34.55"	27° 51' 11.88"	2.7
MIP				
MIP	Dharapani Khola	83° 06' 26.27"	28° 00' 16.91"	1.5
NISP	Ban Ganga River	83° 12' 06.47"	27° 46' 23.88"	1.86
NISP	Chowa Khola	83° 14' 27.23"	27° 57' 01.80"	4.7
ILC	West Rapti	83° 10' 46.18"	27° 59' 45.95"	
	Sit Khola	83° 04' 23.14"	27° 52' 26.03"	3.32
NISP	Sit Khola	82° 57' 12.95"	27° 53' 19.67"	5.02
ILC	West Rapti	83° 13' 53.39"	28° 00' 32.40"	0.12
MIP	Gurmuwa Khola	83° 15' 55.06"	27° 55' 34.32"	2.71
NISP	Sisne Khola	83° 01' 13.08"	27° 48' 20.87"	0.13
NITP	Baseri Mul	83° 04' 59.87"	27° 48' 13.68"	4.05
NISP	Khar Khola	83° 12' 34.21"	27° 51' 03.59"	0.7
IWRMP	Durga Khola	83° 15' 11.89"	27° 54' 21.60"	2.79
	Ganga Khola	83° 05' 18.24"	27° 50' 53.51"	1.5
ILC	West Rapti	83° 05' 26.51"	28° 01' 43.67"	0.46
ILC	Sisne Khola	83° 15' 32.40"	27° 55' 35.03"	0.82
ILC	West Rapti	83° 10' 24.95"	27° 54' 04.31"	1.15
ILC	West Rapti	83° 06' 57.59"	28° 00' 52.19"	0.94
ILC	Subarna Khola	83° 08' 22.92"	27° 51' 39.60"	1.97
ILC	Chhedi Khola	83° 09' 32.77"	28° 00' 38.15"	0.44
MIP	Towa Khola	83° 11' 26.50"	28° 01' 12.00"	5.02
MIP	Bangi Khola	83° 07' 22.08"	27° 58' 19.55"	2.4
ILC	Bansiri Khola	83° 02' 35.86"	27° 53' 46.67"	0.4
NISP	Khagabesi Khola	83° 01' 26.76"	28° 02' 48.83"	6
MIP				
NISP	Bangi Khola	83°07'29"	27°58'19"	2.4
NISP	Saure Khola	83° 16' 11.98"	27° 56' 37.32"	3.23

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
32	Lahapesatmara Ip	100	85.00	2006	Sitganga-8
33	Lamatari Ip	35	30.00	1999	Chhatradev-5
34	Libadi Ip	26	22.10	X	Sitganga -1
35	Mahuwabari Ip		33.00	X	Sitganga -12
36	Majhkhet Ip	20	17.00	1998	Paneni-3
37	Mathuraphant Ip	28	23.80	X	Chhatradev-4
38	Pawartar Ip	55	46.75	1989	Sitganga -14
39	Pharsawa Ip	18	15.00	1996	Paneni-3
40	Ranuwatari Ip	60	51.00	2000	Sandhikharka 12& 1
41	Ringdibalebang Ip	91	77.35	1997	Sandhikharka-5
42	Sitkhola Ip	100	85.00	1996	Sitganga -9
43	Tallo Daha Ip	12	10.00	X	Sitganga -1
44	Thula Dhunga Ip	47	40.00	X	Sandhikharka-8 & 10
45	Thulakharka Ip	20	17.00	X	Bhumikasthan-2
46	Titribot Ip	40	34.00	X	Bhumikasthan-2
47	Beltari	6		X	Sandhikharka-10
Pyuthan District					
1	Aap Rukh Khet Ip	3	2.55	X	Naubahini Ga.pa-08
2	Aarang Khola Ip	31	25.00	X	Mandavi Ga.pa-01
3	Ambute Saymure Ip	22	18.70	X	Jhimruk Ga.pa.-05
4	Badhara Saribang Ip	32	27.20	1996	Pyuthan Na.pa-09
5	Baguwa Khola Ip	11	9.00	X	Pyuthan Na.pa.-05
6	Banchare Ip	17	14.45	X	Mallarani Ga.pa.-03
7	Bangesal Ip	209	168.00	X	Sarumarani Ga.pa.-01
8	Barbang Thulo Kulo Ip	55	44.00	2002	Jhimruk Ga.pa.-06
9	Bhitri Khola Ip	14	11.00	X	Sarumarani Ga.pa.-04
10	Bhomle Khola Ip	23	19.55	X	Gaumukhi Ga.pa.-01,02
11	Daha Kulo Ip	80	64.00	X	Jhimruk Ga.pa.-06 & Pyuthan Na.pa.-09,10
12	Darban Ip	55	44.00	1994	Sarumarani Ga.pa.-01,02
13	Darimbotbyura Ip	20	17.00	X	Jhimruk Ga.pa.-06

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
MIP	Ranle Khola	82° 49' 02.99"	27° 51' 33.48"	8.34
NISP	Dhor Khola	83° 13' 12.71"	28° 00' 37.44"	
NISP	Mandre Khola	83° 10' 19.93"	27° 52' 13.80"	1.61
MIP				
NISP	Bagali Khola	83° 18' 42.47"	27° 54' 04.31"	0.24
MIP	Mathura Khola	83° 12' 33.46"	27° 58' 40.80"	2.5
ILC	Ban Ganga River	83° 12' 19.43"	27° 47' 30.47"	4.05
ILC	Gokle Khola	83° 17' 28.31"	27° 54' 57.23"	1.1
NISP	Bangi Khola	83° 07' 33.95"	28° 00' 52.91"	5.49
ILC	Hurluk Khola	83° 11' 50.65"	27° 57' 25.20"	0.23
ILC	Sit Khola	83° 01' 01.90"	27° 50' 53.88"	0.83
	Mandre Khola	83° 09' 38.86"	27° 50' 55.31"	2.62
IWRMP	Ghochak Khola	83° 05' 34"	28° 00' 24"	3.2
NISP	Khagabesi Khola	83° 01' 05.89"	28° 02' 14.28"	0.33
MIP	Samne Khola	82° 59' 26.16"	28° 03' 18.72"	4.05
	Trinja Khla	82° 52' 16.669"	28° 10' 11.969"	0.20
IWRMP	Arang Khola	82° 44' 2.161"	28° 2' 15.429"	6.36
NITP	Gartung Khola	82° 59' 27.865"	28° 7' 19.765"	3.00
IWRMP	Jimruk River (P)	82° 53' 11.988"	28° 7' 16.687"	1.50
NITP	Baguwa Khola (P)	82° 49' 48.755"	28° 10' 13.242"	2.85
NITP	Rajnipani Chhenchhipe Kholsi	82° 54' 4.603"	28° 3' 48.129"	1.19
ILC	Madi river	82° 55' 59.925"	27° 56' 9.067"	16.40
NISP	Jimruk River (P)	82° 56' 56.126"	28° 8' 21.659"	4.50 2.70
CIP	Budhi Khola	82° 47' 34.022"	27° 57' 22.422"	3.05
ILC	Bhomle khola (P)	83° 3' 50.164"	28° 16' 41.167"	1.30
	Daha Khola	82° 54' 58.418"	28° 7' 24.977"	2.69
ADB/N	Darbhan Khola	82° 49' 37.227"	27° 55' 50.132"	4.11
Food dificates	Daha Khola	82° 55' 41.272"	28° 7' 40.601"	1.70

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
14	Dhaire Sera Ip	8	6.80	X	Pyuthan Na.pa.-08
15	Dhanbang Khola Ip	43	35.00	X	Swargadwari Na.pa.-03
16	Dhao Khola Ip	18	15.30	X	Mandavi Ga.pa-02
17	Dharmawati Ip	72	61.20	2002	Pyuthan Na.pa.-08
18	Gadri Phat Ip	4	3.40	X	Mallarani Ga.pa.-05
19	Ganaha Joghidhunga Ip	60	51.00	X	Sarumarani Ga.pa.-02
20	Gartung Ip	35	28.00	X	Jhuimruk Ga.pa.-04, 05
21	Ghali Bangsal Ip	11	9.35	X	Sarumarani Ga.pa.-01
22	Ghari Kulo Thulo Kulo Khaira Ip	67	55.00	2002	Pyuthan Na.pa.-01 & Mallarani Ga.pa.-05
23	Gorkhe Kulo Ip	75	60.00	2001	Pyuthan N.P.-04,07,08
24	Harnaghat Ip	35	30.00	2001	Airawati Ga.pa-04
25	Jagarkot Ip	10	8.50	X	Pyuthan Na.pa.-09,10
26	Jamle Pokhari Ip	9	7.65	X	Jhimruk Ga.pa.-08
27	Jari Khola Ip	27	22.95	1989	Swargadwari Na.pa.-03
28	Kalleri-Khuklichaur Ip	12	10.00	X	Mandavi Ga.pa.-02
29	Kashi Kulo Ip	55	46.75	X	Pyuthan Na.pa.-04,07
30	Lakhachaur Ip	40	34.00	X	Naubahini Ga.pa-06
31	Lungrimadi Ip	122	98.00	1996	Swargadwari Na.pa.-05
32	Machhi Damdame Ip	10	8.00	X	Jhimruk Ga.pa.-05
33	Malawang Ip	46	40.00	X	Airawati Ga.pa-02
34	Marsibang Ip	24	20.40	X	Mandavi Ga.pa.-03
35	Mau Kulo Ip	79	64.00	X	Swargadwari Na.pa.-05
36	Nabbe Phant Ip	50	42.50	X	Mallarani Ga.pa.-03
37	Napaja Ip	14	11.90	X	Pyuthan Na.pa.-01,02
38	Nau Kulo Ip	76	64.60	2006	Pyuthan Na.pa-01,02 & 03
39	Pahre Ip	11	9.35	X	Jhimruk Ga.pa.-04
40	Pidalne Phant Ip	53	45.00	X	Jhimruk Ga.pa.-07,08
41	Quade Kulo Ip	84	71.40	2001	Pyuthan Na.pa.-01.02.04

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
	Lung Khola	82° 53' 38.539"	28° 9' 40.433"	1.18
CIP	Dhanbang Khola	82° 40' 48.909"	28° 9' 55.800"	3.40
CIP	Dhao Khola	82° 43' 41.119"	28° 1' 8.331"	1.52
NISP	Dharmawati Khola	82° 54' 13.051"	28° 8' 17.289"	3.00
	Kanera Khola	82° 49' 32.985"	28° 3' 21.315"	0.60
MIP	Ganaha Khola (P)	82° 47' 19.006"	27° 54' 35.969"	3.50
MIP	Gartung Khola	82° 59' 4.519"	28° 7' 31.244"	3.86
	Rapti Khola	82° 53' 17.647"	27° 54' 46.709"	0.68
NISP	Jimruk River (P)	82° 49' 54.859"	28° 5' 6.442"	2.50
ILC	Dharmawati Khola	82° 53' 12.381"	28° 7' 23.907"	3.50
ILC	Betani Khola	82° 53' 0.874"	28° 1' 34.069"	1.80
	Chudari Khola	82° 55' 47.021"	28° 6' 23.424"	0.50
CIP	Ikhana Khoa	82° 58' 6.741"	28° 11' 14.225"	0.96
ILC	Jari Khola	82° 42' 1.319"	28° 8' 34.845"	1.30
CIP	Musure Khola	82° 42' 11.080"	28° 0' 28.478"	1.45
IWRMP	Jumri Khola	82° 50' 8.945"	28° 7' 43.005"	4.84
ILC	Lung Khola	82° 54' 52.565"	28° 12' 50.071"	2.50
ILC	Lungri Khola (P)	82° 43' 58.483"	28° 14' 58.372"	12.25
NITP	Gartung Khola (P)	82° 57' 51.132"	28° 8' 21.824"	Feed-ed-0.50
ILC	Jimruk River (P)	82° 55' 54.508" , 82° 55' 58.173"	28° 1' 5.108" ,28° 1' 1.806"	U-2.82 L-2.86
CIP	Hirang Khola	82° 45' 44.974"	28° 5' 15.318"	2.64
	Rajan Khola	82° 42' 25.190"	28° 11' 28.827"	2.12
MIP	Jimruk River (P)	82° 51' 51.720"	28° 2' 28.969"	2.10
NITP	Jimruk HP Penstrock seep-age	82° 48' 15.543"	28° 4' 52.982"	2.80
MIP	Jumri Khola	82° 49' 27.496"	28° 7' 31.423"	7.16
	Newar Khola	82° 58' 5.151"	28° 7' 44.619"	0.75
MIP	Jimruk River (P)	82° 58' 0.798"	28° 8' 52.073"	4.40
ILC	Dharmawati	82° 51' 19.623"	28° 6' 5.848"	3.90

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
42	Ram Khola Dharapani Ip	22	18.70	X	Gaumukhi Ga.pa.-07
43	Rani Kulo Ip	194	155.00	1996	Pyuthan Na.pa-07 & 08
44	Samundra Phant Ip	18	15.00	1996	Airawati Ga.pa-04
45	Seuri Khet Ip	15	12.75	X	Jhimruk Ga.pa.02,03
46	Sirseni Ip	68	57.80	X	Naubahini Ga.pa.-06
47	Tahar Kulo Ip	11	9.35	X	Mandavi Ga.pa.-03
48	Tallo Didi Kulo Ip	4	3.40	X	Gaumukhi Ga.pa.-03
49	Tallo Machi Ip	11	9.35	X	Jhimruk Ga.pa.-05
50	Tarabang Ip	116	93.00	X	Pyuthan Na.pa.-03
51	Upallo Machi Ip	4	3.40	X	Jhimruk Ga.pa.-04,05
52	Upardi Kulo Ip	60	51.00	X	Pyuthan Na.pa.-01,02,04
53	Vingri Ip	76	64.60	X	Swargadwari Na,pa.-04
54	Viseta Ip	45	38.25	X	Naubahini Ga.pa.-08
55	Bijuli Biraulla	75			Airawati Ga.pa.02,06
56	Dawangwang	98			Airawati Ga.pa.-4, Sarumarani Ga.pa.-04
57	Jhilibang	13			Airawati Ga.pa.-03,05
58	Kotgacnmadhichaun	9			Swargadwari Na.pa.-01,04,09
59	Kwadi	81			Pyuthan Na.pa.-01,02,04
60	Mawa	5			Swargadwari Na.pa.-05
Rolpa District					
1	Ajambari Ip	14	11.90	X	Pariwartan Rural Municipality
2	Anglisa Ip	20	17.00	X	Runtigadhi Rural Municipality
3	Aresh Ip	13	11.05	X	Sunilsmriti RM-03
4	Bhaisa Chhape Ip	14	11.00	2001	Lungri RM-07
5	Chipledhunga Ip	16	13.60	X	Runtigadhi RM
6	Daharee Ip	12	10.20	X	Runtigadhi RM
7	Dhansikhola Ip	18	15.00	X	Rolpa Municipality-10
8	Gajulkhola Ip	14	11.90	X	Sunilsmriti RM-03
9	Gamri Ip	13	11.05	X	Runtigadhi Rural Municipality
10	Gajul Ip	16	13.60	X	Sunilsmriti RM-05,06

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
ILC	Dharapani khola	82° 59' 32.377"	28° 11' 0.000"	1.50
ILC	Jimruk River (P)	82° 53' 2.258"	28° 7' 17.689"	4.00
ILC	Jhimruk Khola	82° 50' 24.959"	28° 2' 18.109"	3.42
	Hung Khola	83° 0' 21.128"	28° 9' 16.398"	1.44
MIP	Sirseni Khola (P)	82° 55' 3.216"	28° 12' 9.202"	3.28
CIP	Janglang Khola	82° 46' 34.861"	28° 4' 44.498"	2.68
	Khar Khola	83° 2' 7.583"	28° 16' 38.520"	0.48
	Gartang Khola	82° 57' 52.515"	28° 8' 20.110"	0.92
ILC	Tara khola	82° 49' 10.131"	28° 8' 56.284"	13.01
	Gartang Khola	82° 58' 8.113"	28° 8' 5.657"	1.70
ILC	Dharmawati Khola	82° 51' 26.791"	28° 5' 58.014"	3.00
	Jari Khola	82° 42' 3.569"	28° 8' 35.912"	2.40
	Adheri Khola	82° 51' 42.397"	28° 10' 45.304"	2.34
	Jhimruk Khola			
	Jhimruk Khola			
	Hariya Khola			
	Madi river			
	Panchbang Khola	82° 29' 09.60"	28° 31' 00.47"	1.29
	Sabdanda Khola	82° 28' 52.32"	28° 10' 38.64"	1.59
	Ares Khola	82° 45' 34.19"	28° 12' 30.24"	5.40
NISP	Mulbari	82° 50' 04.21"	28° 18' 32.04"	1.50
	Agrang Khola	82° 30' 50.39"	28° 10' 27.47"	1.81
	Sarpal Khola	82° 31' 39.37"	28° 13' 39.71"	3.57
MIP	Dansi Khola	82° 38' 43.80"	28° 19' 11.99"	8.33
	Gajul	82° 41' 11.75"	28° 18' 57.95"	1.38
	Dhorbang Khola	82° 25' 33.60"	28° 13' 18.84"	1.81
NITP	Gajul	82° 41' 04.92"	28° 17' 53.87"	3.53

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
11	Goganpani Ip	22	18.00	X	Madi RM-01
12	Hankarkot Ip	21	17.85	X	Rolpa Municipality
13	Hjurep Ip	11	9.35	X	Lungri Rural Municipality
14	Hungrikhola Ip	19	16.00	X	Rolpa Municipality-07
15	Jangkhola Ip	20	18.00	X	Rolpa Municipality-07
16	Jhalapa Ip	13	11.05	X	Rolpa Municipality-07
17	Jhenam Ip	17	14.45	X	Runtigadhi RM-07,08
18	Kalekhola Ip	30	25.50	X	Triveni RM-02
19	Kauchhena Ip	17	14.45	X	Sunilsmriti RM-05,06
20	Khanikhola Ip	23	19.55	X	Pariwartan RM
21	Khara1 Ip	8	6.80	X	Sunilsmriti RM-03
22	Khara2 Ip	27	22.95	X	Sunilsmriti RM-03
23	Kharibot Ip	23	19.00	X	Gangadev Rural Municipality
24	Kigabgar Ip	9	7.65	X	Rolpa Municipality
25	Kilachaur Ip	28	23.80	X	Lungri RM-05
26	Kit Khola Ip	31	26.35	X	Lungri Rural Municipality
27	Korc Ip	14	11.90	X	Runtigadhi Rural Municipality
28	Lankhuribang Ip	13	11.05	X	Rolpa Municipality-09
29	Lerekhola Ip	15	12.75	X	Madi RM-03
30	Machhi Ip	13	11.05	X	Runtigadhi RM-08
31	Machhimulkhola Ip	21	17.85	X	Rolpa Municipality
32	Madichaur Ip	22	16.00	1993	Rolpa Municipality-07,08
33	Manghat Ip	42	35.00	1989	Sunilsmriti RM-05
34	Obang Ip	9	7.65	X	Sunilsmriti RM
35	Odar Ip	13	11.05	X	Sunilsmriti RM-06
36	Panighatkharwanekhol Ip	24	20.40	X	Triveni Rural Municipality
37	Panighatkhola Ip	14	11.90	X	Triveni Rural Municipality
38	Plasani Ip	17	14.45	X	Runtigadhi Rural Municipality
39	Purangaun Ip	40	34.00	X	Triveni Rural Municipality
40	Ramukhola Ip	45	38.25	X	Rolpa Municipality
41	Saibang Ip	43	38.00	1996	Lungri RM-02,03

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
MIP	Golang Chharhar Khola	82° 28' 00.85"	28° 22' 43.32"	3.60
	Oli Khola	82° 34' 15.95"	28° 25' 17.04"	3.89
	Okherni Khola	82° 50' 01.32"	28° 18' 07.92"	0.59
MIP	Hungri Khola	82° 36' 03.94"	28° 21' 57.96"	3.38
	Madi Khola	82° 32' 26.17"	28° 21' 09.00"	2.60
	Madi Khola	82° 32' 50.64"	28° 22' 08.39"	1.02
	Jhenam Khola	82° 26' 56.03"	28° 12' 59.04"	2.21
	Rampur Khola	82° 29' 18.60"	28° 14' 16.08"	9.30
NISP	Kundra Khola	82° 40' 37.56"	28° 19' 11.27"	1.82
	Sanighat Khola	82° 29' 27.94"	28° 31' 49.08"	1.25
	Khara Khola	82° 41' 31.56"	28° 16' 29.99"	0.74
	Khara Khola	82° 42' 00.37"	28° 16' 20.28"	3.44
	Jaya Khola	82° 27' 48.24"	28° 28' 21.36"	0.93
	Madi Khola	82° 35' 08.88"	28° 18' 47.51"	3.77
	Bojyang Khola	82° 47' 22.19"	28° 16' 15.95"	4.62
	Kit Khola	82° 48' 31.32"	28° 12' 28.43"	1.78
	Agrang Khola	82° 34' 56.63"	28° 06' 58.68"	4.16
	Karnali	82° 35' 14.29"	28° 21' 57.59"	3.46
	Talabang Khola	82° 28' 55.20"	28° 26' 12.12"	1.98
	Khar Khola	82° 28' 39.36"	28° 11' 16.44"	2.42
	Parema Khola	82° 33' 11.51"	28° 19' 37.91"	3.92
IWRMP	Parema Khola	82° 34' 46.19"	28° 20' 38.76"	3.80
DOI	Khalu Khola	82° 41' 44.52"	28° 18' 59.76"	5.10
	Kalam Khola	82° 39' 09.37"	28° 12' 29.87"	2.02
	Galdhunga Khola	82° 46' 49.80"	28° 11' 29.76"	2.01
	Sibang Khola	82° 33' 05.03"	28° 18' 41.40"	2.00
	Sibang Khola	82° 33' 03.60"	28° 18' 46.44"	2.56
	Sibang Khola	82° 30' 57.23"	28° 12' 27.35"	2.26
IWRMP	Sibang Khola	82° 34' 23.14"	28° 17' 12.11"	3.85
MIP	Ramu Khola	82° 36' 55.80"	28° 18' 42.83"	3.56
MIP	Bandar Pole	82° 48' 17.28"	28° 14' 31.20"	3.85

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
42	Satmul Ip	15	12.00	X	Sunilsmriti RM-08
43	Sewar Bagar Ip	17	14.45	X	Lungri RM-02,03
44	Sirjanshil Ip	8	6.80	X	Pariwartan RM
45	Sirwali Ip	21	17.85	X	Triveni Rural Municipality
46	Thuligari Ip	11	9.00	X	Gangadev RM
47	Thulokhola Ip	23	19.55	X	Pariwartan RM
48	Bada Chaur	28		X	
49	Cheneta	33		X	
50	Chhapnata	19		X	
51	Chhapneta	24		X	
52	Dhabang	41		X	
53	Dhanuwa Gajule	47		X	
54	Dhawangchapna	36		X	
55	Ghabangsna	1		X	
56	Ghoda Khola	40		X	
57	Jawal Khola	35		X	
58	Lari Khola	24		X	
59	Lodh Chour	35		X	
60	Madhi Chaur	48		X	
61	Mirtang	10		X	
62	Okhreni Salghari	35		X	
63	Saiwang	46		X	
64	Serabang	44		X	
65	Thulokung Khola	45		X	
East Rukum District					
1	Garkhani Ip	10	8.00	X	Puthautarganga-12
2	Ghatte Khola Ip	7	5.95	X	Puthautarganga-12
3	Kafalbang Ip	32	27.20	X	Bhume-6
4	Khoriya Khola Ip	26	22.10	X	
5	Kuchaye Khola Ip	12	10.00	X	
6	Laurikatina Ip	15	12.00	X	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
	Ares Khola	82° 45' 26.99"	28° 11' 58.19"	1.06
	Khari Khola	82° 47' 52.78"	28° 12' 38.15"	1.46
	Khani Khola	82° 30' 20.87"	28° 31' 23.15"	2.37
	Syangri Khola	82° 30' 49.68"	28° 15' 54.71"	4.79
	Jaya Khola	82° 27' 36.71"	28° 28' 32.15"	1.03
	Thulo Khola	82° 29' 31.18"	28° 27' 55.07"	1.19
	Prangka Khola	82° 46' 49.864"	28° 35' 9.992"	0.90
	Ghatte Khola	82° 44' 15.507"	28° 37' 35.884"	1.53
	Tamari Khola	82° 42' 21.003"	28° 31' 29.699"	1.05
	Uttar Ganga Nadi	82° 49' 21.220"	28° 35' 52.155"	1.25
	Ramli Khola	82° 49' 13.429"	28° 34' 3.698"	1.26
	Mul Khola	82° 34' 0.592"	28° 32' 47.220"	1.65

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
7	Lukum Khola Ip	44	37.40	X	Bhume-1
8	Nathigad Ip	72	61.20	1990	Sisne-7
9	Okhardhara Ip	18	15.00	X	Bhume-6
10	Pedi Ip	19	16.15	X	Bhume-9
11	Rewang Khola Ip	28	23.00	X	
12	Rukumkot Ip	191	162.35	2006	Sisne-5 &6
13	Ruma Khola Ip	27	22.95	X	
14	Sima Ip	21	15.00	X	Bhume-3
15	Syadnuk Khola Ip	16	13.60	X	
16	Val Khola Ip	23	19.55	X	Sisne-8
17	Rebatkhola Bojeri ISP	38	32	X	Sisne RM-3
18	Tumbang Khola ISP	40	35	X	Sisne RM-2
19	Nakha Khola ISP	15	12	X	Puthautarganga-14
20	Gunam ISP	27	20	X	Bhume-7
21	Amlachaur ISP	38	36	X	Sisne-4
22	Gakhrigaun Galhar ISP	22	18	X	Puthautarganga-10
23	Jugepani Khawangkhola ISP	21	17	X	Bhume-8
24	Marin Bahuudheshiya ISP	12	9	X	Bhume-7
25	Jamakhola Kimutara ISP	20	15	X	Sisne-8
26	Kuchibangkhola Kundar ISP	18	13	X	Bhume-8
27	Jhakrikhola ISP	13	9.5	X	Sisne-8
28	Liple Baluwa Syamjebagar ISP	12	8	X	Sisne-6
29	Kanda ISP	13	10	X	Bhume-4
30	Like khola ISP	14	11	X	Bhume-4
31	Machhenakhola Sakim ISP	28	25	X	Bhume-5
32	Serabang ISP	31	25	2080/081	Bhume-5
33	Tiltara Sinchai Bikas Yojna	4	3	2080/081	Bhume-3
34	Mahat Lift ISP	26	22	2079/080	Bhume-6
35	Lakharkhola ISP	31	28	2079/080	Bhume-9
36	Itighari ISP	9	5	2079/080	Sisne-2

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
	Sugure Khola	82° 47' 18.893"	28° 32' 31.544"	2.35
DOI	Naudhari Khola	82° 34' 11.621"	28° 37' 5.360"	1.62
	Mangra Khola	82° 43' 29.899"	28° 31' 39.446"	1.80
	Tila Khola	82° 34' 51.863"	28° 33' 9.491"	1.03
	Ghopte Khola	82° 44' 27.598"	28° 33' 57.769"	1.41
MIP	Kuchiban Khola	82° 37' 42.794"	28° 33' 57.643"	13.34
	Kharjmbang Khola	82° 50' 12.753"	28° 35' 14.855"	0.77
	Jit Khola	82° 41' 38.295"	28° 34' 32.154"	2.78
	Syadnuk Khola	82° 48' 46.506"	28° 34' 42.908"	0.89
NISP	Jama Khola	82° 31' 48.053"	28° 39' 1.740"	2.50
MIP	Vergare Khola	82° 34' 15.04"	28° 33' 2.940"	2.25
MIP	Tumbang	82° 38' 32.4"	28° 42' 13.60"	2.45
MIP	Nakha Khola	82° 52' 00.04"	28° 40' 20.7"	2.35
MIP	Odar Khola	82° 39' 50.0"	28° 37' 07.8"	1.5
MIP	Chiuri Khola	82° 37' 42.0"	28° 40' 06.80"	2.45
MIP	Gakhari Khola	82° 51' 41.08"	28° 40' 20.7"	1.8
MIP	jugepani Khola	82°37'37.2"	28°34'19.3"	1.9
MIP	Phlakhe Khola	82°43'42.73"	28°31'52.72"	1.78
MIP	Jamakhola	82°31'44"	28°38'48.8"	1.61
MIP	Kuchibang Khola	82°37'36.5"	28°34'19.2"	0.81
MIP	Jhakri Khola	82°34'34.4"	28°37'13.4"	1.9
MIP	Selparachaur	82°37'08.8"	28°37'26.1"	1.35
MIP	Sewangkhola			1.85
MIP	Likekhola			4.85
MIP	Machhenakhola	82°42'52.85"	28°40'0.65"	3.96
MIP	Bimakhola	82°40'53.38"	28°36'11.29"	3.95
MIP	Tiparkhola	82°40'29.02"	28°33'27.65"	0.51
MIP	Dubka khola	82°41'05.1"	28°32'46.2"	4.77
MIP	Mulkhola	82°34'15.04"	28°33'2.94"	1.45
MIP	Uwakhola	82°30'58.3"	28°40'25.4"	3

S. N.	Irrigation System Name	GCA	NCA	Cons. Year	RMP/MP/Ward
37	Dading first ISP	22	17	2079/080	Sisne-4
38	Thulakhet Sisneri Phant ISP	27	18	2080/081	Sisne-7
39	Plastik Pokhari Kol ISP	19	14	2079/080	Putha-12
40	Birgum Namuna NITP	21	16	2079/080	Putha-13
41	Dading Second ISP	22	15	2079/080	Sisne-4
42	Korjakhola ISP	24	20	2078/079	Bhume-6
43	Magrakhola ISP	23	18	2081/082	Bhume-6
44	Kharabang ISP	59	50	2080/081	Putha-9
45	Rangsi ISP	19	15	2080/081	Putha-14
46	Simchaur ISP	21	16	2080/081	Bhume-9
47	Tharpukhola ISP	31	25	X	Putha-8
48	Jangkhola ISP	18	14	X	Putha-7
49	Tauleraha Larthaphnat ISP	28	23	X	Sisne-8
50	Kanda Arjal ISP	17	12	X	Putha-4
51	Salepkhola ISP	29	25	X	Putha-2
52	Naudhare ISP	28	22	X	Sisne-7
53	Jamakhola ISP	38	32	X	Sisne-8
54	Marfaphant ISP	18	13	X	Bhume-2
55	Balthachhada ISP	21	16	X	Putha-10
56	Tumbangkhola ISP	33	29	X	Bhume-3
57	Chhipkhola ISP	29	25	2080/081	Sisne-2
58	Haipung Supisyala Phant ISP	19	15	2079/080	Bhume-6

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

Programme	Source Name	HW_East	HW_North	L(Km)_MC
MIP	Mulkhola & Tanekhola	82°31'57.4"	28°41'26.9"	2.5
MIP	Thulokhola	82°35'42.08"	28°34'27.65"	1.86
MIP	Kol Khola	82°44'18.39"	28°38'51.70"	1.85
MIP	Dhasuwa Khola	83°33'57.00"	28°40'16.26"	4
MIP	Jaruwapani	82°36'57.83"	28°40'15.03"	2.5
MIP	Korjakhola	82°40'56.73"	28°33'1.08"	2.6
MIP	Magrakhola	83°33'57.00"	28°16'11.0"	2.5
MIP	Painekhola	82°39'17.44"	28°34'39.28"	3.86
MIP	Mulkhola	82°44'8.39"	28°36'50.70"	2.1
MIP	Thadokhola	82°32'56.91"	28°33'48.68"	3.5
MIP	Tharpukhola	82°32'56.04"	28°33'48.68"	2.78
MIP	Jangkhola			3.34
MIP	Jamakhooa	82°21'47.45"	28°38'08.0"	2.85
MIP	Bagarpakhola	82°48'13.5"	28°41'28.1"	3.65
MIP	Salepkhola			6.54
MIP	Naudhare	82°33'15.04"	28°33'2.94"	3.68
MIP	Jamakhola	82°24'10.4"	28°46'54.6"	4.359
MIP	Marfakhola	82° 46' 27.83"	28° 31' 30.54"	2.9
MIP		82°53'10.74"	28°35'9.76"	7.1
MIP	Tumbangkhola	82°41'29.02"	28°34'27.65"	3.65
MIP	Chhipkhola	82°31'57.30"	28°40'36.40"	2.21
MIP	Haipung Khola	82°39'56.73"	28°32'1.08"	1.8

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

अनुसूची ११
ऊर्जाका विकास तर्फका सम्पन्न योजनाहरु

सुधारिएको चुलो जडान सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	स्थान	चुलो जडान संख्या	चुलो जडान तालिम प्राप्त संख्या	कैफियत
१	रिब्दिकोट गा. पा. १, पाल्पा	१४०	८	२०७८/७९
२	भुमिकास्थान नगरपालिका ४ अर्घाखाँची	१३५	८	२०७८/७९
३	झिमरुक गा.पा. ४ प्युठान	१३५	१६	२०७८/७९
४	सुनिलस्मृति गा.पा. ४ रोल्पा	१३८	८	२०७८/७९
५	कन्चन गा.पा. ४ रुपन्देही	१४५	८	२०७८/७९
६	रेसुङ्गा नगरपालिका -०६ गुल्मी	१३८	८	२०७८/७९
जम्मा		**८३१**	**५६**	
७	इश्मा गा.पा. ६ गुल्मी	१५०	१२	०७७/७८
८	सरावल गा.पा. नवलपरासी	१६०	१०	०७७/७८
९	रिब्दिकोट गा.पा. पाल्पा	१४०	८	०७७/७८
जम्मा		**४५०**	**३०**	

नेट मिटरिंग तथा सोलार व्याकअप सिस्टम जडान सम्बन्धि बिवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	सिस्टम क्षमता	कैफियत
नेट मिटरिंग सिस्टम			
१	श्री आदर्श मा.वि. सरावल नवलपरासी	१० kWp	२०७८/७९
२	तानसेन नगरपालिकाको कार्यालय भवन पाल्पा	१२ kWp	२०७८/७९
३	भुल्के खानेपानी योजना, तानसेन पाल्पा (४ नं पम्प स्टेसन)	१७ kWp	२०७८/७९
४	उर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भवन बुटवल	१७ kWp	२०७७/७८
सोलार ब्याकअप सिस्टम जडान			
४	रेसुंगा मा.वि., रेसुंगा न.पा. गुल्मी	३ kWp	२०७८/७९
५	दाउन्नेदेवी मा.वि., बर्दघाट न.पा. नवलपरासी	३ kWp	२०७८/७९
६	भुवनेश्वरी मा.वि. विजयनगर गा.पा. कपिलबस्तु	३ kWp	२०७८/७९

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	सिस्टम क्षमता	कैफियत
७	सर्वोदय मा.वि. रासि गा.पा. सिसहनिय दाङ	३ kWp	२०७८/७९
८	भुवनेश्वोरी मा.वि., प्युठान न.पा. १ खैरा प्युठान	४ kWp	२०७८/७९
९	माजकोट स्वास्थ्य चौकी, प्युठान न.पा. प्युठान	५ kWp	२०७८/७९
१०	लक्ष्मीनारायण मुक्तिनाथ मन्दिर बुटवल रुपन्देही	६ kWp	२०७८/७९
११	शारदा मा.वि. रिब्दिकोट गा.पा १ पाल्पा	७ kWp	२०७८/७९
१२	देउराली स्वास्थ्य चौकी, रिब्दिकोट गा.पा. २ पाल्पा	२ kWp	२०७८/७९
१३	लक्ष्मी मा.वि. कोहलपुर बाँके	३ kWp	२०७८/७९
१४	श्री पर्रोहा परमेश्वर सैनामैना मा.वि. सैनामैना न.पा. रुपन्देही	३.५ kWp	२०७८/७९
१५	श्री त्रिभुवन ब. क्याम्पस, तानसेन पाल्पा (बिज्ञान भवन,)	४.८ kWp	२०७८/७९
१६	श्री दुधनाथ थारु यज्ञदोय बहमुखी क्याम्पस फर्साटिकर रुपन्देही	३.६ kWp	२०७८/७९
१७	श्री राधाकृष्ण मा.वि. निस्दी गा.पा. पाल्पा	३ kWp	२०७८/७९
१८	श्री वाकामलांग स्वास्थ्य चौकी पाल्पा	३ kWp	२०७८/७९
१९	श्री होलेरी स्वास्थ्य चौकी रोल्पा	२ kWp	२०७८/७९
२०	श्री जनज्योति मा.वि. पुथा उत्तरगंगा गा.पा. पूर्वी रुकुम	२ kWp	२०७८/७९
२१	श्री दुर्गा बौद्धिक पाठशाला तिलोत्तमा न.पा. रुपन्देही	२ kWp	२०७८/७९
२२	श्री खानीगाउँ स्वास्थ्य चौकी बगनासकाली गा.पा. पाल्पा	२ kWp	२०७८/७९
२३	प्रदेश उर्जा कार्यालय भवन दाङ	१.२ kWp	२०७७/७८
२४	शारदा मा.वि. मल्लरानी गा.पा. प्युठान	२.२५ kWp	२०७७/७८
२५	सरस्वती मा.वि. तानसेन ७ पाल्पा	२.२५ kWp	२०७७/७८
२६	बरौला कोभिड अस्पताल, ऐरावती गा.पा. प्युठान	२.२५ kWp	२०७७/७८
२७	रोल्पा अस्पताल, रेउघा रोल्पा	३ kWp	२०७७/७८
२८	कपिलबस्तु बहुमुखी क्याम्पस कपिलबस्तु	३ kWp	२०७७/७८

ट्रान्सफर्मर जडान तथा विद्युतीकरण विवरण (आ.ब. २०७७/७८ र ०७८/७९)

सि.नं.	ट्रान्सफर्मर जडान गरेको स्थान	क्षेमता (KVA)	प्रयोजान
१	बर्दघाट न.पा. वडा नं १६-सिद्धनगर, नवलपरासी	१००	उद्योग संचालन
२	बर्दघाट न.पा. वडा नं १४- गौतमबुद्ध आवास क्षेत्र, नवलपरासी	५०	समुदायिक प्रयोग
३	बर्दघाट न.पा. वडा नं १५- कालिकाटोल र मिलनटोल, नवलपरासी	५०	समुदायिक प्रयोग

सि.नं.	ट्रान्सफर्मर जडान गरेको स्थान	क्षेमता (KVA)	प्रयोजान
४	सुनवल नगरपालिका -१२-जनता मा.वि. उत्तरतर्फ, नवलपरासी	१००	समुदायिक प्रयोग
५	सरावल गाउँपालिका -१, नवलपरासी	१००	समुदायिक प्रयोग
६	सरावल-२, मगरमुढा नवलपरासी	१००	समुदायिक प्रयोग
७	साना किसान कृषि सहकारी संस्था मैनापोखर बढैयाताल-७ बर्दिया	१००	कृषि उद्योग
८	सीतापुर स्मार्ट कृषि खजुरा गाउँपालिका बडा नं २ बाके	१००	कृषि उद्योग
९	स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम जानकी गाउँ पालिका वडा नं १ बाके	५०	कृषि उद्योग
१०	कोटहिमाइ गाउँपालिका- ०५ रुपन्देही	५०	समुदायिक प्रयोग
११	रामनगर बृहत खानेपानी, सुनवल -१२ नवलपरासी	१००	खानेपानी
१२	बारबर्दिया नगरपालिका-६ , बर्दिया	५०,१००	समुदायिक प्रयोग
१३	बारबर्दिया नगरपालिका-४ , बर्दिया	५०	समुदायिक प्रयोग
१४	प्रगतिशील डीप ट्युवेल ज.उ.स. कन्चन गा.पा. रुपन्देही	५०	सिंचाई
१५	सैनामैना खानेपानी उपभोक्ता समिति सैनामैना-१ रुपन्देही	१००	खानेपानी
१६	सा. विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह नयाँगाउँ १-७ धुर्कोट गुल्मी	१००	समुदायिक प्रयोग
१७	केरावारी-जोरधारा-चरचरे सा.विद्युत वितरण संस्था तिनाउ-५ पाल्पा	१००	समुदायिक प्रयोग
१८	रिब्दिकोट -०४ भैरवस्थान , पाल्पा	५०	समुदायिक प्रयोग
१९	रिब्दिकोट -०३ खस्यौली, पाल्पा	५०	समुदायिक प्रयोग
२०	रिब्दिकोट -०५ नयाँटोला, पाल्पा	५०	समुदायिक प्रयोग
२१	रैनादेवी छहरा- ०२ दीग, पाल्पा	५०	समुदायिक प्रयोग
२२	रैनादेवी छहरा- ०४ काफलबुट्टा, पाल्पा	५०	समुदायिक प्रयोग
२३	तानसेन-०७ लामडांडा, पाल्पा	१००	समुदायिक प्रयोग
२४	बगनासकाली -०३ नायर नम्तलेस, पाल्पा	५०	समुदायिक प्रयोग
२५	क्रान्ति मा. वि. बुटवल रुपन्देही	५०	समुदायिक प्रयोग

स्टिल ट्युबलर पोल जडान सम्बन्धी विवरण (आ.ब. २०७७/७८)

क्र. सं.	पोल प्रयोग भएको संस्थाको नाम	पोल संख्या	कैफियत
१	रिमुवा सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, रुरुक्षेत्र गा.पा. ६ रिमुवा गुल्मी	२९०	२०७७/७८
२	बलेटक्सार ग्रामिण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह,, रुरुक्षेत्र गा.पा. ४ गुल्मी	२६२	२०७७/७८

क्र. सं.	पोल प्रयोग भएको संस्थाको नाम	पोल संख्या	कैफियत
३	थानपित सामुदायीक ग्रामिण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, रुरुक्षेत्र गा.पा ३ थोर्गा गुल्मी	७३	२०७७/७८
४	दिगाम ग्रामिण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, छत्रकोट ४ गुल्मी	१०५	२०७७/७८
५	दिपज्योति ग्रामिण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, छत्रकोट ३,५ गुल्मी	१२१	२०७७/७८
६	बिरबास सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, गुल्मीदरबार ४ गुल्मी	१९०	२०७७/७८
७	भाँडगाऊ बोहोरे सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, रेसुंगा न.पा. ३ गुल्मी	१००	२०७७/७८
८	पालुखा सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, इश्मा २ गुल्मी	३१५	२०७७/७८
९	वामी सामुदायीक ग्रामिण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, मुसिकोट न.पा.७,८ गुल्मी	२२०	२०७७/७८
१०	कुर्घा सामुदायीक ग्रामिण विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, मुसिकोट न.पा ६ गुल्मी	२९०	२०७७/७८
११	दिबुंग सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, चन्द्रकोट १ गुल्मी	२१६	२०७७/७८
१२	भुर्तुग गा.बि.स. सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह,	३०१	२०७७/७८
१३	जोहांग सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, सत्यवती ६ गुल्मी	१५०	२०७७/७८
१४	सत्यवती सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, सत्यवती गा.पा ४ गुल्मी	१६५	२०७७/७८
१५	हचिङकोट सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, सत्यवती ४ ठुलोलुपलेक गुल्मी	१८०	२०७७/७८
१६	छहरा सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, रैनादेबी छहरा ४ पाल्पा	३३२	२०७७/७८
१७	सिद्देश्वोर सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, रैनादेबी छहरा १ पाल्पा	२५५	२०७७/७८
१८	केरावारी, जोरधारा चचरे सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, तिनाउँ ५ पाल्पा	६४	२०७७/७८
१९	कचल सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, तिनाउँ १ पाल्पा	२००	२०७७/७८
२०	दाम्सीहडाँडा तालपुंग पेलाचौर सामुदायीक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह, रिब्दिकोट ८ फेक पाल्पा	१९७	२०७७/७८
२१	जनप्रकाश ग्रामिण सहकारी सँस्था, भुमिकास्थान ९ अर्घाखाँची	४३०	२०७७/७८
२२	अंगुरी सामुदायीक बिद्युत उपभोक्ता समूह पाणिनी ७ अंगुरी अर्घाखाँची	३१७	२०७७/७८
२३	बस्तु सामुदायिक ग्रामिण बिद्युत सहकारी संस्था धुर्कोट गा.पा. गुल्मी	४०	२०७७/७८

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. सं.	पोल प्रयोग भएको संस्थाको नाम	पोल संख्या	कैफियत
२४	घमिर सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समूह मालिका गा.पा. गुल्मी	४०	२०७७/७८
२५	अमरपुर अर्जे सामुदायिक ग्रामिण बिद्युत सँस्था इश्मा गा.पा गुल्मी	४२	२०७७/७८
२६	रामपुर न.पा. पाल्पामा बिद्युत प्रणाली सुधार रामपुर पाल्पा	२०	२०७७/७८
२७	सुनवल न.पा. बिद्युत वितरण प्रणाली सुधार नवलपरासी	५	२०७७/७८
जम्मा		४९३०	

ऊर्जा तर्फ आव ०८०/८१ मा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यहरुः

क्र. स.	कार्य विवरण	आयोजना स्थल	सम्पन्न परिमाण
१	कृषि विद्युतीकरण (LT)	सरावल -६, गडउरी, नवलपरासी	३.०८९ कि.मि.
		सरावल -७, मोजरईया, नवलपरासी	१.१३ कि.मि.
२	ग्रामिण विद्युतीकरण (HT)	भुमिकास्थान - १ अर्घाखाँची	०.७० कि.मि.
३	ट्रान्सफर्मर खरिद तथा जडान कार्य (१०० KVA)	रासी-२, पुन्यपुर (फोहरमैला ब्यवस्थापन श्रोत केन्द्र)	१ थान
४	स्टील पोल खरिद/जडान (स्टिल पोल द्वारा काठको पोल प्रतिस्थापन कार्य)	मालिका गा.पा. वडा नं -१,२,३,६,७ अर्खावाङ, गुल्मी	४०० थान
		माथागढी गा.पा. वडा नं -६,सामुदायिक विद्युत, पाल्पा	१०३ थान
		अमरपुर अर्जे सामुदायिक ग्रामिण विद्युत, ईश्मा गा.पा. गुल्मी	२६० थान
		श्री दर्वार देविस्थान सामुदायिक ग्रामिण विद्युत, गुल्मी दर्वार चारपाला - गुल्मी	४८० थान
		रेसुङ्गा नगरपालिका -१४ परालमी, गुल्मी	१७० थान
५	हाईब्रिड सौर्य ब्याकअप प्रणाली जडान कार्य	रजवरा स्वास्थ्य चौकी, गौमुखी - ३, प्यूठान	२.४ किलोवाट
		जुम्रीकडा स्वास्थ्य केन्द्र, प्यूठान - ५, प्यूठान	२.४ किलोवाट
		दखाक्वादी स्वास्थ्य केन्द्र, प्यूठान - १, प्यूठान	२.४ किलोवाट
		जबुना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्यूठान	२.४ किलोवाट
		मालारानी स्वास्थ्य केन्द्र, अर्घाखाँची	२.४ किलोवाट
		प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, सैनामैना, रुपन्देही	२.४ किलोवाट
		भालुवाङ्ग प्रस्तावित अस्पताल, दाङ	१२ किलोवाट
		राजापुर स्वास्थय सेवा केन्द्र, राजापुर, बर्दिया	१२ किलोवाट
		श्री रासी गंगा प्राथमिक विद्यालय, रासी -१, दाङ	२.४ किलोवाट
		दरुल उलुम मदरसा, ओमसतिया - ४, रुपन्देही	२.४ किलोवाट

क्र. स.	कार्य विवरण	आयोजना स्थल	सम्पन्न परिमाण
		श्री पशुपति माध्यामिक विद्यालय, रोहिणी ६, रुपन्देही	२.४ किलोवाट
		श्री नवज्योति आधारभूत विद्यालय, बर्दघाट - ४, नवलपरासी (ब.सु.प.)	२.४ किलोवाट
		आँखा उपचार केन्द्र, सुलिचौर, रोल्पा	४.० किलोवाट
		नयाँगाउ स्वास्थ्य चौकी, बर्दिया	४.० किलोवाट
		कोईलावास आँखा उपचार केन्द्र, दाङ	४.० किलोवाट
		श्री सिद्धार्थ मा.वि. गंगादेव- ३, रोल्पा	४.० किलोवाट
		श्री परोंहा मा.वि. सैनामैना, रुपन्देही	४.० किलोवाट
		श्री महेन्द्र मा.वि. मालारानी, प्यूठान	४.० किलोवाट
		श्री दमकडा मा.वि. तानसेन, पाल्पा	४.० किलोवाट
		श्री धर्मभक्त मा.वि. बर्दिया -९, बर्दिया	४.० किलोवाट
		भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही	४.० किलोवाट
		जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मी	४.० किलोवाट
		जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा	४.० किलोवाट
		लमही आँखा अस्पताल, लमही - दाङ	१२.० किलोवाट
		कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पताल, कपिलवस्तु	१२.० किलोवाट
		भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश, दाङ	१२.० किलोवाट
		तातोपानी खानीगाउँ बराइदी चापपानी खानेपानी, पाल्पा	१२.० किलोवाट
		नर्ति खानेपानी आयोजना, नर्ति - दाङ	१२.० किलोवाट
		प्रभात माध्यामिक विद्यालय, - बाँके	१२.० किलोवाट
६	मोटोराइज्ड हाईमाष्ट लाईटिङ्ग प्रणाली जडान कार्य	गेरुवा गाउँपालिका - ३, शान्ति बजार चोक - बर्दिया (१६ मि. ३२०० w)	१ सेट
		लुम्बिनी साँस्कृतिक -१३, कालिदह बोर्डर- रुपन्देही (१६ मि. ३२०० w)	१ सेट
		मर्चवारी - ५, मर्चवारी मन्दिर - रुपन्देही (१६ मि. ३२०० w)	१ सेट
७	(१६ मि. २४०० वाट) हाईमाष्ट लाईटिङ्ग प्रणाली जडान (राष्ट्रिय झण्डा तथा गजुर समेतको)	तुल्सीपुर न.पा. ५, विरेन्द्रचोक- दाङ	१ सेट
		राजापुर न.पा. ६, टपरा बजार- बर्दिया	१ सेट
		शंकरनगर वन विहार परिसर भित्र- रुपन्देही	१ सेट
८	(१६ मि. २४०० वाट) हाईमाष्ट लाईटिङ्ग प्रणाली जडान	रोल्पा सदरमुकाम, रोल्पा	२ सेट
		रुकुम सदरमुकाम, रुकुम पूर्व	२ सेट

क्र. स.	कार्य विवरण	आयोजना स्थल	सम्पन्न परिमाण
९	१२ मिटर १८०० वाट क्षमताको हाईमाष्ट लाईटिङ्ग प्रणाली जडान	तुल्सीपुर न.पा -५ गुम्राह चोक- दाङ	१ सेट
		तुल्सीपुर न.पा -५ हाथी खौवा चोक- दाङ	१ सेट
		तुल्सीपुर न.पा - १९, बिजौरी चोक- दाङ	१ सेट
		नेपालगंज उप.म.न.पा. ६, जैसपुर - बाके	१ सेट
		राजापुर न.पा. -५ त्रिवेणी बजार- बर्दिया	१ सेट
		राजापुर न.पा. -२ बाला बजार- बर्दिया	१ सेट
		मायाँ देवी ७, बनगाई चोक - रुपन्देही	१ सेट
		पाल्पा दर्बार संग्राहलय, पाल्पा	१ सेट
		नारायण चोक, पाल्पा	१ सेट
		तम्घास बजार, गुल्मी	१ सेट
१०	सौर्य सडक बत्ती जडान	राजापुर न.पा. १०, बर्दिया	८
		गेरुवा गा.पा. ०४, बर्दिया	२
		घोराही उप म.न.पा. ०९, दाङ	३
		तानसेन न.पा. ०५, पाल्पा	५
		रुरुक्षेत्र गा.पा. ०२, गुल्मी	५
		बर्दघाट न.पा. ०४, नवलपरासी	५
		सियारी गा.पा. ०४, रुपन्देही	५
११	अनग्रिड/अफग्रिड सडक बत्ती जडान	तानसेन न.पा. ०७, पाल्पा	१०
		राजापुर न.पा. १०, बर्दिया	२५
		राजापुर न.पा. ०४, बर्दिया	५५
		प्यूठान न.पा. ०४- ०८, प्यूठान	४८
		बुटवल उप-म.न.पा. ११, रुपन्देही	३
१२	एकीकृत ग्रिड सिस्टम AC/DC रिचार्जेवल ४०/२० वाट सडक बत्ती	रोल्पा सदरमुकाम बजार, रोल्पा	४० सेट
		रुकुम सदरमुकाम बजार, रुकुम पूर्व	४० सेट
१३	अनग्रिड सडक बत्ती (४० वाट)	बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी	४२० सेट
१४	अनग्रिड/अफग्रिड (एसि डिसी रिचार्जेवल ४०/२० वाट) सडक बत्ती	बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी	२२ सेट
१५	लघु तथा साना जलविद्युत मर्मत सम्भार कार्य	मालिका गाउँपालिका ३, गुल्मी (७ किलोवाट /१३ किलोवाट)	२

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	कार्य विवरण	आयोजना स्थल	सम्पन्न परिमाण
१६	लघु तथा साना जलविद्युत मर्मत सम्भार कार्य	कुन्पा साँगुराखोला (६० किलोवाट), परिवर्तन -३ रोल्पा	१
		काजरजंगखोला लघु जल विद्युत (२४ किलोवाट), रुकुम पूर्व	१
१७	हाइड्रो पावर सम्भाव्यता अध्ययन कार्य	धुर्कोट गापा र मदाने गापा बिच पर्ने पनाह खोला, गुल्मी	१
१८	सुधारिएको चुलो निर्माण, जडान तथा सन्चालन कार्य	भलुवाचौर, जर्वादी र ठुलो चौर, बगनासकाली गा.पा. -१ पाल्पा	१०० थान
		बगनासकाली गा.पा. -६ र ७ - पाल्पा	१५० थान
		रिब्दीकोट गा.पा. -१ पाल्पा	१५० थान
		धुर्कोट गाउँपालिका - ४, गुल्मी	१५० थान
		सुनवल न.पा. हर्दिया बस्ती नवलपरासी	१५० थान
		राजापुर नगरपालिका, बर्दिया	१५० थान
		गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया	१५० थान
		बारबर्दिया नगरपालिका - ९, बर्दिया	१५० थान
१९	संस्थागत बायोग्यास प्लान्ट (७५ घन मि.) निर्माण तथा जडान कार्य	कैलाशधाम आश्रम, बाणगंगा - २ नन्दनगर कपिलवस्तु	१ थान
२०	संस्थागत इनर्जि अडिट कार्य	मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, रुपन्देही	१
		भुल्के खानेपानी आयोजना, - पाल्पा	१

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

अनुसूची १२

आ.व. २०८२/८३ को कार्यालयगत योजना विवरण

क्र. स.	कार्यालय	ब.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		दाँजिफाँक
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, अवधिखोला	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	१४	३६९००	६	४५००	१	१९००	७	३०५००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	२	२६००	०	०	२	२६००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	७२	७५२००	९	५७००	५९	६१५००	४	८०००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१७	१८०००	०	०	१६	१६०००	१	२०००	
		विशेष अनुदान	१	३००००	०	०	०	०	१	३००००	
		जम्मा	**१०६**	**१६२७००**	**१५**	**१०२००**	**७८**	**८२०००**	**१३**	**७०५००**	
२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, वाँके	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	१०	३०५००	४	१५००	०	०	६	२९०००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	२	३०००	१	१०००	१	२०००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१६	२२०००	१२	११५००	०	०	४	१०५००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१७	३९०००	१२	१२०००	३	४५००	२	२२५००	
		जम्मा	**४५**	**९४५००**	**२९**	**२६०००**	**४**	**६५००**	**१२**	**६२०००**	

क्र. स.	कार्यालय	ब.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		प्रकृति
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
३	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	११	२४०००	४	१५००	५	१०००	२	१२५००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	१	२०००	०	०	१	२०००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१४	१६०००	१२	११२००	१	१८००	१	३०००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२४	३१४००	१७	१५४००	५	९५००	२	६५००	
		जम्मा	**५०**	**७३४००**	**३३**	**२८१००**	**१२**	**२३३००**	**५**	**२२०००**	
४	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	१२	२६०००	७	४०००	२	३५००	३	१८५००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	५	५०००	४	३५००	१	१५००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	२००	१९२६००	१७३	१५०३००	२७	४२३००	०	०	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	६१	९६३००	३१	२९३००	२०	३२५००	१०	३४५००	
		जम्मा	**२७८**	**३१९९००**	**२१५**	**१८७१००**	**५०**	**७९८००**	**१३**	**५३०००**	

क्र. स.	कार्यालय	ब.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		प्रगतिको %
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
५	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मी	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	२०	२९०००	५	४०००	१५	२५०००	०	०	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	३	२५००	३	२५००	०	०	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१४९	१४९५००	१२९	११५१००	१८	२८९००	२	५५००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१७	१९२००	१४	१२२००	२	४०००	१	३०००	
		३०८९११२१ नदी नियन्त्रण(संघ शर्सत अनुदान)	१	५०००	०	०	०	०	१	५०००	
		जम्मा	**१९०**	**२०५२००**	**१५१**	**१३३८००**	**३५**	**५७९००**	**४**	**१३५००**	
६	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तु	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	१३	४९०००	३	१०००	२	२०००	८	४६०००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	३	३०००	२	५००	१	२५००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	२८	२८६००	२३	२०१००	४	६०००	१	२५००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१२	१३९००	१०	१००००	१	१४००	१	२५००	
		३०८९११२२ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शर्सत अनुदान)	१	१००००	०	०	०	०	१	१००००	
		जम्मा	**५७**	**१०४५००**	**३८**	**३१६००**	**८**	**११९००**	**११**	**६१०००**	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	कार्यालय	व.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		प्रफुल्ल
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
७	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	१६	४०५००	९	६५००	३	५५००	४	२८५००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	१	२०००	०	०	१	२०००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	८	११५००	६	६०००	०	०	२	५५००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१३	१४०००	१२	११५००	०	०	१	२५००	
		३०८९११२१ नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान)	७	४००००	०	०	०	०	७	४००००	
		जम्मा	**४५**	**१०८०००**	**२७**	**२४०००**	**४**	**७५००**	**१४**	**७६५००**	
८	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	२०	३७०००	१४	११०००	२	३०००	४	२३०००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	२	२५००	१	१०००	१	१५००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	४६	५००००	४०	३५९००	४	६१००	२	८०००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१४	२१०००	११	१०००	१	२०००	२	९०००	
		जम्मा	**८२**	**११०५००**	**६६**	**५७९००**	**८**	**१२६००**	**८**	**४००००**	

क्र. स.	कार्यालय	ब.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		एकीकृत
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
९	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिँचाई कार्यक्रम	१६	२६६००	८	६०००	५	७१००	३	१३५००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	३	१५००	३	१५००	०	०	०	०	
		३०८००००१८ सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	४४	४७३००	४०	३५७००	०	०	४	११६००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१८	१८६००	१७	१६५५०	०	०	१	२०५०	
		जम्मा	**८१**	**९४०००**	**६८**	**५९७५०**	**५**	**७१००**	**८**	**२७१५०**	
१०	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रेकुम पूर्व	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिँचाई कार्यक्रम	२५	३३२००	१३	९०००	९	१४२००	४	१००००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	२	३०००	१	१०००	१	२०००	०	०	
		३०८००००१८ सिँचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	२०	१९५००	१८	१५५००	२	४०००	०	०	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२१	२०३००	२०	१८३००	१	२०००	०	०	
		जम्मा	**६९**	**७६०००**	**५२**	**४३८००**	**१३**	**२२२००**	**४**	**१००००**	

क्र. स.	कार्यालय	ब.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		प्रतिशत
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
११	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुकुम(पश्चिम)	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	१४	३३७५०	४	१५००	५	८५००	५	२३७५०	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	२	४०००	०	०	२	४०००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	४४	४९३००	३६	३१८००	५	९०००	३	८५००	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१३	१७५००	८	८०००	४	७०००	१	२५००	
		३०८९११२१ नदी नियन्त्रण(संघ शसर्त अनुदान)	२	२००००	०	०	०	०	२	२००००	
		३०८९११२२ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ शसर्त अनुदान)	४	८५०००	०	०	०	०	४	८५०००	
		जम्मा	**७९**	**२०९५५०**	**४८**	**४१३००**	**१६**	**२८५००**	**१५**	**१३९७५०**	
१२	जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पर्वतेश्वर	३०८००००१५ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	२०	३९९००	१२	७४००	२	३५००	६	२९०००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	१	२०००	०	०	१	२०००	०	०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	४७	४०७००	४६	३९२००	१	१५००	०	०	
		३०८००००२० जल उत्पन्न प्रकोप न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१९	१९९००	१६	१५४००	३	४५००	०	०	
		जम्मा	**८७**	**१०२५००**	**७४**	**६२०००**	**७**	**११५००**	**६**	**२९०००**	

क्र. स.	कार्यालय	व.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		कैफियत
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
१३	भुमिगत बांध	३०८००१६ भूमिगत स्यालो तथा डिपट्युवेवेल सिंचाई कार्यक्रम	४९	८२५००	३२	२८०००	३	६०००	१४	४८५००	
		३०८००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	६	८५००	३	३०००	३	५५००	०	०	
		जम्मा	**५५**	**९१०००**	**३५**	**३१०००**	**६**	**११५००**	**१४**	**४८५००**	
१४	भुमिगत वांग	३०८००१६ भूमिगत स्यालो तथा डिपट्युवेवेल सिंचाई कार्यक्रम	१०२	११८४००	७८	५८५००	७	१०९००	१७	४९०००	
		३०८००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	५	२५००	५	२५००	०	०	०	०	
		जम्मा	**१०७**	**१२०९००**	**८३**	**६१०००**	**७**	**१०९००**	**१७**	**४९०००**	
१५	भुमिगत बेल्टवेली	३०८००१६ भूमिगत स्यालो तथा डिपट्युवेवेल सिंचाई कार्यक्रम	९६	१६४२००	५९	४३१००	२२	३८०००	१५	८३१००	
		३०८००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	४	५०००	३	३०००	१	२०००	०	०	
		३०८९११२४ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेल सिंचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	३	१५०००	०	०	०	०	३	१५०००	
		जम्मा	**१०३**	**१८४२००**	**६२**	**४६१००**	**२३**	**४००००**	**१८**	**९८१००**	
१६	दाङ्गेश्वरी नगरपालिका	३०८००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	७	४३२५०	३	७००	१	१५००	३	४१०५०	
		३०८९११२५ मझौला सिंचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	१	३००००	०	०	०	०	१	३००००	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

क्र. स.	कार्यालय	व.उ.शी.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	१० लाख सम्मका		१० - २० लाख सम्मका		२० लाख भन्दा बढी		दाँफ्फुक
					संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	संख्या	बजेट	
१७	थवाङ्पोमाङ मामा बढ्कोमथ	जम्मा	८	७३२५०	३	७००	१	१५००	४	७१०५०	
		३०८००००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१३	४७५००	६	३०००	४	६५००	३	३८०००	
		३०८९११२५ मझौला सिचाई आयोजना(संघ शर्सत अनुदान)	१	५००००	०	०	०	०	१	५००००	
		जम्मा	१४	९७५००	६	३०००	४	६५००	४	८८०००	
१८	यरुंग उर्जा कार्यालय	३०८००००९ उर्जा विकास कार्यक्रम	७९	८९४००	५४	३८३००	१८	२८५००	७	२२६००	
		३०८९११२० राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम(संघ शर्सत अनुदान)	१	२५०००	०	०	०	०	१	२५०००	
		जम्मा	८०	११४४००	५४	३८३००	१८	२८५००	८	४७६००	
१९	उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय	३०८००००१५ मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सघन सिंचाई कार्यक्रम	७	१०५००	३	२०००	३	६०००	१	२५००	
		३०८००००१६ भूमिगत स्थालो तथा छिपटयुवेल सिंचाई कार्यक्रम	१	१७५००	०	०	०	०	१	१७५००	
		३०८००००१७ जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	१	१७५००	०	०	०	०	१	१७५००	
		जम्मा	९	४५५००	३	२०००	३	६०००	३	३७५००	
		कुल जम्मा	१५४५	२३८७५००	१०६२	८८७६५०	३०२	४५५७००	१८१	१०४४९५०	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

अनुसूची १३
मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुको सम्पर्क विवरण

क्र. सं.	मन्त्रालय/ कार्यालयको नाम र ठेगाना	मन्त्रालय/ कार्यालयको वेबसाईट	कार्यालयको ईमेल ठेगाना
१	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय	moewri.lumbini.gov.np	moewri.lumbini@gmail.com
२	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., नवलपरासी		iddnawalparasi@gmail.com
३	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., रुपन्देही	Widd.lumbini.gov.np	widd6.rupandehi@gmail.com
४	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., दाङ		mwidd.dang@gmail.com
५	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., कपिलवस्तु		widd5kapil@gmail.com
६	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., बाँके	www.wriddobanke.gov.np	wriddobanke@gmail.com
७	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., बर्दिया	wriddobardiya.gov.np	iairrigationbardia@gmail.com
८	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., पाल्पा		widd3.palpa@gmail.com
९	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., गुल्मी		irrigation.gulmi@gmail.com
१०	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., अर्घाखाँची	widdarg.lumbini.gov.np	arghakhanchi.idd@gmail.com
११	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., रोल्पा	widdrolpa.lumbini.gov.np	widd.rolpa@gmail.com
१२	जलस्रोत तथा सिं.वि.डि.का., प्यूठान		idd.pyuthan@gmail.com
१३	जलस्रोत तथा सिं.वि.सव-डि.का., रुकुमपूर्व		wridsdrukumeast2019@gmail.com
१४	बाणगंगा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कपिलवस्तु	bim.lumbini.gov.np	banganga.irrigation@gmail.com
१५	प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, दाङ	pbimo.lumbini.gov.np	pdimdlamahi@gmail.com
१६	भूमीगत जलस्रोत तथा सिं. वि.डि.का., दाङ	gwiddang.lumbini.gov.np	gwidddang@gmail.com
१७	भूमीगत जलस्रोत तथा सिं. वि.डि.का., रूपन्देही		gwrdb.butwal@gmail.com
१८	भूमीगत जलस्रोत तथा सिं. वि.डि.का., बाँके		gwiddnpj@gmail.com
१९	प्रदेश ऊर्जा कार्यालय भालुवाँङ दाङ्ग		info.urja081@gmail.com

कार्यालय प्रमुखको नाम र सम्पर्क नं.	प्रवक्ताको नाम र ठेगाना	गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.	सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.
चुर्ण बहादुर ओली ९८५७०८१८७०	महेश पोखेल ९८५७०८८६७२	सि.डि.ई. श्री कृष्ण बहादुर बि.क. ९८५७८२५७४१	चन्द्र राना ९८४१८१५८७१
मनोज भट्टराई ९८५७०८०७७२		मनोज भट्टराई ९८५७०३९०४९	ओम बहादुर थापा ९८४७५५८७१३
भेषराज भुसाल ९८५७०१५२०१		भेषराज भुसाल ९८५७०१५२०१	राजेश सिंह ९८५७०६८७२७
कृष्ण बहादुर बि.क. ९८५७८२५७४१		सि.डि.ई. श्री कृष्ण बहादुर बि.क. ९८५७८२५७४१	बरिष्ठ ईन्जिनियर श्री नवराज पोखेल ९८५११२५३७४
कुशल गौतम ९८५७०५१३५१		कुशल गौतम ९८५७०५१३५१	भगत राज आचार्य ९८५७०५१९८४
आशिष वि.क. ९८५८०४०१८८		लाल बहादुर ओली ९८४०५१६७२४	लाल बहादुर ओली ९८४०५१६७२४
मंगल बहादुर बम ९८५८०५५१७८		मंगल बहादुर बम ९८५८०५५१७८	कमल नेपाली ९८५८०४००६२
सुबोध गुरागाईं ९८५७०६१४३०		सुबोध गुरागाईं ९८५७०६१४३०	राकेश कुमार यादव ९८५७०६०३९०
अनिल श्रेष्ठ ९८५७०६४५१६		अनिल श्रेष्ठ ९८५७०६४५१६	विमल वि.क. ९७४९७८२५०५
भरत प्रसाद सापकोटा ९८५७०८११६२		भरत प्रसाद सापकोटा ९८५७०८११६२	रामजी भट्टराई ९८५७०८४७७५
प्रवीण कुमार ९८४५८५२३३३		किशनजी कुँवर ९८५७८७७०२०	किशनजी कुँवर ९८५७८७७०२०
उमेश महतो ९८५७८३३७५३		उमेश महतो ९८५७८३३७५३	
मदन प्रसाद शाह ९८५७८५६०८४		मदन प्रसाद शाह ९८५७८५६०८४	पूर्ण बहादुर बिष्ट ९७४६९३०९१४
कोफुला श्रेष्ठ ९८५७०५१९८०		कोफुला श्रेष्ठ (९८५७०५१९८०)	
ईश्वर नाथ पक्वां ९८५७८४०४६५		तुल्सी राम सुवेदी ९८६८९९४७८८	गोरखनाथ चन्द ९८६५८७३५८९
सुरेन्द्र महर्जन ९८५७८४०३७५		सुरेन्द्र महर्जन ९८५७८४०३७५	नमराज भट्टराई ९८५७८४५०१६
केशव राज रिजाल, ९८५७०५७४४८		राजु अर्याल, ९८५१२२३७९१	विष्णु उपाध्याय ९८५८४२७४५६
किरण कुमार चौधरी ९८५८०३५३६६		मधु न्यौपाने ९८५८०५५१०८	मधु न्यौपाने ९८५८०५५१०८
झलक बहादुर थापा ९८५७८५०७८८		झलक बहादुर थापा ९८५७८५०७८८	धन बहादुर नेपाली ९८५१२३३७९८

अनुसूची १४

मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरुमा कार्यरत इन्जिनियरिंग सेवाका कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.	"कर्मचारीको नाम"	"संकेत नम्बर"	समूह/उपसमूह	पद	तह	कार्यरत कार्यालय	कैफियत
१	चुर्ण बहादुर ओली	१७३६२५	सिभिल/हा.जी	प्रदेश सचिव	रा.प.प्रथम	मन्त्रालय	
२	महेश पोखेल	१८९००४	जियोलोजी /हा.जी	सि.डि. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	अ.दशौं	मन्त्रालय	
३	केशव राज रिजाल	१९४३४५	जियोलोजी /हा.जी	सि.डि. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	अ.दशौं	भूमिगत रुपन्देही	
४	सुरेन्द्र महर्जन	१९२१८८	जियोलोजी /हा.जी	सि.डि. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	अ.दशौं	भूमिगत दाङ	
५	ईश्वर नाथ पक्वां	१९४३१६	एग्री ईरिगेशन	सि.डि.ईन्जिनियर	अ.दशौं	प्रगन्ना बड्कापथ	
६	कोफूला श्रेष्ठ	१९१०१५	एग्री इरिगेसन	सि.डि.ईन्जिनियर	अ.दशौं	बाणगंगा	
७	कृष्ण बहादुर वि.क.	१२१२३२	सिभिल/इरिगेसन	सि.डि.ईन्जिनियर	अ.दशौं	डिभिजन दाङ	
८	कुशल गौतम	१७१२७६	सिभिल/इरिगेसन	सि.डि.ईन्जिनियर	अ.दशौं	डिभिजन कपिलबस्तु	कामकाज
९	झलक बहादुर थापा	११९५५५	इलेक्ट्रिकल	ईन्जिनियर	अ.सातौं	उर्जा कार्यालय दांग	
१०	विष्णु उपाध्याय	२१७८६०	जियोलोजी/हा.जी.	व. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	अ.आठौं	भूमिबाट रुपन्देही	
११	किरण कुमार चौधरी	२१७१९१	जियोलोजी/हा.जी.	व. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	अ.आठौं	भूमिगत बाँके	
१२	मधु न्यौपाने	२१४५०९	जियोलोजी/हा.जी.	व. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	अ.आठौं	भूमिगत बाँके	
१३	नमराज भट्टराइ	२२५१८४	जियोलोजी/हा.जी.	ब. हाइड्रोजियोलोजिस्ट	अ.आठौं	भूमिगत दाङ	
१४	गोविन्द निरौला	२३१६०४	एग्र इरिगेशन	बरिष्ठ ईन्जिनियर	अ.आठौं	प्रगन्ना बड्कापथ	
१५	सुनिल के सी	२१२०३२	एग्री इरिगेसन	बरिष्ठ ईन्जिनियर	अ.आठौं	प्रगन्ना बड्कापथ	
१६	विवेक न्यौपाने	२३१६१४	एग्री इरिगेसन	बरिष्ठ ईन्जिनियर	अ.आठौं	बाणगंगा	
१७	खेमराज निरौला	२२५२१६	एग्री ईरिगेशन	बरिष्ठ ईन्जिनियर	अ.आठौं	बाणगंगा	
१८	भेषराज भुसाल	१८९६५३	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ ईन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन रुपन्देही	
१९	उमेश महतो	१९५६३४	सिभिल/इरिगेसन	वरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन प्युठान	
२०	राजेश सिंह	२१२१९२	सिभिल/इरिगेसन	वरिष्ठ इञ्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन रुपन्देही	
२१	मंगल बम	१४६८०१	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ ईन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन बर्दिया	
२२	युवराज भण्डारी	२१२१४३	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन कपिलबस्तु	अ.बिदा
२३	भगतराज आचार्य	२१२१७१	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन कपिलबस्तु	
२४	नारायण प्रसाद डुम्रे	२१२१८२	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन कपिलबस्तु	

क्र.सं.	"कर्मचारिको नाम"	"संकेत नम्बर"	समूह/उपसमूह	पद	तह	कार्यरत कार्यालय	कैफियत
२५	मनोज भट्टराई	२१२१७०	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इञ्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन नवलपरासी	
२६	सुबोध गुरागाँई	२१२१६६	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन पाल्पा	
२७	नवराज पोखेल	२१२१४५	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन दाङ	
२८	सन्तोष घिमिरे	२१२१४६	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन दाङ	अ.बिदा
२९	चन्द्र राना	२१२१५१	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	मन्त्रालय	
३०	निश्चल काफ्ले	२१२१५३	सिभिल/इरिगेसन	इन्जिनियर	अ.सातौं	डिभिजन पाल्पा	निलम्बन
३१	आशिष विक	२१२१२३	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन बाँके	
३२	प्रवीण कुमार	२१२१५५	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन रोल्पा	
३३	राजु अर्याल	२१२१६४	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	भूमिगत रुपन्देही	
३४	अनिल श्रेष्ठ	२१२१९३	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ट इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन गुल्मी	
३५	मदन प्रसाद साह	१९२५३१	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	स.डिभिजन रुकुम	
३६	बिष्णु श्रेष्ठ	१९२३७१	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ठ इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन दाङ	
३७	भरत प्रसाद सापकोटा	१४६४४१	सिभिल/इरिगेसन	बरिष्ट इन्जिनियर	अ.आठौं	डिभिजन अर्घाखाँची	
३८	बिर बहादुर बि सि	२२६०९७	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन बाँके	
३९	दुर्गामणी घिमिरे	२३१५०७	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन अर्घाखाँची	
४०	राकेश कुमार यादव	२१९०५१	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन पाल्पा	अ.बिदा
४१	सन्तोष पौडेल	२३२४२६	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन पाल्पा	
४२	सुनिल ऐरी	२२६१८२	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन पाल्पा	
४३	श्रीध्वज अधिकारी	२१४८६२	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन दाङ	
४४	मान बहादुर बिष्ट	२२२०६४	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन दाङ	
४५	भुपेन्द्र खड्का	२२६२८८	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन दाङ	
४६	प्रमिला पोखेल	२२२४७३	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन दाङ	
४७	बिमल बि.क.	२१९२८२	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन गुल्मी	
४८	बालकृष्ण बुढाथोकी	२१३५२०	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन गुल्मी	
४९	शरण आचार्य	२५४६७९	सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	भूमिगत रुपन्देही	
५०	ओम प्रकाश यादव	२१८९५३	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन प्युठान	अ.बिदा
५१	निरोज महर्जन	२२६१३५	सिभिल/इरिगेसन	प्राबिधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन प्युठान	

क्र.सं.	"कर्मचारीको नाम"	"संकेत नम्बर"	समूह/उपसमूह	पद	तह	कार्यरत कार्यालय	कैफियत
५२	देवनाथ पण्डित	२२७४१०	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन कपिलवस्तु	
५३	सुरज के.सी.	२१९०१०	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	सब.डिभिजन रुकुम	
५४	लाल बहादुर ओली	२१८९६७	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन बाँके	
५५	चक्करी सार्की	२२६११०	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन बाँके	
५६	रवेन्द्र कुमार यादव	२४२४५७	सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन अर्घाखाँची	
५७	कमल नेपाली	२१८९७०	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन बर्दिया	
५८	हरि प्रसाद अवस्थी	२३०७७२	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन बर्दिया	
५९	पद्मा सिंह		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन रोल्पा	
६०	सुजु घताने विश्वकर्मा	२२६१२७	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन रुपन्देही	
६१	विरेन्द्र बहादुर चन्द	२२६००८	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन गुल्मी	
६२	रामइश्वर मण्डल	२१८९४८	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन रुपन्देही	
६३	शान्ती अधिकारी	२२७१२६	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन रुपन्देही	
६४	विवेक शाह	२३३२३९	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन नवलपरासी	अ.बिदा
६५	राजकुमार चौधरी	२२५८९२	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन रुपन्देही	
६६	रोशन प्रकाश भट्ट	२२६१०७	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन कपिलवस्तु	
६७	किशनजी कुँवर	२१९२२२	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन दाङ	
६८	आशिष श्रेष्ठ		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन रोल्पा	
६९	ओम बहादुर थापा	२२६७५५	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन नवलपरासी	
७०	सदिश गौतम	२२६०६२	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन नवलपरासी	
७१	निकेश कुमार मण्डल	२२५५९७	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	भूमिगत रुपन्देही	
७२	"चन्द्र प्रकाश नेपाली "	२१८९०९	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	भूमिगत बाँके	
७३	विधान पण्डित	२१८९४	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	भूमिगत बाँके	अ.बिदा
७४	संजय कुमार माझी	२२५८९३	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	भूमिगत दाङ	अ.बिदा
७५	गोरख बहादुर चन्द	१९८९२१	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	प्रगत्ना बड्कापथ	
७६	रञ्जिता बराल	२१९३८७	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	प्रगत्ना बड्कापथ	
७७	शालिकराम भुसाल	२१९३९७	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन रुपन्देही	
७८	सूर्य बहादुर लम्साल	२०१५७२	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	बाणगंगा	

क्र.सं.	"कर्मचारीको नाम"	"संकेत नम्बर"	समूह/उपसमूह	पद	तह	कार्यरत कार्यालय	कैफियत
७९	लोकेन्द्र बहादुर रावल	२२६०८६	सिभिल/इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	डिभिजन प्युठान	
८०	नारायण प्रसाद पन्थी	१८४९५८	मेकानिकल/नि.उ.स	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	भूमिगत रुपन्देही	
८१	पुष्करराज शर्मा	२१८१७०	मेकानिकल/नि.उ.स	प्राविधिक अधिकृत	अ.छैठौं	उर्जा कार्यालय	
८२	अर्जुन कुमार क्षेत्री	१५१७८५	मेकानिकल/नि.उ.स	सी.मेकानिक्स	स. पाँचौं	भूमिगत बाँके	
८३	अर्जुन बुढाथोकी	२५१६०८	जियोलोजी/हा.जि	अ.ग्रा. हाइड्रोजियोलोजिस्ट.	स. पाँचौं	भूमिगत बाँके	
८४	याम प्रसाद शर्मा	२३३६७८	इलेक्ट्रिक/ज.इ	सब इन्जिनियर	स. पाँचौं	भूमिगत दांग	कामकाज
८५	रामजी भट्टराई	२०५११०	एग्रु इरिगेशन	प्रा.अधिकृत	अ. छैठौं	डिभिजन अर्घाखाँची	
८६	कृष्ण बहादुर बिष्ट	१३३३५१	एग्रि इरिगेसन	प्राविधिक अधिकृत	अ. छैठौं	डिभिजन बाँके	
८७	रेम बहादुर रायमाझी	२२४४७६	एग्रि इरिगेसन	ए.ओ.	स.पाँचौं	डिभिजन पाल्पा	
८८	कृष्ण प्रसाद पोखेल	१६६९५२	एग्रि इरिगेसन	ए.ओ.	स.पाँचौं	डिभिजन दाङ	
८९	पवित्रा महतौं	२२२२७७	एग्रि इरिगेसन	ए.ओ.	स. पाँचौं	डिभिजन रुपन्देही	
९०	श्री विकास के.सी.		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन बाँके	
९१	श्री विवेक पाण्डेय		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन बर्दिया	
९२	श्री चेतप्रसाद पहाडी		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन कपिलबस्तु	
९३	श्री संदिप संगम		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन नवलपरासी	
९४	श्री सुनिल के.सी.		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	भूमिगत दाङ	
९५	श्री किशोर ऐर		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	प्रदेश उर्जा	
९६	श्री जिनु कोजु		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन कपिलबस्तु	
९७	श्री सुस्मीता शाही		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	रुकुम	
९८	श्री अदिती के.सी.		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	मन्त्रालय	
९९	श्री अस्मिता कुमारी		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन रोल्पा	
१००	श्री सरस्वती चौधरी		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन कपिलबस्तु	
१०१	श्री प्रेमा दास		सिभिल/इरिगेसन	सब इन्जिनियर	स.पाचौं	डिभिजन अर्घाखाँची	
१०२	श्री नीरव पाण्डेय		जियोलोजी/हा.जि	अ.ग्रा. हाइड्रोजियोलोजिस्ट.	स. पाँचौं	भूमिगत दाङ	

मन्त्रालयमा हालसम्म कार्यरत मन्त्री तथा सचिबहरुको विवरण

क्र.सं.	नामथर	बहाल रहेको अवधि		कैफियत
		देखि	सम्म	
	माननीय मन्त्रिहरुको विवरण			
१	मा.श्री बिर बहादुर राना	२०७८/६/२४	२०७९/९/२७	
२	मा.श्री इन्द्रजित चौधरी	२०७९/१०/२८	२०७९/१२/११	भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको
३	मा.श्री चेतनारायण आचार्य	२०७९/१२/१२	२०८०/२/७	
४	मा.श्री धर्म बहादुर चौधरी	२०८०/२/८	२०८१/४/१७	
५	मा.श्री कृष्णा के.सी.	२०८१/२/२१	२०८१/४/८	
६	मा.श्री सीता शर्मा चौधरी	२०८१/४/१७	हालसम्म	
	सचिवहरुको विवरण			
१	श्री दिपक घिमिरे	२०७८/७/१	२०७९/१०/२९	
२	श्री अमृत श्रेष्ठ	२०७९/११/२	२०८०/४/२१	भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको
३	श्री सुनिल पौडेल	२०८०/४/२२	२०८०/११/२४	
४	श्री माधब प्रसाद भट्टराई	२०८०/११/२४	२०८१/२/२	
५	श्री मिन राज ढकाल	२०८१/२/३	२०८१/७/१६	
६	श्री बिष्णु भण्डारी	२०८१/७/२३	२०८२/५/५	
७	श्री चुर्ण बहादुर ओली	२०८२/५/९	हालसम्म	

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय



मिति-२०८१-०७-०८ हुग्दिखोला तुराङ सिँचाइ योजना चन्द्रकोट गा.पा ८ गुल्मी (योजना हस्तान्तरण)



जगदिशपुर ताल, वाणगंगा सिँचाइ प्रणाली कपिलवस्तूको अनुगमन



बनकसबासा फलुवा बाझ सिंचाई आयोजना, कपिलवस्तूको अनुगमन



मिति २०८१-१०-१३ डिपबोरिङ अनुगमन-डुरुवा गा.पा वडा न -३ वाँके



मिति २०८१-०८-२५ रासि र बंगलाचुलि क्षेत्रमा बिधुत समस्याको अनुगमन ।



मिति २०८१-०७-०३ बबई गा पा क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने (ट्वाङ खोला) सिंचाई समस्याको अनुगमन





दाङको राजपुर नाकाक्षेत्रको सिंचाई र बिधुत समस्याको अनुगमान ।



२०८१-०७-०९ गाखि गाँउ गलदर सिँचाइ योजना अनुमगन पुथा उत्तर गंगा गा.पा १० बाच्छिगाँउ, रुकुम पुर्व



दाङको राजपुर नाकाक्षेत्रको सिंचाई योजनाहरुको अनुगमान ।



पुर्वखोला बृहत सिँचाइ योजना पुर्वखोला ३ पाल्पा (शिलान्यास कार्यक्रम)



जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङको अनुगमन ।



मनारखानी सिंचाई योजना, सरावल, नवलपरासी (ब.सु.प.)



बासखोला बनदेवी सि.यो, सुनवल १३, नवलपरासी (ब.सु.प.)



भुम्का सियारी सिँचाइ योजना, सियारी ४, रुपन्देही



दयानगर दानव लिफ्ट सिं. यो, सियारी ४



भुम्का सियारी सिँचाइ योजना, सियारी ४, रुपन्देही



उनवालिया ताल, महाराजगंज न.पा.-२



क्रपकट सर्भे, वाणगंगा सिँचाइ प्रणाली, कपिलवस्तू



नहर संचालन, वाणगंगा सिँचाइ प्रणाली, कपिलवस्तू



बम्लेवा सि.यो, शान्तिनगर-७ दाङ



मोरंगा खोला तटबन्ध, रासिसोनारी-३, बाँके



डिप ट्युबवेल निर्माण, डुरुवा गौतारिया डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना तुलसीपुर-१५, दाङ



सुन्डबरी डिप ट्युबवेल कलस्टर अन्तर्गत बि.सं. २०५४ मा निर्मित SP-1 डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, लमही-३, फल्कापुर, दाङ



बुढी कुला तटबन्ध योजना, गेरुवा ३,नयाँगाउँको बाधको तल पट्टि बर्दिया



झडेवा सिँचाइ योजना, मथागढी ४



जफती सिँचाइ योजना, कालिगण्डकी -५, गुल्मी



तिनाउ खोला नदि नियन्त्रण, माडीफाँट पाल्पा



भराहा थुम्का सि.यो. मुसिकोट -३, गुल्मी



दीपज्योति स्यालो ट्युबवेल, राजापुर-०९, बर्दिया



भाविन काफेली सिँचाइ योजनाको मुहान शितगगां ४ र ५, अर्घाखाँची



माझकुलो काफलटारी सिँचाइ योजना सन्धिखर्क २ र १० अर्घाखाँची



डोडही कुलो, प्रगन्ना सिँचाइ प्रणाली, दाङ



अनन्तपुर कुलो, प्रगन्ना सिँचाइ प्रणाली, दाङ



त्रिवेणी-र्याले क्षेत्र सिबाङखोला तटबन्ध, त्रिवेणी २,७, रोल्पा



झिम्रुक न. नि. प्यूठान न.पा. ०२, प्यूठान



सिम सिर्सेनी सिँचाइ योजना, त्रिवेणी ६, रोल्पा



गाखीगाउँ गल्हर सिँचाइ योजना, पुथाउतरगंगा-१०



मलायंग मगरा सरसुने तटबन्ध यो., भूमे-७, रुकुम पूर्व



कोटस्थान डिप ट्यूबवेल सिं. यो., सरावल ४, नवलपरासी



जामाखोला सिं.यो., सिस्ने-८,रुकुम पूर्व



१०.२ किलोवाट हाइब्रिड सोलार ब्याकअप प्रणाली जडान, पब्लिक मा.वि. सियारी रुपन्देही ।



सोलार होम सिस्टम प्रणाली (SHS)



मा. मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यू बिचको कार्यसम्पादन करार



श्रीमान् सचिवज्यू र महाशाखा प्रमुखबिचको कार्यसम्पादन करार



सिँचाइ दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रम, लुम्बिनी हल, प्रदेश सभा परिसर



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक

अनुसूचीहरु
